ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO - MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

IZVEDBENI PROGRAM

radova na održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko - moslavačke županije za razdoblje od 15.11.2026. g. - 15.04.2027.g.



Sisak, listopad 2026. god.

IZVEDBENI PROGRAM RADOVA NA
ODRŽAVANJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
U ZIMSKIM UVJETIMA

2026/2027. GOD.

STIPO ŠAPINA
HR-70285854217

Elektronički potpisano: 27.10.2026T08:45:53 (UTC:2026-10-27T07:45:53Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 100adf5c-0fa1-45a2-8bf6-eb945bdff1da

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 340-07/26-01/49
URBROJ: 2176-154-32-26-9
U Sisku, 26. listopada 2026.g.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, članka 26. stavka 3. Zakonu o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25), a u skladu s člankom 34. stavak 1. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14, 03/21) na prijedlog ugovornih izvođača radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije Cesta Karlovac d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A, Duga Resa, Županijskih cesta Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44/a, Goričica, Donja Zelina i Cesta Sisak d.o.o., Lađarska 28c, Sisak, donosim

Izvedbeni program zimske službe za održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije 2026/2027. godine

I

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito:

– organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,

– raspored mjesta stalne pripravnosti,

– karta cestovne mreže s označenim razinama prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,

– raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,

– raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,

– nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,

– mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,

– način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

II

Za poslove nadzora, koordinacije i kontrolu provedbe rada zimske službe imenovane su odgovorne osobe Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije:

- Marijo Pušić, mag.ing.aedif.,
  telefon u uredu: 044/526-617
  mobilni: 099/733-0650
  marijo@zuc-sk.hr

- Filip Rožić, dipl.ing.građ.
  telefon u uredu: 044/526-617
  mobilni: 091/637-5824
  filip.rozic@zuc-sk.hr

- Mario Posavac, dipl.ing. prom.
  telefon u uredu: 044/524-531
  mobilni: 099/396-8284
  mario.posavac@zuc-sk.hr

- Ratko Vujić, ing. prom.
  telefon u uredu: 044/526-618
  mobilni: 098/980-6780
  ratko.vujic@zuc-sk.hr

Ravnatelj:
Stipo Šapina

SADRŽAJ

1. UVOD

2. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE

3. RASPORED MJESTA STALNE PRIPRAVNOSTI, RASPORED RADNIH SKUPINA OBVEZNE PRISUTNOSTI I STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

4. KARTE I POPIS CESTOVNE MREŽE S OZNAČENIM RAZINAMA PREDNOSTIMA

5. RASPORED MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE, RADNE SNAGE POTREBNE ZA IZVOĐENJE PLANIRANIH RADOVA, RASPORED DEŽURSTAVA TE OBVEZNE PRISUTNUSTI

6. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

7. NACRT POSIPAVANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJE SNIJEGA

8. DINAMIKA PROVOĐENJA POJEDINIH AKTIVNOSTI I OSIGURANJE PROHODNOSTI

9. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

10. ODGOVORNOST ZA ŠTETU I ŠTETNE DOGAĐAJE

11. UVJETI KADA SE ZBOG SIGURNOSTI PROMETA ISTI OGRANIČAVA ILI ZABRANJUJE ZA POJEDINE VRSTE VOZILA

12. SUSTAV VEZA

13. OBAVJEŠĆIVANJE O STANJU I PROHODNOSTI CESTA

14. METEOROLOŠKI PODACI

15. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

16. ZAVRŠNE NAPOMENE

1. UVOD

Ovim izvedbenim programom radova održavanja cesta u zimskom razdoblju obuhvaćeno je **ukupno 1.231,170 km (653,473 km županijskih cesta, 577,697 km lokalnih cesta)** na području Sisačko – moslavačke županije koje održavaju ugovorni izvođači radova: "CESTE KARLOVAC" d.d., CESTE SISAK d.o.o. i „ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE" d.o.o. sa kooperantima.

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa na cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

U zimskom razdoblju, koje, u pravilu, traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja sljedeće godine (ovisno o vremenski prilikama i prognozama), održavanje cesta provodi se isključivo u skladu s Izvedbenim programom zimske službe, Ugovoru o redovnom održavanju između izvođača i ŽUC-a SMŽ, te zakonsko pravnom regulativom.

Zakonsko pravna regulativa:

- Zakon o cestama („Narodne novine", broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine", broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24)
- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine", broj: 90/14, 3/21).
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine", broj 109/25 i 118/25).
- Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste („Narodne novine", broj: 44/12).
- Ugovori o radovima redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta zaključeni između: Županijske uprave za ceste Sisačko – moslavačke županije i gore navedenih ugovornih izvođača radova.

Izvedbeni program rada zimske službe usklađen je s izvedbenim programom rada zimske službe Hrvatskih ceste d.o.o., Ispostava Sisak.

2. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE

U vremenu od izrade ovog izvedbenog programa do početka rada zimske službe ugovorni izvođači radova obavit će sljedeće pripremne radove:

- Pregled i popravak mehanizacije i priključaka (roto posipači, ralice),
- Zaključiti Ugovor o najmu potrebne mehanizacije u skladu sa važećim Zakonom o nabavi roba i usluga i ustupanju radova,
- Pregled i uređenje mjesta pripravnosti,
- Upoznati djelatnike sa izvedbenim programom rada zimske službe,
- Organizirati radni sastanak sa predstavnicima komunalnih poduzeća radi usklađenja rada zimske službe za područje gradova/općina,
- Postaviti dopunsku prometnu signalizaciju za reguliranje prometa vozila u zimskim uvjetima, te detaljni popis istih zajedno sa stacionažama, vrstom znaka, pozicijom i orijentacijom te načinom postavljanja dostaviti u Županijsku upravu za ceste SMŽ.
- Izraditi izvedbeni program koji će se upotrebiti za izradu ovog izvedbenog programa a koji će sadržavati:
  - ime i prezime odgovorne osobe izvoditelja radova zimske službe s telefonskim brojevima,
  - popis odgovornih osoba po mjestima pripravnosti s telefonskim brojevima,
  - popis svih ostalih djelatnika i mehanizacije s priključcima (roto posipač, ralica) po mjestima pripravnosti.

Na području Sisačko – moslavačke županije nositelj Izvedbenog plana zimske službe je zajednica ponuditelja: Ceste Karlovac d.d., Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o. i Ceste Sisak d.o.o., koji nastupaju sa podizvođačima po nadcestarijama kako slijedi u tablici:

Tablica 1. - Izvoditelji radova

Redni broj	Naziv izvoditelja radova (ugovornih i podizvođača)	Održava javne ceste na području	Ukupna duljina županijskih i lokalnih cesta* (km)
1.	Ceste Karlovac d.d., Duga Resa	Topusko	165,169
2.	Županijske ceste zagrebačke županije d.o.o., Zagreb	Kutina	185,459
3.	Ceste Sisak d.o.o., Sisak	Sisak, Petrinja, Glina, H.Kostajnica, Dvor, Sunja, Novska	880,542
		SVEUKUPNO:	**1231,170**

* Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta „Narodne novine“, broj 109/25 i 118/25

Stožer zimske službe imenovan od strane izvođača radova

Red. br.	*Ime i Prezime*	*Dužnost u Stožeru:*	*e-pošta*	*mobitel*
1.	*Hrvojko Kišiček*	*Šef Stožera*	*hrvojko.kisicek@ceste-sisak.hr*	*099/490-9436*
2.	*Sanja Gaćeša Lukačević*	*Zamjenica šefa Stožera*	*sanjagl@ceste-sisak.hr*	*099/317-3517*
3.	*Mario Kuzmić*	*Član Stožera*	*mario.kuzmic@ceste-sisak.hr*	*098/209-623*
4.	*Stjepan Trdisević*	*Član Stožera*	*banovina@ceste-sisak.hr*	*098/261-102*
5.	*Marinko Rožić*	*Član Stožera*	*rozic.proizvodnja@ceste-sisak.hr*	*099/602-3183*
6.	*Mario Vratan*	*Član Stožera*	*mario.vratan@ceste-sisak.hr*	*099 439 7285*

Zadatak stožera zimske službe jest:

1. Organiziranje izvršenja pripremnih radova, naglašenim u ovom Izvedbenom planu zimske službe.
2. Nakon upoznavanja sa Izvedbenim programom radova na održavnaju županijskih i lokalnih cesta na području SMŽ za razdoblje 2026/2027 od strane Naručitelja Županijske uprave za ceste SMŽ, cesta upoznati suradnike te nadležne institucije i tijela o organizaciji rada zimske službe 2026/2027 te obvezama izvoditelja radova.
3. Odrediti stalna mjesta pripravnosti.
4. Osigurati potrebni broj mehanizacije, **zamjenske mehanizacije (u slučaju kvara)**, djelatnika, materijala za posipavanje cesta i njihov razmještaj po stalnim mjestima pripravnosti.
5. Utvrditi raspored dežurstava, a sve u svrhu osiguranja optimalnih uvjeta za izvršenja obveza iz Izvedbenog plana zimske službe.

3. RASPORED MJESTA STALNE PRIPRAVNOSTI, RASPORED RADNIH SKUPINA OBVEZNE PRISUTNOSTI I STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Da bi funkcioniranje zimske službe bilo što efikasnije na temelju iskustvenih podataka, te konfiguracije terena, mikroklimatskih uvjeta i drugih elemenata koji utječu na rad zimske službe organiziraju se slijedeća mjesta pripravnosti:

Red br.	Mjesto pripravnosti	Ime i prezime:	Adresa:	tel 044 (posao)	Mobitel stalnog dežurstva
1.	SISAK	Arnel Duraković	Lađarska 28c	531-541	099 263 05 92
		Luka Vrščaj	Lađarska 28c	531-541	098 261 101
		Luka Matošević	Lađarska 28c	531-541	099 2271 109
		Jakov Marjanović	Lađarska 28c	531-541	099 54 33 903
2.	SUNJA	Frederic Jagić	Lađarska 28c	833-041	099 490 7604
		Branimir Banovic	Matije Gupca bb	833-041	099 696 5607
		Krešimir Govorčinović	Matije Gupca bb	833-041	099 311 4800
3.	PETRINJA	Kristijan Ovanin	Drenačka bb	862-300	099/209-635
		Tihomir Đuras	Drenačka bb	862-300	099/211-2782
		Marko Prša	Drenačka bb	862-300	098/563-698
		Mario Čulig	Drenačka bb	862-300	099/480-3151
4.	GLINA	Zdravko Kralj	Sv. Križa 2	882-156	098/254-764
		Željko Pajduh	Sv. Križa 2	882-156	099/310-2816
		David Marjanović	Sv. Križa 2	882-156	099/486-5160
5.	HRVATSKA KOSTAJNICA	Marko Brandić	A. Starčevića 7	851-228	099 167 7656
		Damir Lovrić	A. Starčevića 7	851-228	098/460-619
		Filip Naglić	A. Starčevića 7	851-228	092/194-5078
6.	DVOR	Mario Rovišan	Brune Bušića bb	871-203	098/418-603
		Mario Bartolović	Brune Bušića bb	871-203	099 543 3904
		David Perković	Brune Bušića bb	871-203	099/389-3627
7.	KUTINA	Bonislav Margić	Baranjska 6	683-918	091/3505-733
		Ivan Pudnej	Baranjska 6	684-194	095/9041-428
		Ivica Marinković	Baranjska 6	684-194	091/602-2646
8.	NOVSKA	Goran Lukačević	K.Tomislava 69	600-498	099 211 2778
		Tomislav Grgurić	K.Tomislava 69	600-498	099 311 4799
		Nikola Vranjić	K.Tomislava 69	600-498	091 596 2690
9.	TOPUSKO	Domagoj Rendulić	Gređanska bb	885-090	099/311-7168
		Miloš Grijaković	Gređanska bb	885-090	099/4824-529
		Davor Kirš	Gređanska bb	885-090	098/9825-637

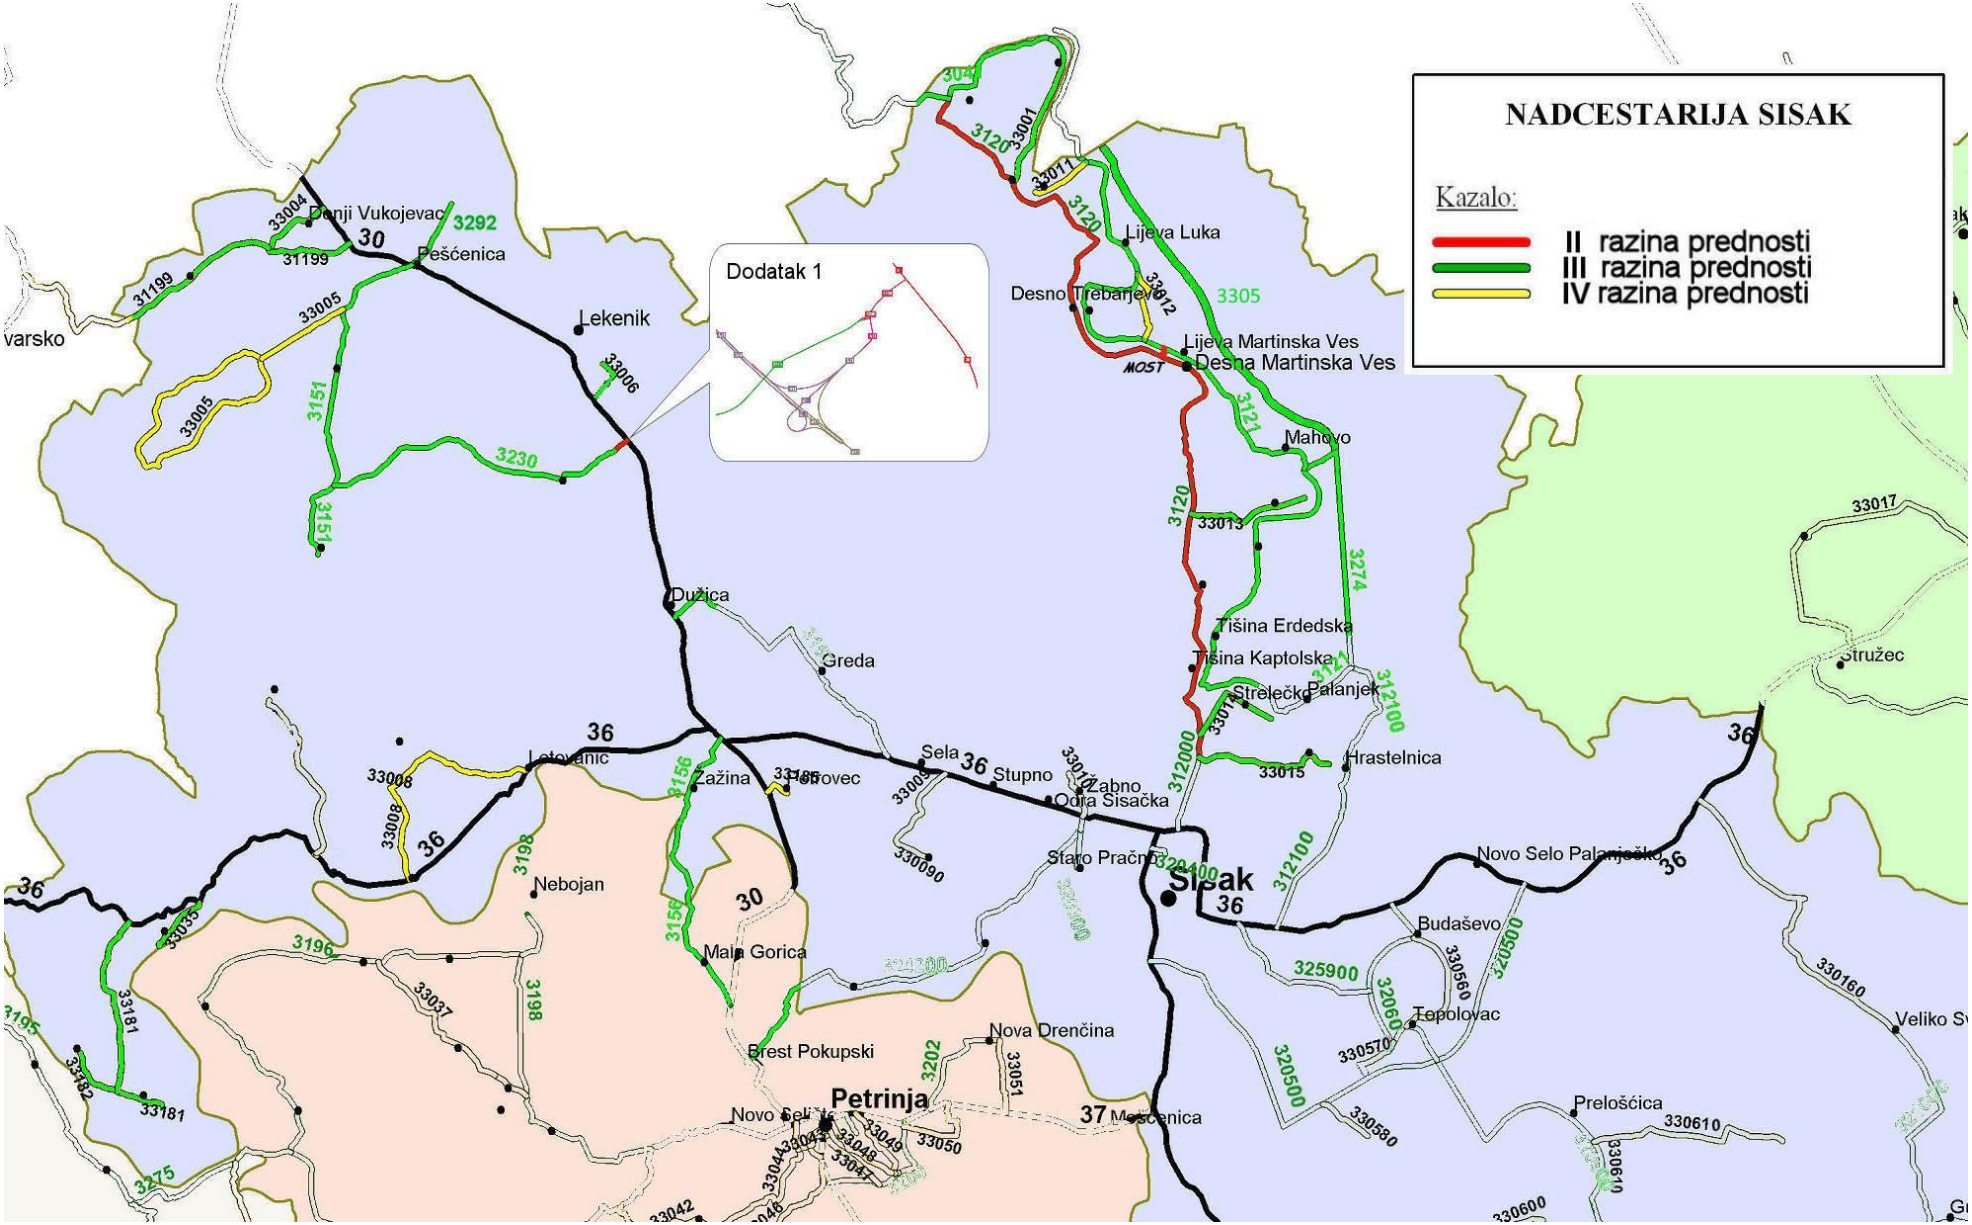
U mjestima pripravnosti dežurstvo traje u vremenu od 0–24 sata.
U mjestima pripravnosti uvodi se dežurstvo na osnovi odluke odgovorne osobe izvoditelja radova zimske službe u dogovoru sa odgovornom osobom naručitelja, a na osnovi meteoroloških podataka i vremenske prognoze o čemu ovisi stupanj pripravnosti.
Glede uvedenog stupnja pripravnosti, mjesta pripravnosti je potrebno popuniti ljudstvom i mehanizacijom s priključcima kako je predviđeno ovim izvedbenim programom rada zimske službe.

4. KARTE I POPIS CESTOVNE MREŽE S OZNAČENIM RAZINAMA PREDNOSTIMA

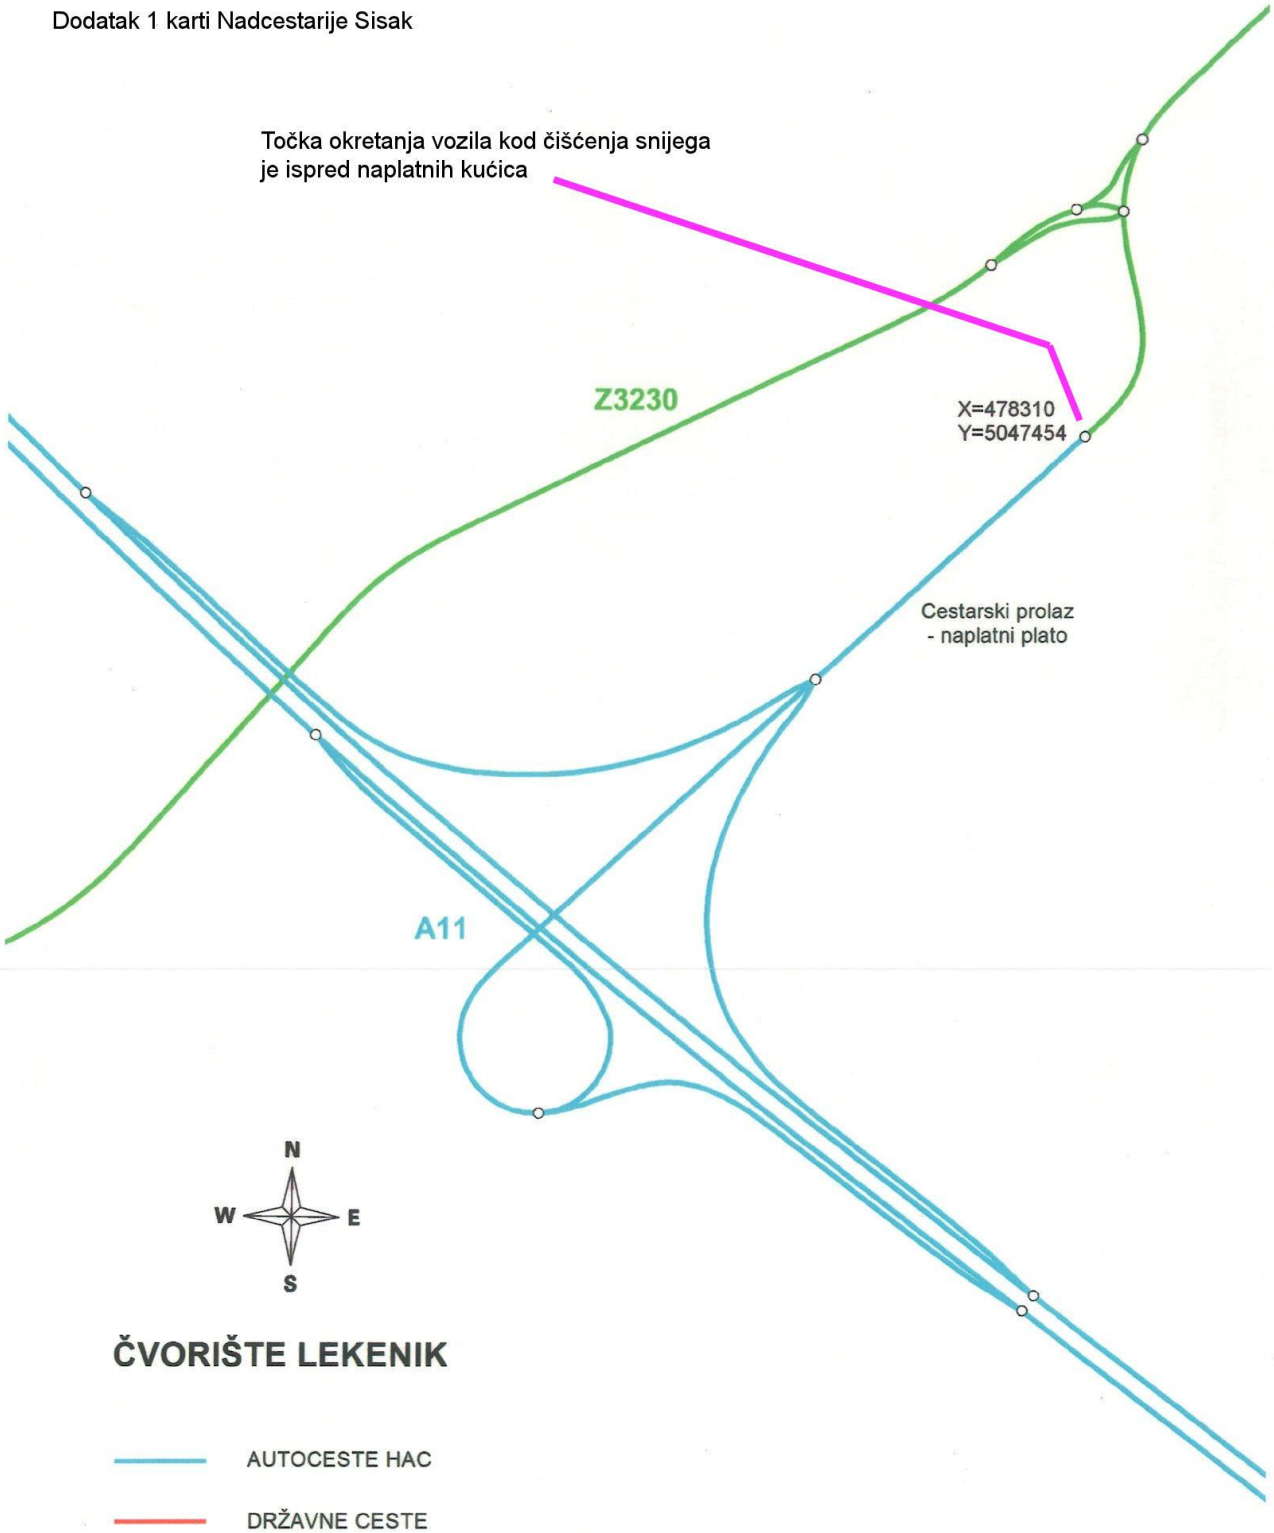
4. 1. Popis cesta po mjestima pripravnosti i razinama prednosti

MJESTO PRIPRAVNOSTI SISAK

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	ŽC 3120	Jezero Posavsko (Ž 3041) - Martinska Ves - A.G. Grada Siska (uključujući most M. Ves)	II	19,005
2.	ŽC 3230	Ž 3151 - Poljana Lekenička – D 30 (spoj D30 i A11)	II	0,600
		UKUPNO II RAZINA:		**19,605**
1.	ŽC 3305	Prečno (ŽC3119) – Martinska Ves – Mahovo (ŽC3274)	III	8,440
2.	ŽC 3121	Lijevi Dubrovčak (Ž3041) – Lijevo Trebarjevo – Mahovo - Tišina Erdedska - A.G. Grada Siska	III	19,500
3.	ŽC 3274	Mahovo (Ž 3121) - A.G. Grada Siska	III	5,205
4.	ŽC 3041	Ivanić Grad - Lijevi Dubrovčak – Veleševec	III	3,700
5.	ŽC 3242	Brest Pokupski (D30) - A.G. Grada Siska	III	1,865
6.	ŽC 3157	Dužica (D 30) - A.G. Grada Siska	III	1,338
7.	ŽC 3156	D 30 - Žažina - Mala Gorica - D30	III	6,520
8.	LC 33006	Želj. kolodvor - Lekenik - D 30	III	1,020
9.	ŽC 3151	Pešćenica (D 30) - Brežane Lekeničke – Cerje	III	7,475
10.	ŽC 3292	Želj. postaja – Pešćenica (D30)	III	1,583
11.	ŽC 3230	Ž 3151 - Poljana Lekenička – D 30	III	6,504
12.	LC 31199	D 31 - Pustike - G. Vukojevac - D 30	III	5,100
13.	LC 33001	Ž 3041 - Desni Dubrovčak – Desno Željezno – Ž 3120	III	3,329
14.	LC 33004	D 30 - Donji Vukojevac - L 31199	III	1,583
15.	LC 33181	Orleković (D36) – Brkiševina	III	5,695
16.	LC 33182	Šišinec – Brkiševina (L 33181)	III	1,471
17.	LC 33013	Ž 3120 – Ljubljanica	III	2,188
18.	LC 33014	Ž 3120 – Strelečko	III	1,916
19.	LC 33015	NC 312000 - Bok Palanječki	III	3,041
		UKUPNO III RAZINA:		**87,473**
1.	LC 33012	L. Luka (Ž 3121) - Martinska Ves (Ž 3121)	IV	1,426
2.	LC 33185	D30 - Petrovac	IV	0,546
3.	LC 33011	Lijevo Željezno - Ž 3121	IV	1,235
4.	LC 33008	Stari Brod (D 36) - Vrh Letovanički - Letovanić (D36)	IV	5,412
5.	LC 33005	Brežane (Ž3151) – Modruše – Prkovec – Gradec – Krleščak – L33005	IV	10,307
		UKUPNO IV RAZINA:		**18,926**
		SVEUKUPNO SISAK:		**126,004**


NADCESTARIJA SISAK
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti
Dodatak 1
Sisak
Petrinja
Lekenik
Dužica
Greda
Sela
Stupno
Zabno
Odra Sisačka
Hrastelnica
Tišina Erdedska
Tišina Kaptolska
Strelečko
Palanjek
Mahovo
Lijeva Luka
Lijeva Martinska Ves
Desna Martinska Ves
Desno Trebarjevo
Donji Vukojevac
Pešćenica
Letovanic
Nebojan
Mala Gorica
Brest Pokupski
Nova Drenčina
Budaševo
Topolovac
Novo Selo Palanječko
Prelošćica
Stružec
Zažina
Hrastovec
Stari Pračno
Novo Selo
Mečenica
36
30
37
MO57

Dodatak 1 karti Nadcestarije Sisak

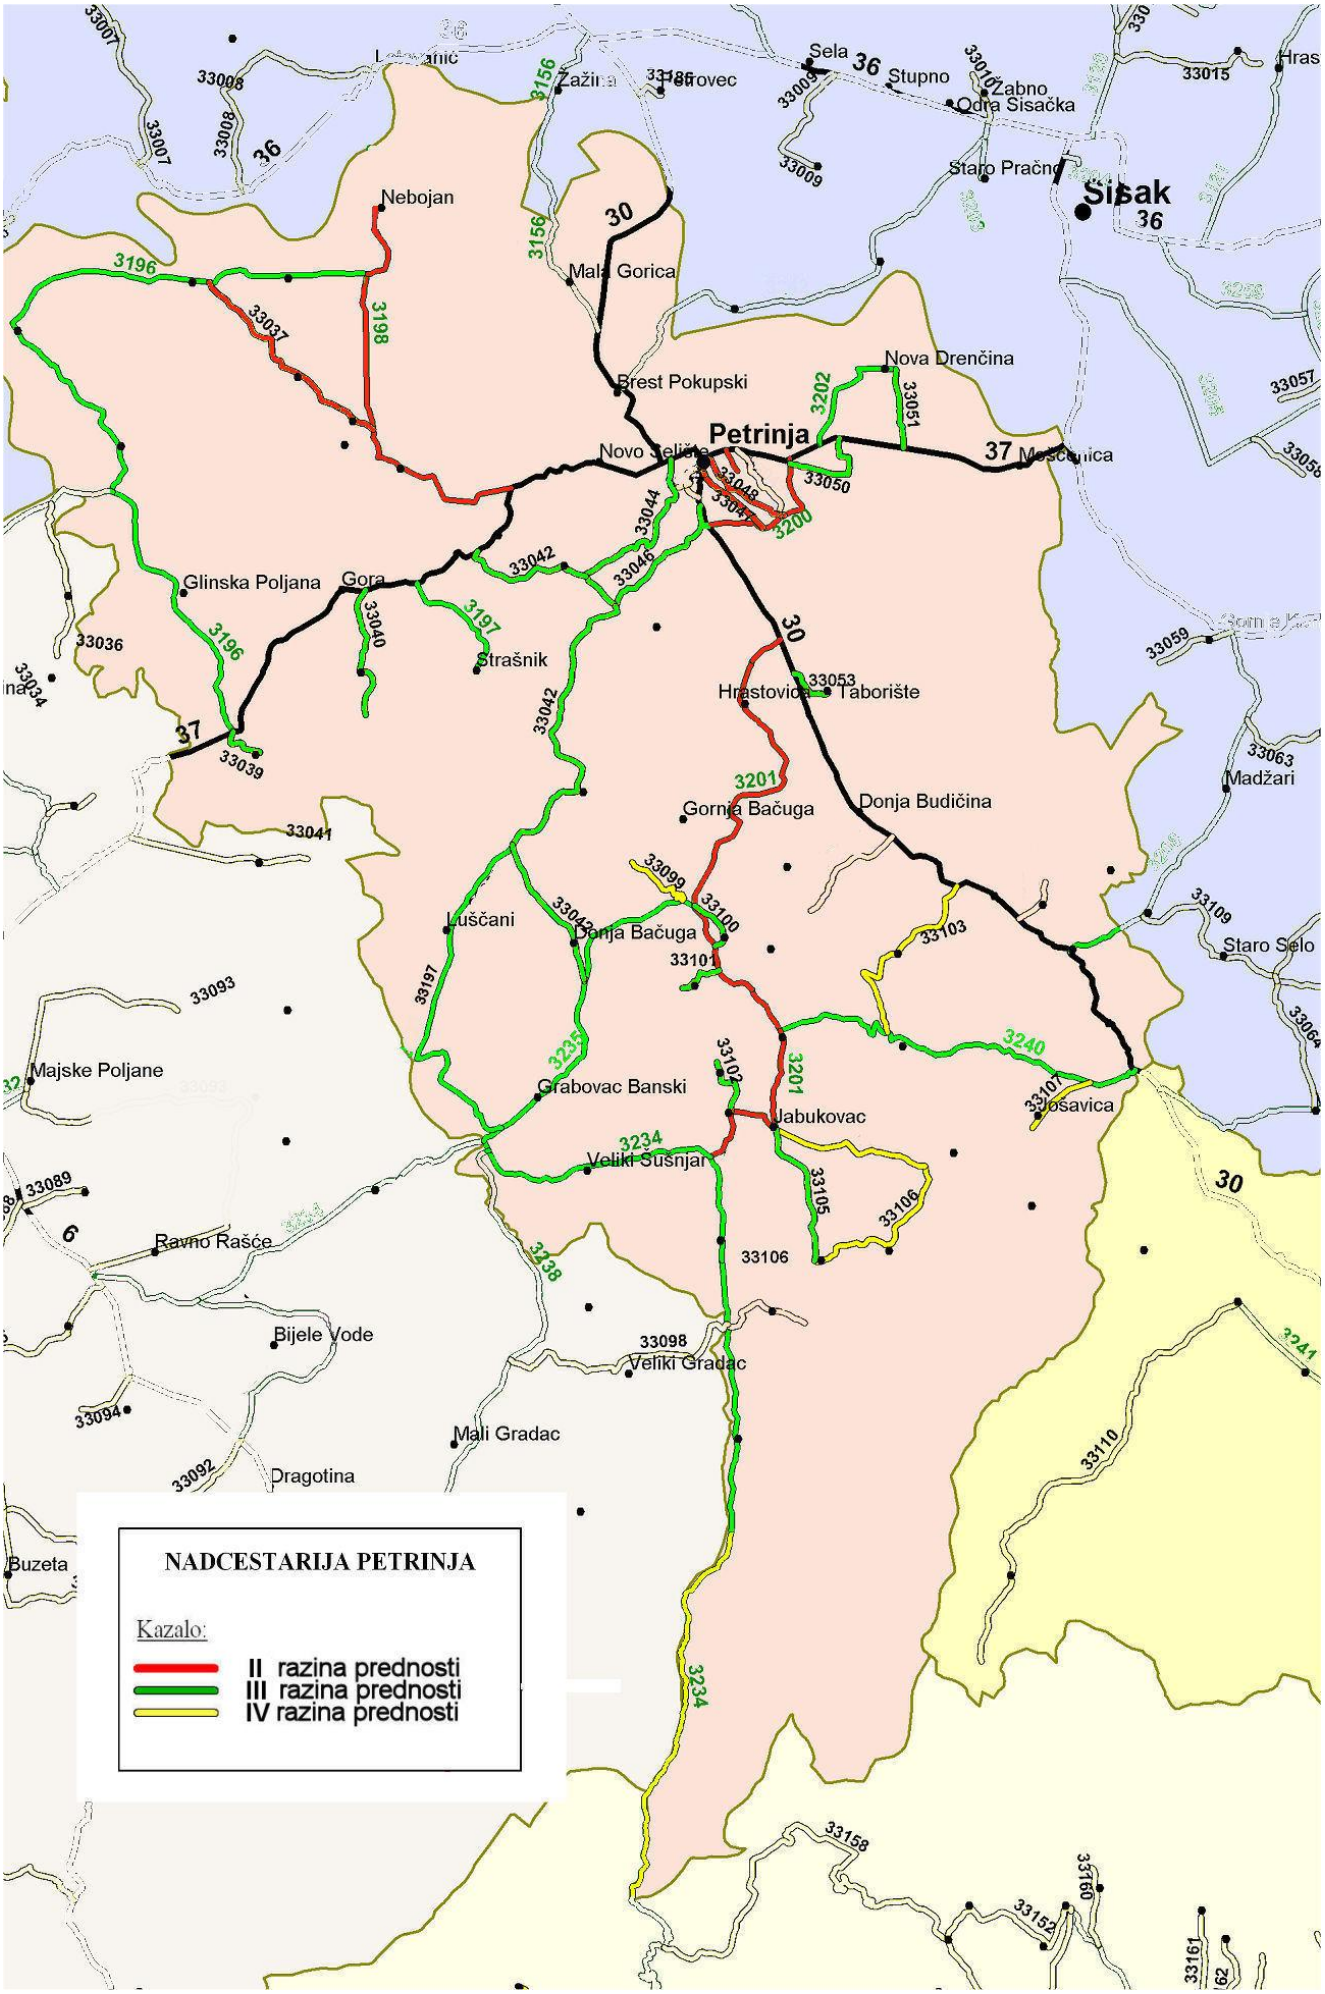


ČVORIŠTE LEKENIK

- AUTOCESTE HAC
- DRŽAVNE CESTE
- ŽUPANIJSKE CESTE
- LOKALE CESTE
- NERAZVRSTANE CESTE

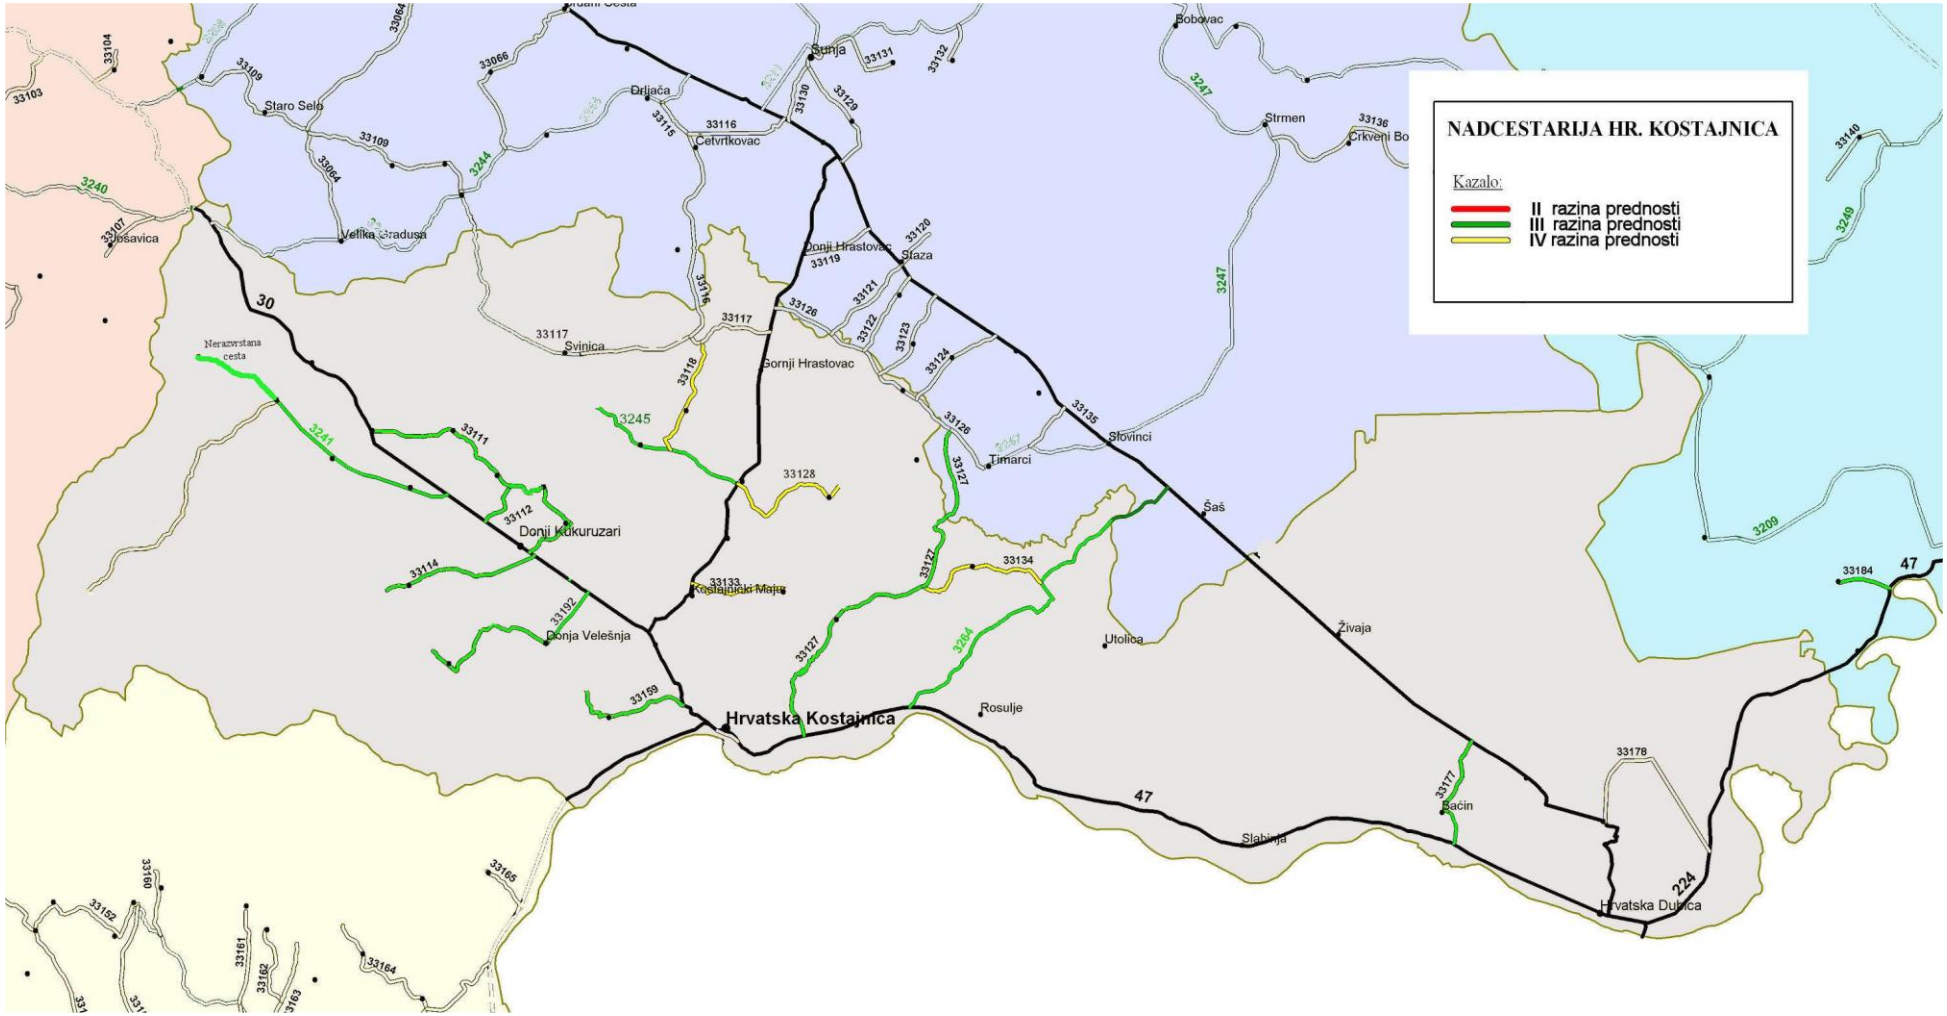
MJESTO PRIPRAVNOSTI PETRINJA

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	Ž 3198	Nebojan - G. Mokrice -D 37	II	8,139
2.	Ž 3199	Petrinja: D 37 - Želj. postaja	II	0,446
3.	Ž 3200	Petrinja: D 30 - D 37 - L33046	II	2,972
4.	Ž 3201	D 30 - Donja Mlinoga – Jabukovac (Ž3234)	II	14,064
5.	L 33037	N. Farkašić (Ž 3196) - D. Mokrice -Ž 3198	II	4,557
6.	L 33047	Petrinja: D 30 - Ž 3200	II	1,629
7.	L 33048	Petrinja: D30 - Ž 3200	II	1,986
		UKUPNO II RAZINA:		**33,793**
1.	Ž 3196	Ž3198 – Novi Farkašić – Slana – Glinska Poljana – D37	III	17,309
2.	Ž 3208	D 224 - A. G. Grada Siska	III	1,166
3.	Ž 3197	D 37 - Strašnik	III	2,486
4.	Ž 3202	N. Drenčina (L33051) – D37	III	2,528
5.	Ž 3234	D 6 – V. Šušnjar - Miočinovići -D. Stupnica – D6	III	10,318
6.	Ž 3235	Ž 3201 - D. Bačuga - Grabovac B. -Ž 3234	III	7,104
7.	L 33039	D 37 - Graberje	III	0,952
8.	L 33042	D37 - Križ Hrastovački - Pecki - D. Bačuga (Ž3235)	III	12,746
9.	L 33044	Petrinja: Sajmište (D30) - Križ Hrastovački (L33042)	III	3,557
10.	L 33050	Petrinja (Ž3200) – D37	III	2,007
11.	L 33051	Nova Drenčina (Ž 3202) - D 37	III	1,543
12.	L 33053	D 30 - Taborište	III	0,804
13.	L 33197	L 33042 - Luščani - Ž 3235	III	7,425
14.	Ž 3240	D. Mlinoga (Ž 3201) - G. Mlinoga - D 30	III	7,953
15.	L 33040	Gora (D 37) - Sibić	III	1,857
16.	L 33046	Petrinja (D 30) - Cepeliš (L 33042)	III	2,840
17.	L 33100	Ž 3201 – Hrvatski Čuntić – Ž3201	III	1,140
18.	L 33101	Prnjavor Čuntički - Ž 3201	III	0,641
19.	L 33102	Dragotinci - Ž 3201	III	1,053
20.	L 33105	Jabukovac (Ž3201) – L33106	III	2,901
		UKUPNO III RAZINA:		**88,330**
1.	Ž 3234	D6 - Veliki Šušnjar - Miočinovići - D. Stupnica - D6	IV	10,000
2.	L 33099	Gornja Bačuga - Ž 3235	IV	1,825
3.	L 33106	Tremušnjak(L33105) – Begovići – Jabukovac (Ž3201)	IV	6,608
4.	L 33107	Ž3240 – Jošavica	IV	1,135
5.	L 33103	D 30 - Deanovići - Ž 3240	IV	4,178
		UKUPNO IV RAZINA:		**23,746**
		SVEUKUPNO PETRINJA:		**145,869**


NADCESTARIJA PETRINJA
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti
Petrinja
Sisak
Nebojan
Mala Gorica
Brest Pokupski
Nova Drenčina
Novo Selište
Glinska Poljana
Gora
Strašnik
Hrastovica
Taborište
Gornja Bačuga
Donja Budičina
Donja Bačuga
Luščani
Majske Poljane
Grabovac Banski
Jabukovac
Veliki Šušnjar
Ravno Rašće
Bijele Vode
Veliki Gradac
Mali Gradac
Dragotina
Buzeta
Sela
Stupno
Zabno
Odra Sisačka
Staro Pračno
Mošćenica
Madžari
Staro Selo
Sošavica
3196
3198
3156
3202
3200
3197
3201
3225
3234
3240
3238
3241
30
37
36
6

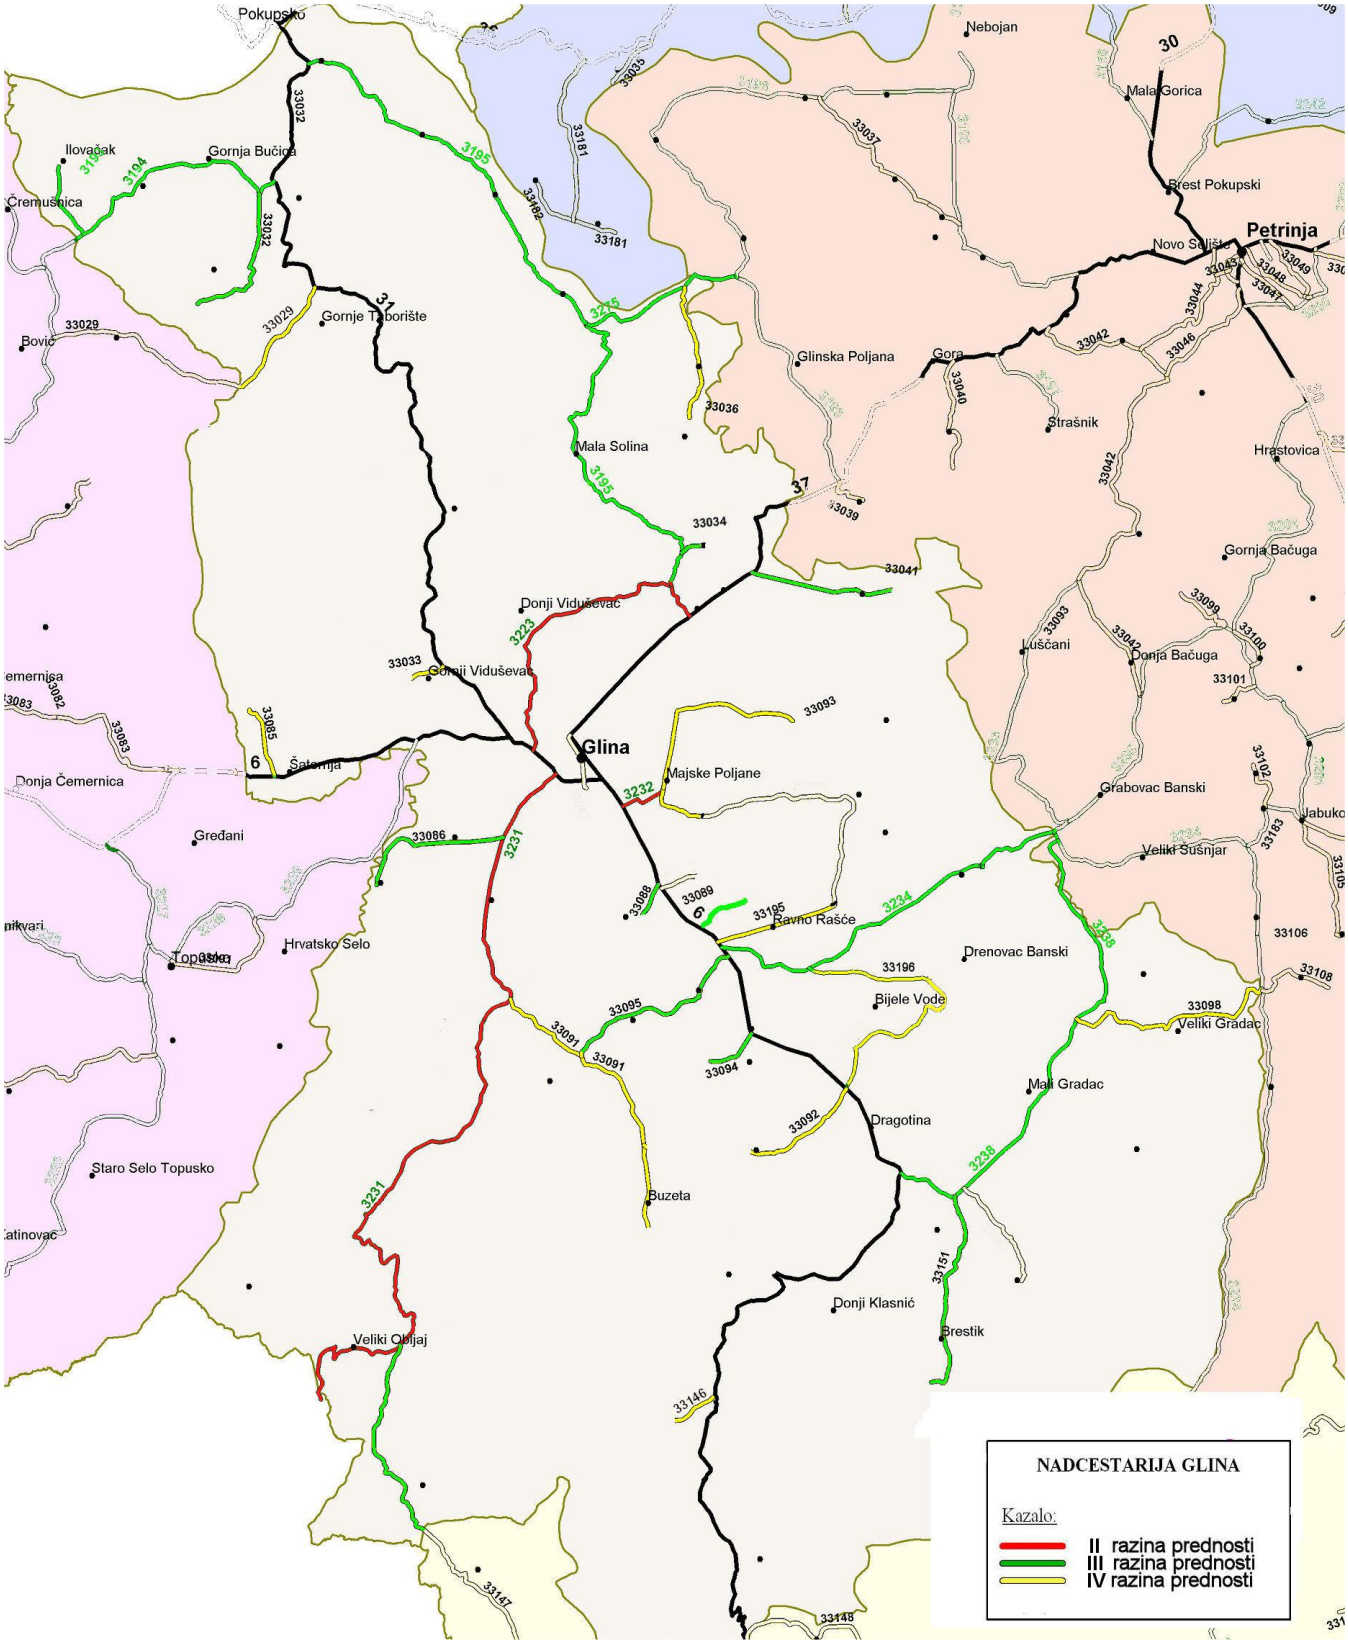
MJESTO PRIPRAVNOSTI KOSTAJNICA

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	L 33184	Višnjica – D 47	III	1,184
2.	Ž 3241	Komogovina – Borojevići (L33110) – Mečenčani – D30	III	7,500
3.	Ž 3245	Graboštani (D224) – želj. postaja – V. Krčevo	III	3,779
4.	L 33192	D30 – D. Velešnja	III	4,981
5.	Ž 3264	Šaš (Ž3294) – Utolica – D47	III	8,902
6.	L 33127	L33126 – Selište Kostajničko – Hrvatska Kostajnica (D47)	III	10,079
7.	L 33111	Umetići (D30) – G. Bjelovac – D. Bjelovac (L33112)	III	3,875
8.	L 33112	D 30 - Kostreši Bjel. - G. Kukuruzari -D 30	III	4,521
9.	L 33114	Babina Rijeka - D. Kukuruzari (D 30)	III	4,461
10.	L 33159	D 30 – Čukur	III	3,019
11.	L 33177	Ž3294 – Baćin – D47	III	2,703
		UKUPNO III RAZINA:		**55,004**
1.	L 33118	L 33117 - M.Krčevo - V.Krčevo (Ž 3245)	IV	2,883
2.	L 33128	Graboštani (D224) – Mračaj	IV	3,617
3.	L 33134	L33127 – Rausovac – Ž3264	IV	3,479
4.	L 33133	Kostajnički Majur (D224) – Kostrići	IV	2,529
		UKUPNO IV RAZINA:		**12,508**
		SVEUKUPNO KOSTAJNICA:		**67,512**


NADCESTARIJA HR. KOSTAJNICA
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti
Hrvatska Kostajnica
Donji Kukuruzari
Donja Velešnja
Gornji Hrastovac
Donji Hrastovac
Svinica
Staro Selo
Velika Gradusa
Četvrtkovac
Drljača
Stanja
Bobovac
Strmen
Crkveni Bok
Slovinci
Timarci
Šaš
Živaja
Utolica
Rosulje
Slabinja
Bačin
Hrvatska Dubica
Nerazvrstana cesta
30
47
224
3240
3241
3244
3245
3247
3249
3209
3264

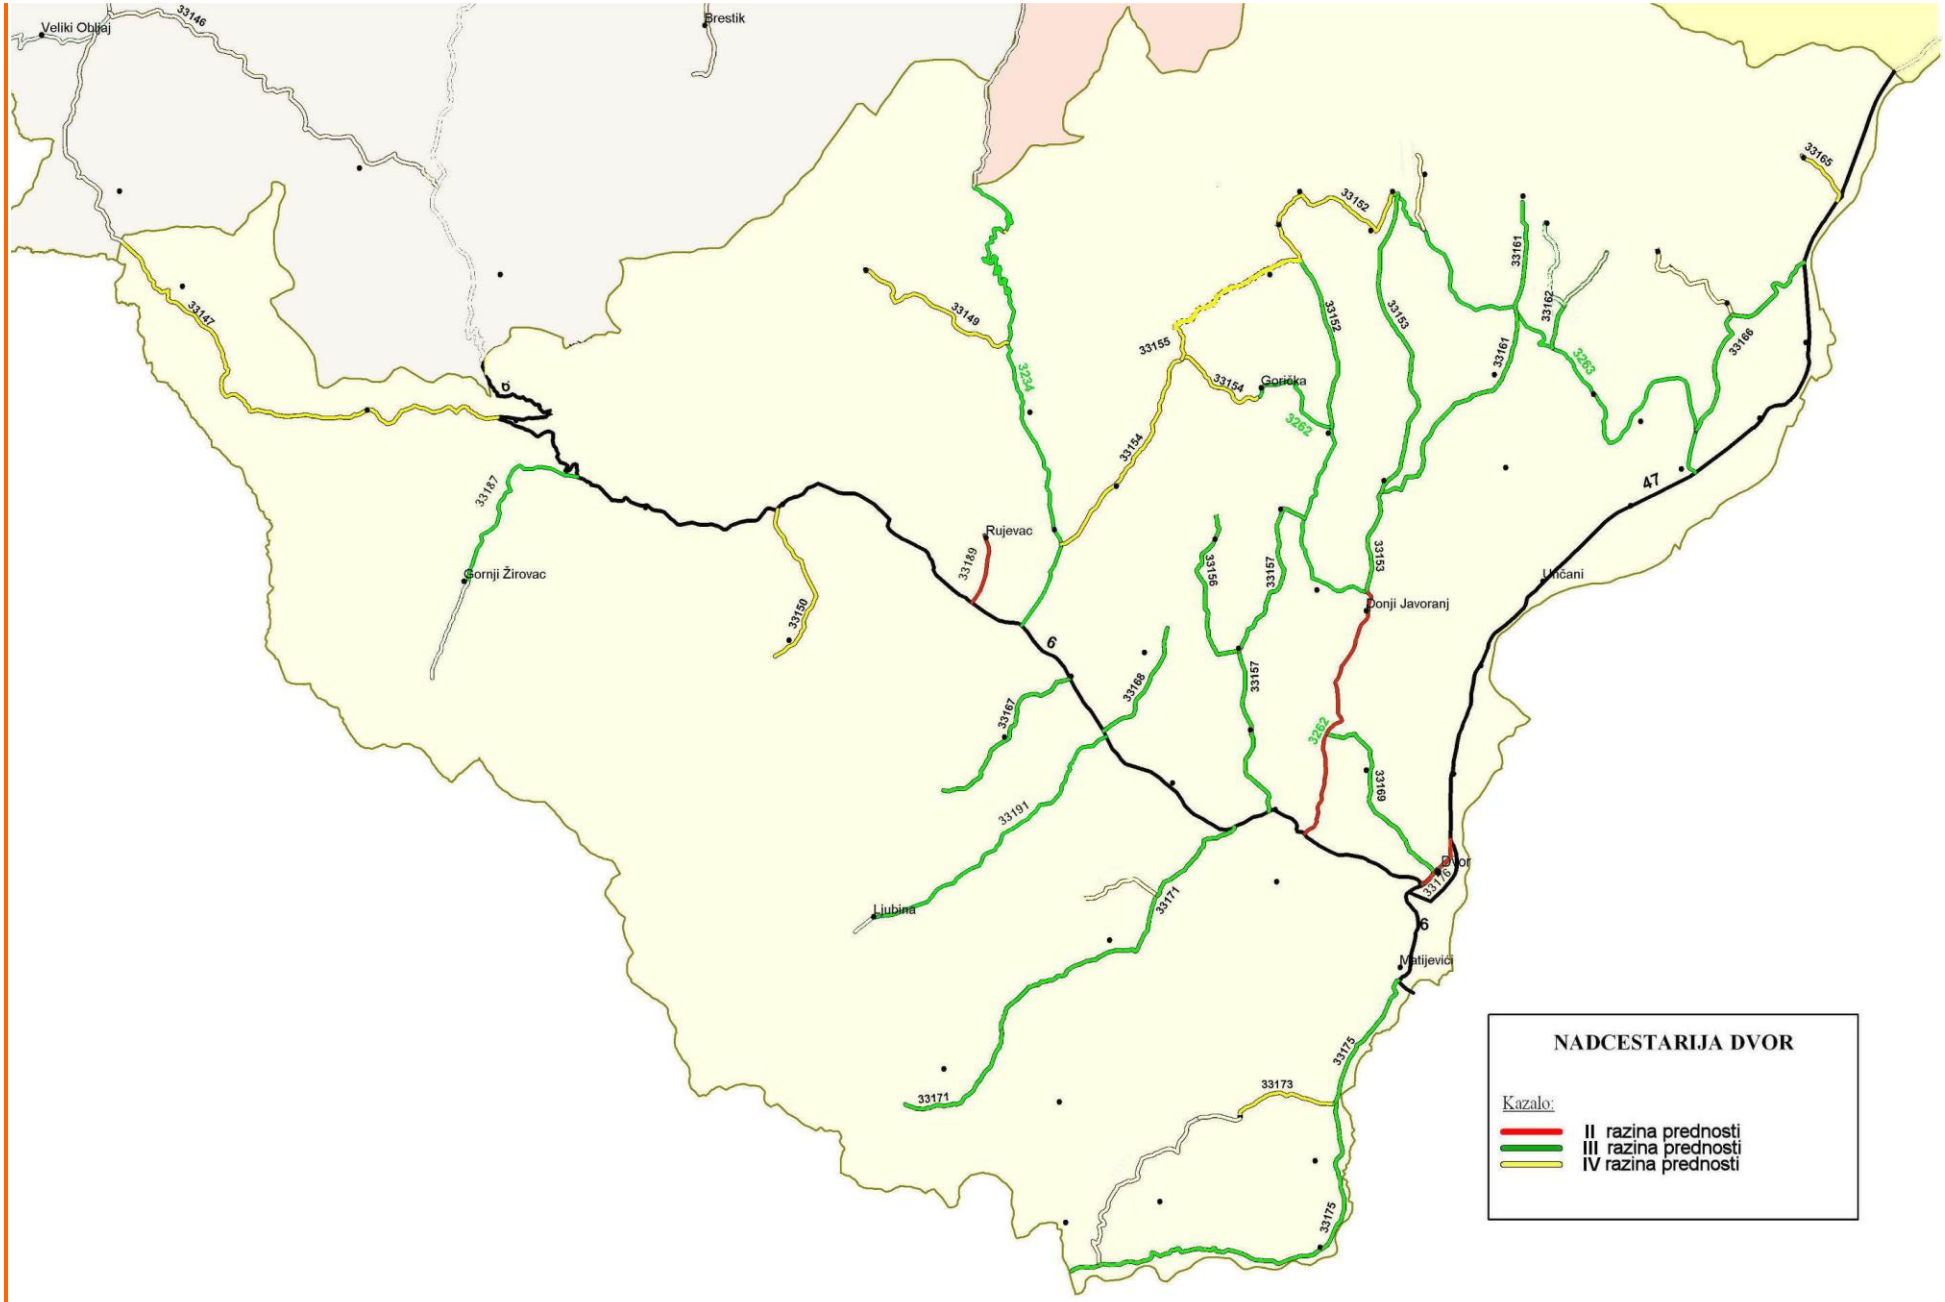
MJESTO PRIPRAVNOSTI GLINA

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	Ž 3231	Glina (D6) – Veliki Obljaj – (gr. R. BiH)	II	20,247
2.	Ž 3223	Hađer (Ž3195) – Dvorište – D. Viduševac – Glina (D6)	II	6,492
3.	Ž 3195	Prekopa (D37) – Hađer (Ž 3223)	II	0,791
4.	Ž 3232	D 6 - Majske Poljane	II	1,044
		UKUPNO II RAZINA:		**28,574**
1.	Ž 3195	Slatina Pokupska (D31) – Zaloj – M. Solina – Prekopa (D37)	III	18,000
2.	Ž 3234	D 6 – V. Šušnjar - Miočinovići	III	9,000
3.	Ž 3238	Ž 3234 - M. Gradac - Dragotina (D 6)	III	11,361
4.	Ž 3193	Ilovačak - Ž 3194	III	1,755
5.	Ž 3194	Ž 3152 - Gornja Bučica - D 31	III	8,116
6.	Ž 3275	Stankovac (Ž 3195) - Slana (Ž 3196)	III	3,882
7.	L 33086	Skela - Donje Selište - Ž 3231	III	4,049
8.	L 33147	Ž3231 – Bojna – Kobiljak – Ostojić – Donji Žirovac (D6)	III	4,721
9.	L 33032	Ž3194 – Donja Bučica	III	3,529
10.	L 33034	Ž3195 – Hađer	III	0,691
11.	L 33041	D 37 - Novo Selo Glinsko	III	3,323
12.	L 33088	Joševica – D6	III	1,516
13.	L 33089	D 6 - Roviška	III	1,323
14.	L 33094	Maja (D 6) - Svračica	III	1,246
15.	L 33095	L 33091 - Prijeka - Dolnjaki - D 6	III	4,467
16.	L 33151	Brestik - Ž 3238	III	3,460
		UKUPNO III RAZINA:		**80,439**
1.	L 33196	Ž3234 – Bijele Vode – D6	IV	9,377
2.	L 33036	Ž 3275 - D. Jame	IV	3,156
3.	L 33029	Ž3152 – Golinja – G. Taborište – D31	IV	4,002
4.	L 33092	Dabrina - D 6	IV	3,099
5.	L 33093	Brnjeuška – M. Poljane (Ž3232) - Meandžije	IV	5,661
6.	L 33098	Martinovići (ŽC3238) – Veliki Gradac – Mačkovo Selo (ŽC3234)	IV	4,646
7.	L 33146	Brubno – Gornji Klasnić (D6)	IV	2,429
8.	L 33085	Šatornja - D 6	IV	1,492
9.	L 33033	G. Viduševac - D 31	IV	1,283
10.	L 33091	Ž3231- Buzeta	IV	6,133
11.	L 33195	D6 - Ravno Rašće	IV	2,703
		UKUPNO IV RAZINA:		**43,981**
		SVEUKUPNO GLINA:		**152,994**


Pokupsko
Nebojan
Mala Gorica
Ilovačak
Gornja Bučica
Brest Pokupski
Petrinja
Novo Selište
Čremušnica
Gornje Taborište
Bović
Glinska Poljana
Gora
Strašnik
Hrastovica
Mala Solina
Gornja Bačuga
Donji Viduševac
Luščani
Donja Bačuga
Gornji Viduševac
Glina
Majske Poljane
Donja Čemernica
Šatornja
Grabovac Banski
Gređani
Veliki Šušnjar
Ravno Rašće
Hrvatsko Selo
Drenovac Banski
Bijele Vode
Veliki Gradac
Mali Gradac
Dragotina
Staro Selo Topusko
Buzeta
Donji Klasnić
Brestik
Veliki Obljaj
NADCESTARIJA GLINA
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti

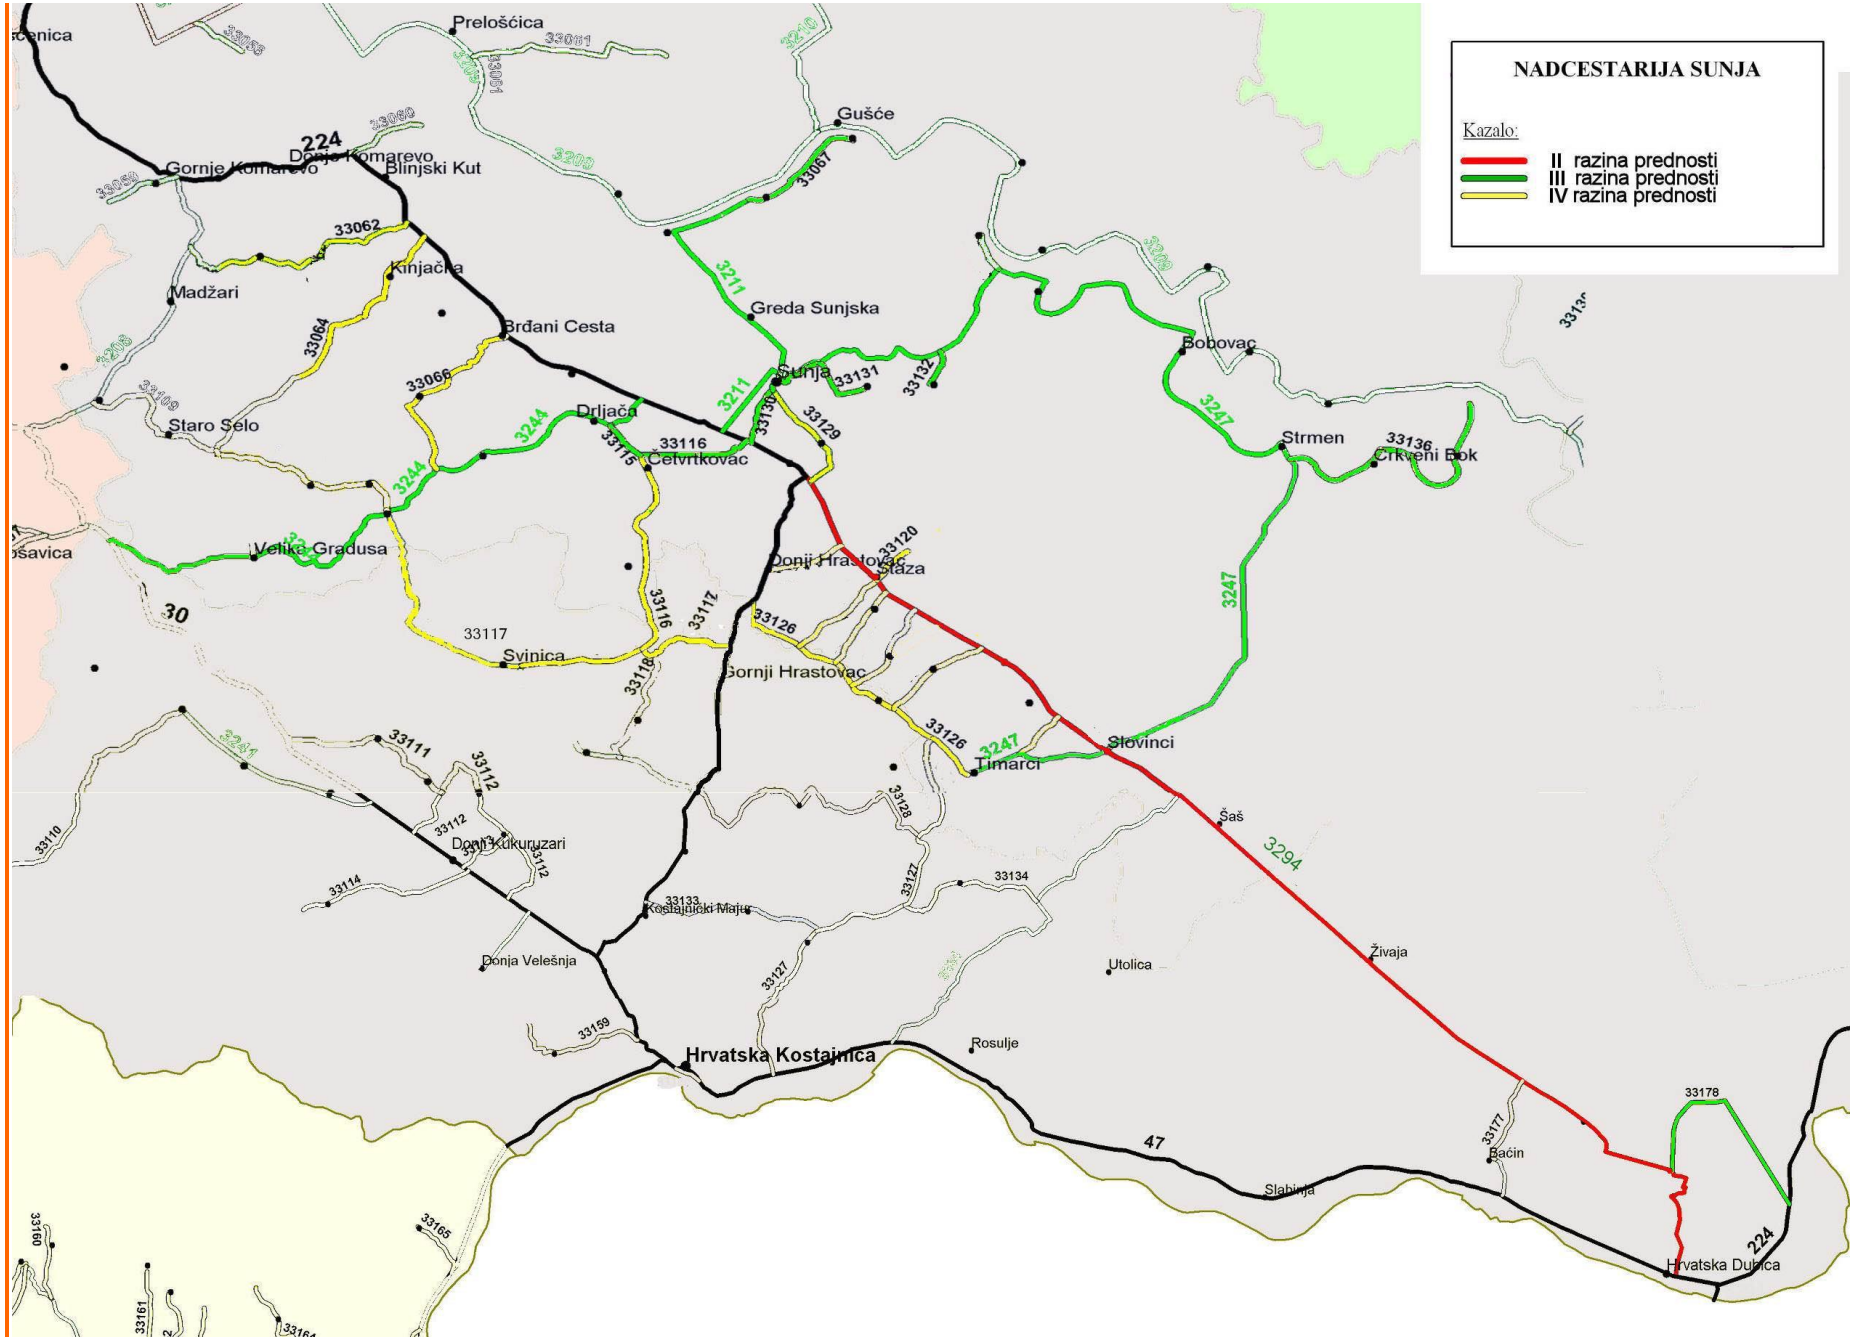
MJESTO PRIPRAVNOSTI DVOR

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	L 33176	Dvor: D47 - D 6	II	1,067
2.	Ž 3262	Gorička (L33154) – D. Javoranj – D6	II	6,000
3.	L 33189	Rujevac - D 6	II	1,408
		UKUPNO II RAZINA:		**8,475**
1.	Ž 3263	Zrin (L33153) - G. Oraovica - Divuša (D47)	III	11,646
2.	Ž 3262	Gorička (L33154) – D. Javoranj – D6	III	5,786
3.	L 33191	D-6 Ljubina	III	6,134
4.	L 33166	D 47 - Jovac - Ž 3263	III	4,733
5.	L 33169	Ž 3262 - Hrtić - Dvor (L 33176)	III	3,996
6.	L33152	Zrin (Ž3263) – Zrinski Brđani Rudeži – Švrakarica – Paukovac (Ž3262)	III	3,832
7.	L 33153	Zrin (Ž 3263) - Donji Javoranj (Ž 3262)	III	8,483
8.	L 33175	Matijevići (D6) – Javornik – Donji Dobrtin – Ivanjska (gr. R. BiH)	III	11,443
9.	L 33161	Lotine – Šegestin – L33153	III	7,289
10.	L 33162	Buinjski Riječani – Ž3263	III	0,888
11.	L 33156	Udetin – Bansko Vrpolje (L33157)	III	3,241
12.	Ž 3234	D6 - Veliki Šušnjar - Miočinovići - D. Stupnica - D6	III	11,500
13.	L 33157	Ž3262 – Glavičani – Bansko Vrpolje – Ćore – Vanići (D6)	III	6,046
14.	L 33187	D 6 - Gornji Žirovac	III	3,807
15.	L 33167	Trgovi - D 6 - Kosna	III	4,055
16.	L 33171	D 6 - Javnica - Kotarani	III	8,731
17.	L 33168	Gage - D 6	III	3,165
		UKUPNO III RAZINA:		**104,775**
1.	L 33150	D 6 - Majdan	IV	3,979
2.	L 33149	Ljeskovac - Ž 3234	IV	3,466
3.	L 33152	Zrin (Ž3263) – Zrinski Brđani Rudeži – Švrakarica – Paukovac (Ž3262)	IV	4,000
4.	L 33154	Gorička (Ž 3262) - Pedalj - D. Stupnica (Ž 3234)	IV	6,991
5.	L 33155	L33154 – Grabovica – L33152	IV	3,995
6.	L 33147	Ž3231 – Bojna – Kobiljak – Ostojić – Donji Žirovac (D6)	IV	11,300
7.	L 33173	Goluževac - L 33175	IV	2,107
8.	L 33165	Volinja - D 47	IV	1,594
		UKUPNO IV RAZINA:		**37,432**
		SVEUKUPNO DVOR:		**150,682**


Veliki Obljaj
Brestik
33146
33147
33187
Gornji Žirovac
33159
33149
3224
33155
33154
Gorička
3262
33152
33153
33161
33162
3263
33166
33165
47
Rujevac
33169
6
33156
33157
Donji Javoranj
Ličani
33167
33168
33191
Ljubina
3262
33169
Dvor
33170
33171
6
Matijevici
33175
33173
33171
33175
NADCESTARIJA DVOR
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti

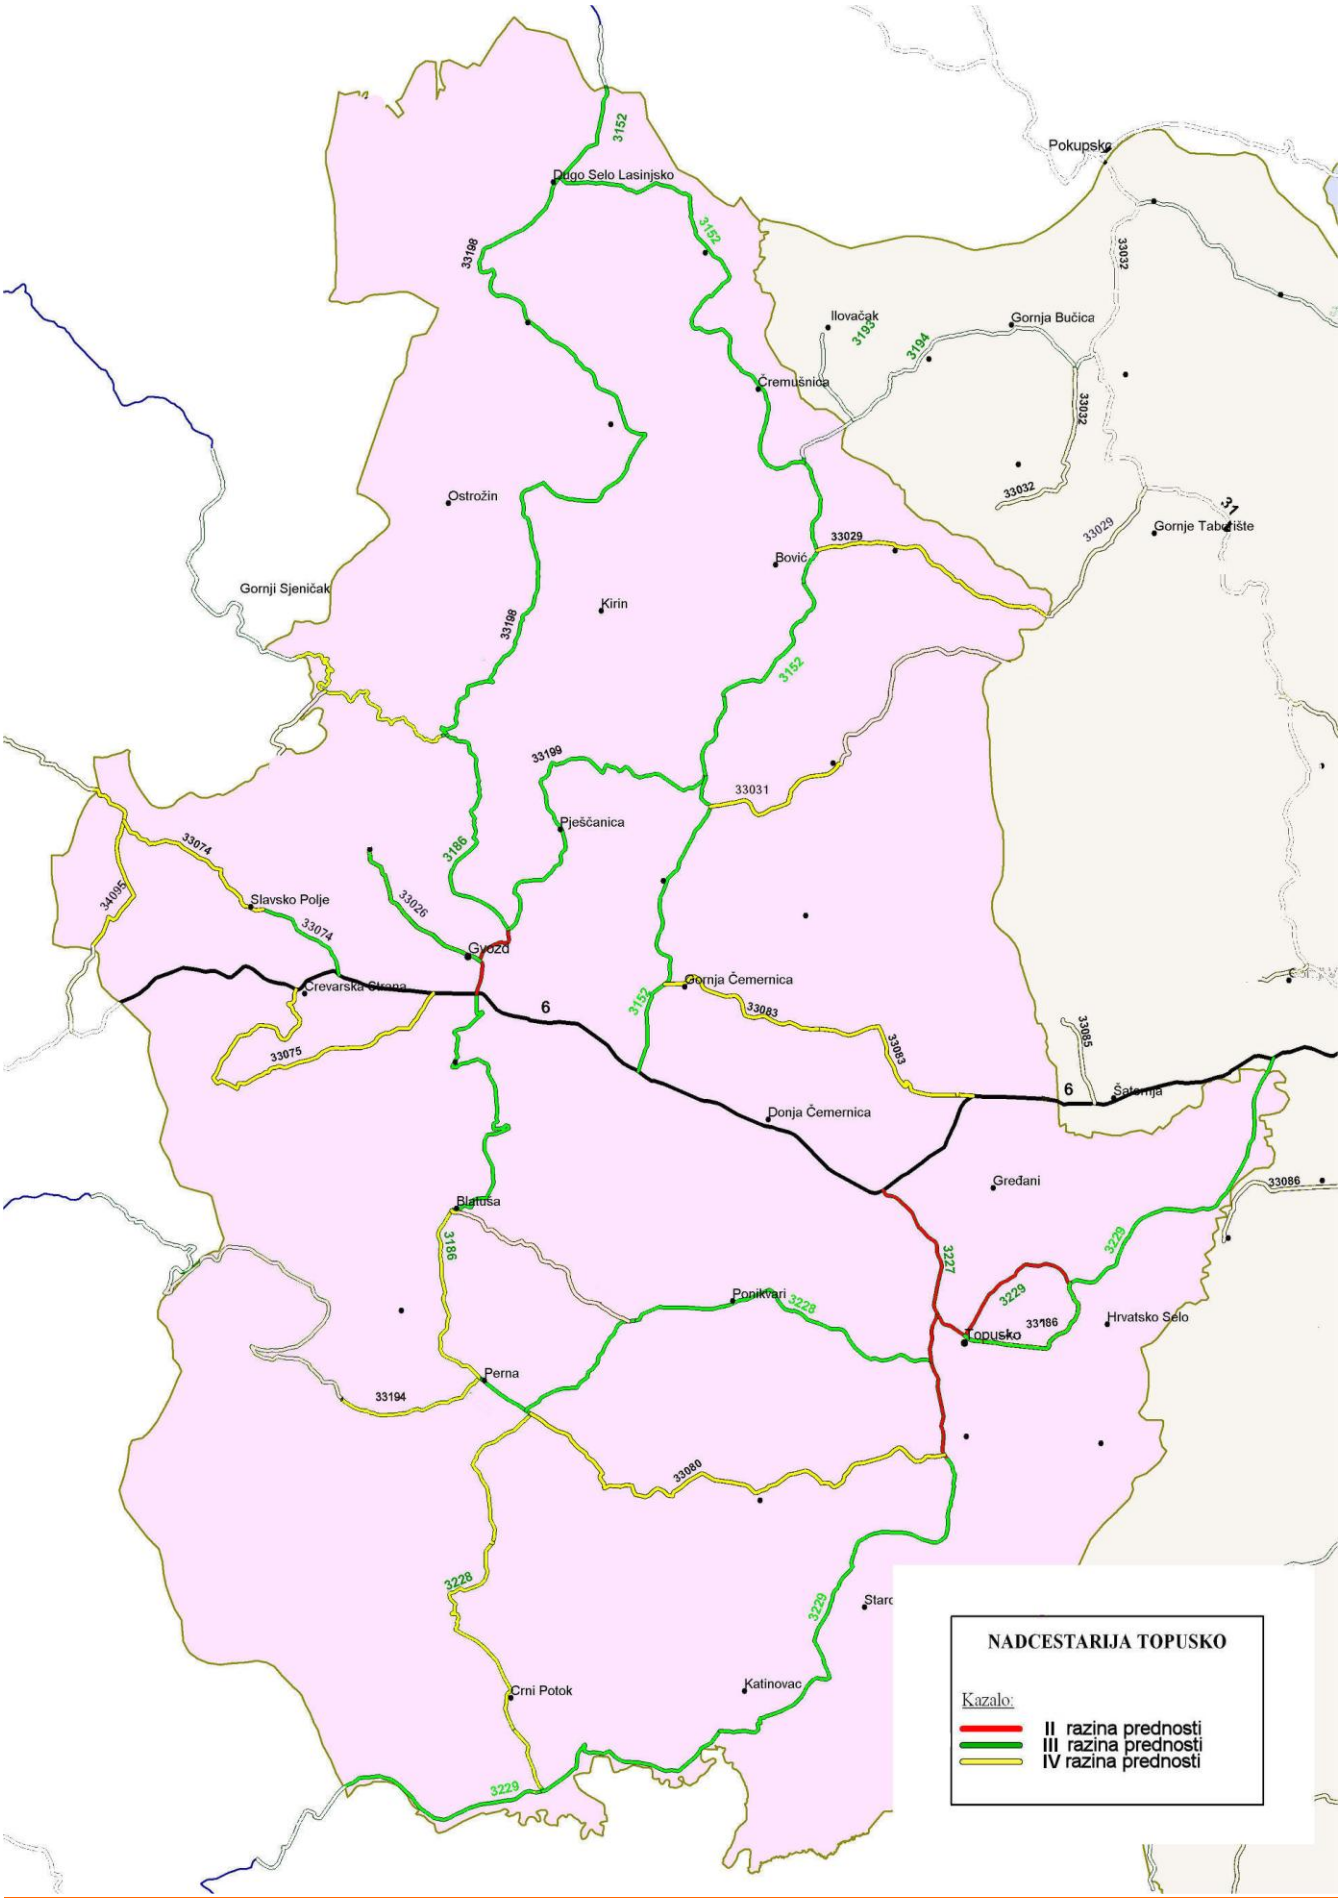
MJESTO PRIPRAVNOSTI SUNJA

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	Ž 3294	Sunja (D224) – Hrvatska Dubica (D47)	II	26,432
		UKUPNO II RAZINA:		**26,432**
1.	Ž 3211	Gornja Letina (L33067) – Sunja – D224	III	7,917
2.	Ž 3244	D 30 - M. Gradusa - Drljače – D224	III	13,910
3.	Ž 3247	Sunja (Ž 3211) - Bistrač - Strmen - Slovinci – Timarci	III	29,055
4.	L 33067	Gornja Letina (Ž 3211) - Donja Letina	III	2,819
5.	L 33115	Drljača (Ž 3244) - Četvrtkovac (L 33116)	III	1,012
6.	L 33116	D224 – Četvrtkovac – Radonja Luka – L33117	III	2,532
7.	L 33130	Sunja (L 33129) - D 224	III	1,395
8.	L 33131	Sunja (L33129) – Krivaj Sunjski	III	2,626
9.	L 33132	Ž 3247 – Žreme	III	1,169
10.	L 33136	Strmen (Ž 3247) - Crkveni Bok – Ivanjski Bok	III	5,695
11.	L 33178	Donji Cerovljani (Ž3294) – želj. postaja – D47	III	4,216
		UKUPNO III RAZINA:		**72,346**
1.	L 33117	M. Gradusa (Ž3244) – Svinica – G. Hrastovac (D224)	IV	10,272
2.	L 33066	Brđani Kosa (D 224) - Vukoševac - Ž 3244	IV	4,748
3.	L 33116	D224 – Četvrtkovac – Radonja Luka – L33117	IV	5,000
4.	L 33129	Sunja (Ž 3211) - D224	IV	3,261
5.	L 33120	Staza (Ž3294) – Želj. postaja	IV	0,986
6.	L 33126	D224 – G. Meminska – Timarci (Ž3247)	IV	6,595
7.	LC 33062	NC 320800 - Blinjska Greda - Donjani – D 224	IV	4,845
8.	LC 33064	D224 – Kinjačka – Staro Selo (NC 331090)	IV	3,288
9.	LC 33193	L33109 - Sjeverovac - Ž3244	IV	1,905
		UKUPNO IV RAZINA:		**40,900**
		SVEUKUPNO SUNJA:		**139,678**


NADCESTARIJA SUNJA
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti
Prelošćica
Gušće
Gornje Komarevo
Donje Komarevo
Blinjski Kut
Kinjačka
Madžari
Brđani Cesta
Greda Sunjska
Sunja
Bobovac
Staro Selo
Drljača
33116
Četvrtkovac
Strmen
Crkveni Bok
Velika Gradusa
Donji Hrastovac
Staza
Svinica
Gornji Hrastovac
Slovinci
Timarci
Šaš
Donji Kukuruzari
Kostajnički Majur
Donja Velešnja
Utolica
Živaja
Hrvatska Kostajnica
Rosulje
Baćin
Slabinja
Hrvatska Dubica
224
47
30
3294

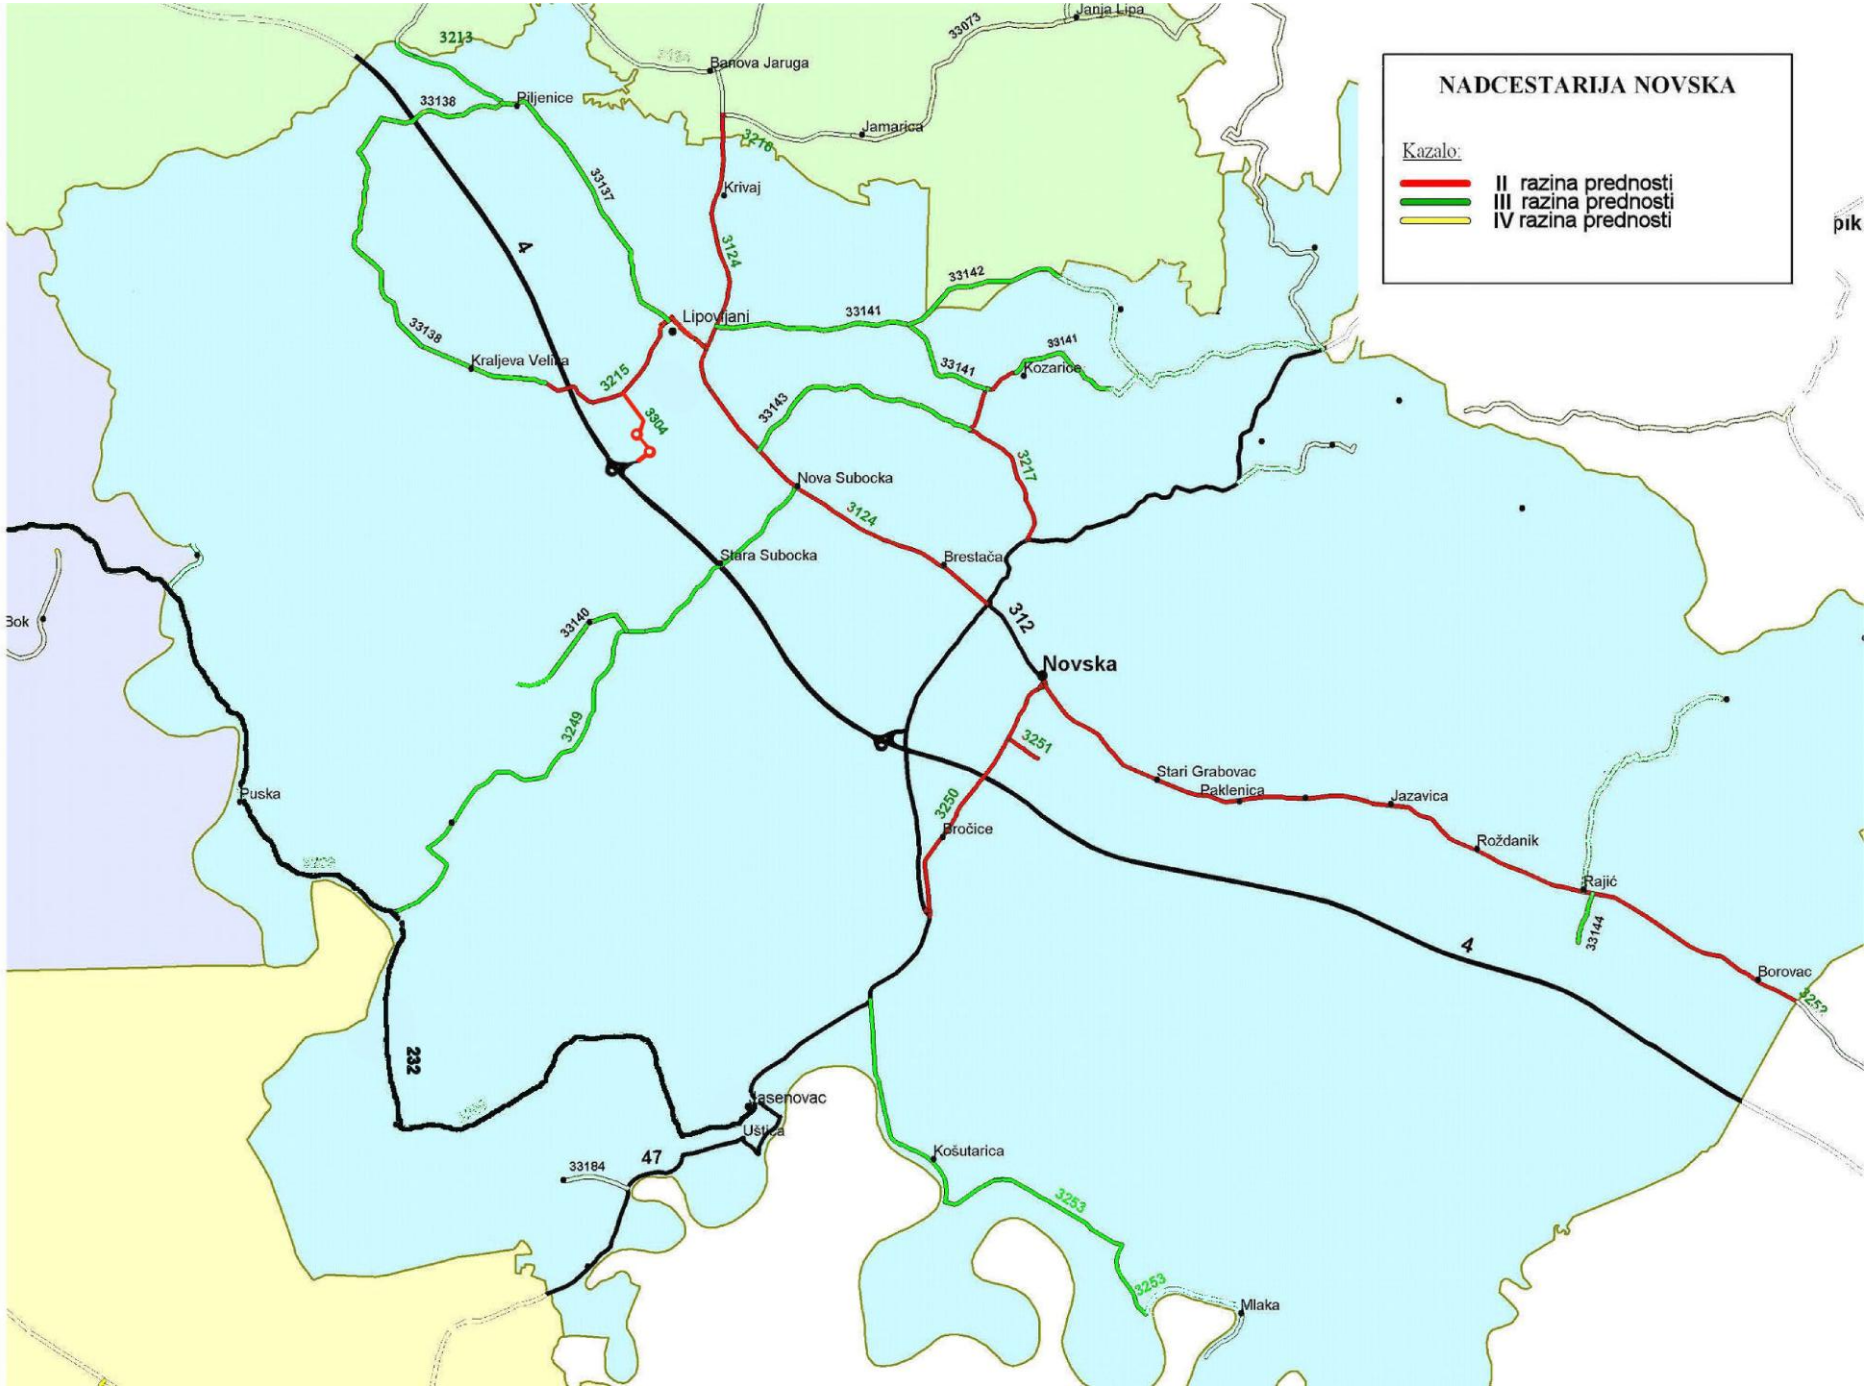
MJESTO PRIPRAVNOSTI TOPUSKO

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	Ž 3186	Turanj (D1)-Skakavac-Gvozd-Perna (Ž3228)	II	1,500
2.	Ž 3227	D6 - Topusko (Ž3229)	II	2,666
3.	Ž 3229	D6 – Topusko – Katinovac – Maljevac (D216)	II	5,000
		UKUPNO II RAZINA:		**9,166**
1.	Ž 3186	Turanj (D1)-Skakavac-Gvozd-Perna (Ž3228)	III	17,700
2.	Ž 3152	D36 – Lasinja – Bović – Blatuša (D6)	III	24,100
3.	Ž 3228	Topusko (Ž3229) – Ponikvari – Crni Potok – Ž3229	III	10,000
4.	Ž 3229	D6 – Topusko – Katinovac – Maljevac (D216)	III	23,200
5.	L 33199	Gvozd (Ž3186) – Ž 3152	III	7,230
6.	L 33198	D.Selo Lasinjsko (Ž3152)-Stipan-Ž3186	III	15,286
7.	L 33074	L34095 – Slavsko Polje – D6	III	2,000
8.	L 33026	Brnjavac – Gvozd (Ž 3186)	III	3,069
9.	L33186	Topusko (Ž3229) – Hrvatsko Selo – Ž3229	III	2,918
		UKUPNO III RAZINA:		**105,503**
1.	Ž 3186	Turanj (D1) – Skakavac – Gvozd – Perna (Ž3228)	IV	2,800
2.	Ž 3228	Topusko (Ž3229)-Ponikvari-Crni Potok-Ž3229	IV	7,426
3.	L 33029	Ž3152 – Golinja – G. Taborište – D31	IV	3,500
4.	L 33031	Kozarac (Ž 3152) – G. Trstenica	IV	3,043
5.	L 33074	L34095 – Slavsko Polje – D6	IV	3,235
6.	L 33075	Crevarska Strana (D6) – D6	IV	8,061
7.	L 33080	Perna - Ž3228 - Vorkapić - Ž3229	IV	9,121
8.	L 33083	G. Čemernica (Ž3152) - D6	IV	7,049
9.	L 34095	L 34091 – Utinja Vrelo – Malešević Selo – Vojišnica (D 6)	IV	3,600
10.	L 33194	Suva Perna - Perna (Ž3186)	IV	2,665
		UKUPNO IV RAZINA		**50,500**
		SVEUKUPNO TOPUSKO		**165,169**


Pokupsko
Dugo Selo Lasinjsko
Ilovačak
Gornja Bučica
Čremušnica
Ostrožin
Bović
Gornje Taborište
Gornji Sjeničak
Kirin
Pješčanica
Slavsko Polje
Gvozd
Crevarska Strana
Gornja Čemernica
Donja Čemernica
Šatornja
Gređani
Blatuša
Ponikvari
Topusko
Hrvatsko Selo
Perna
Crni Potok
Katinovac
NADCESTARIJA TOPUSKO
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti

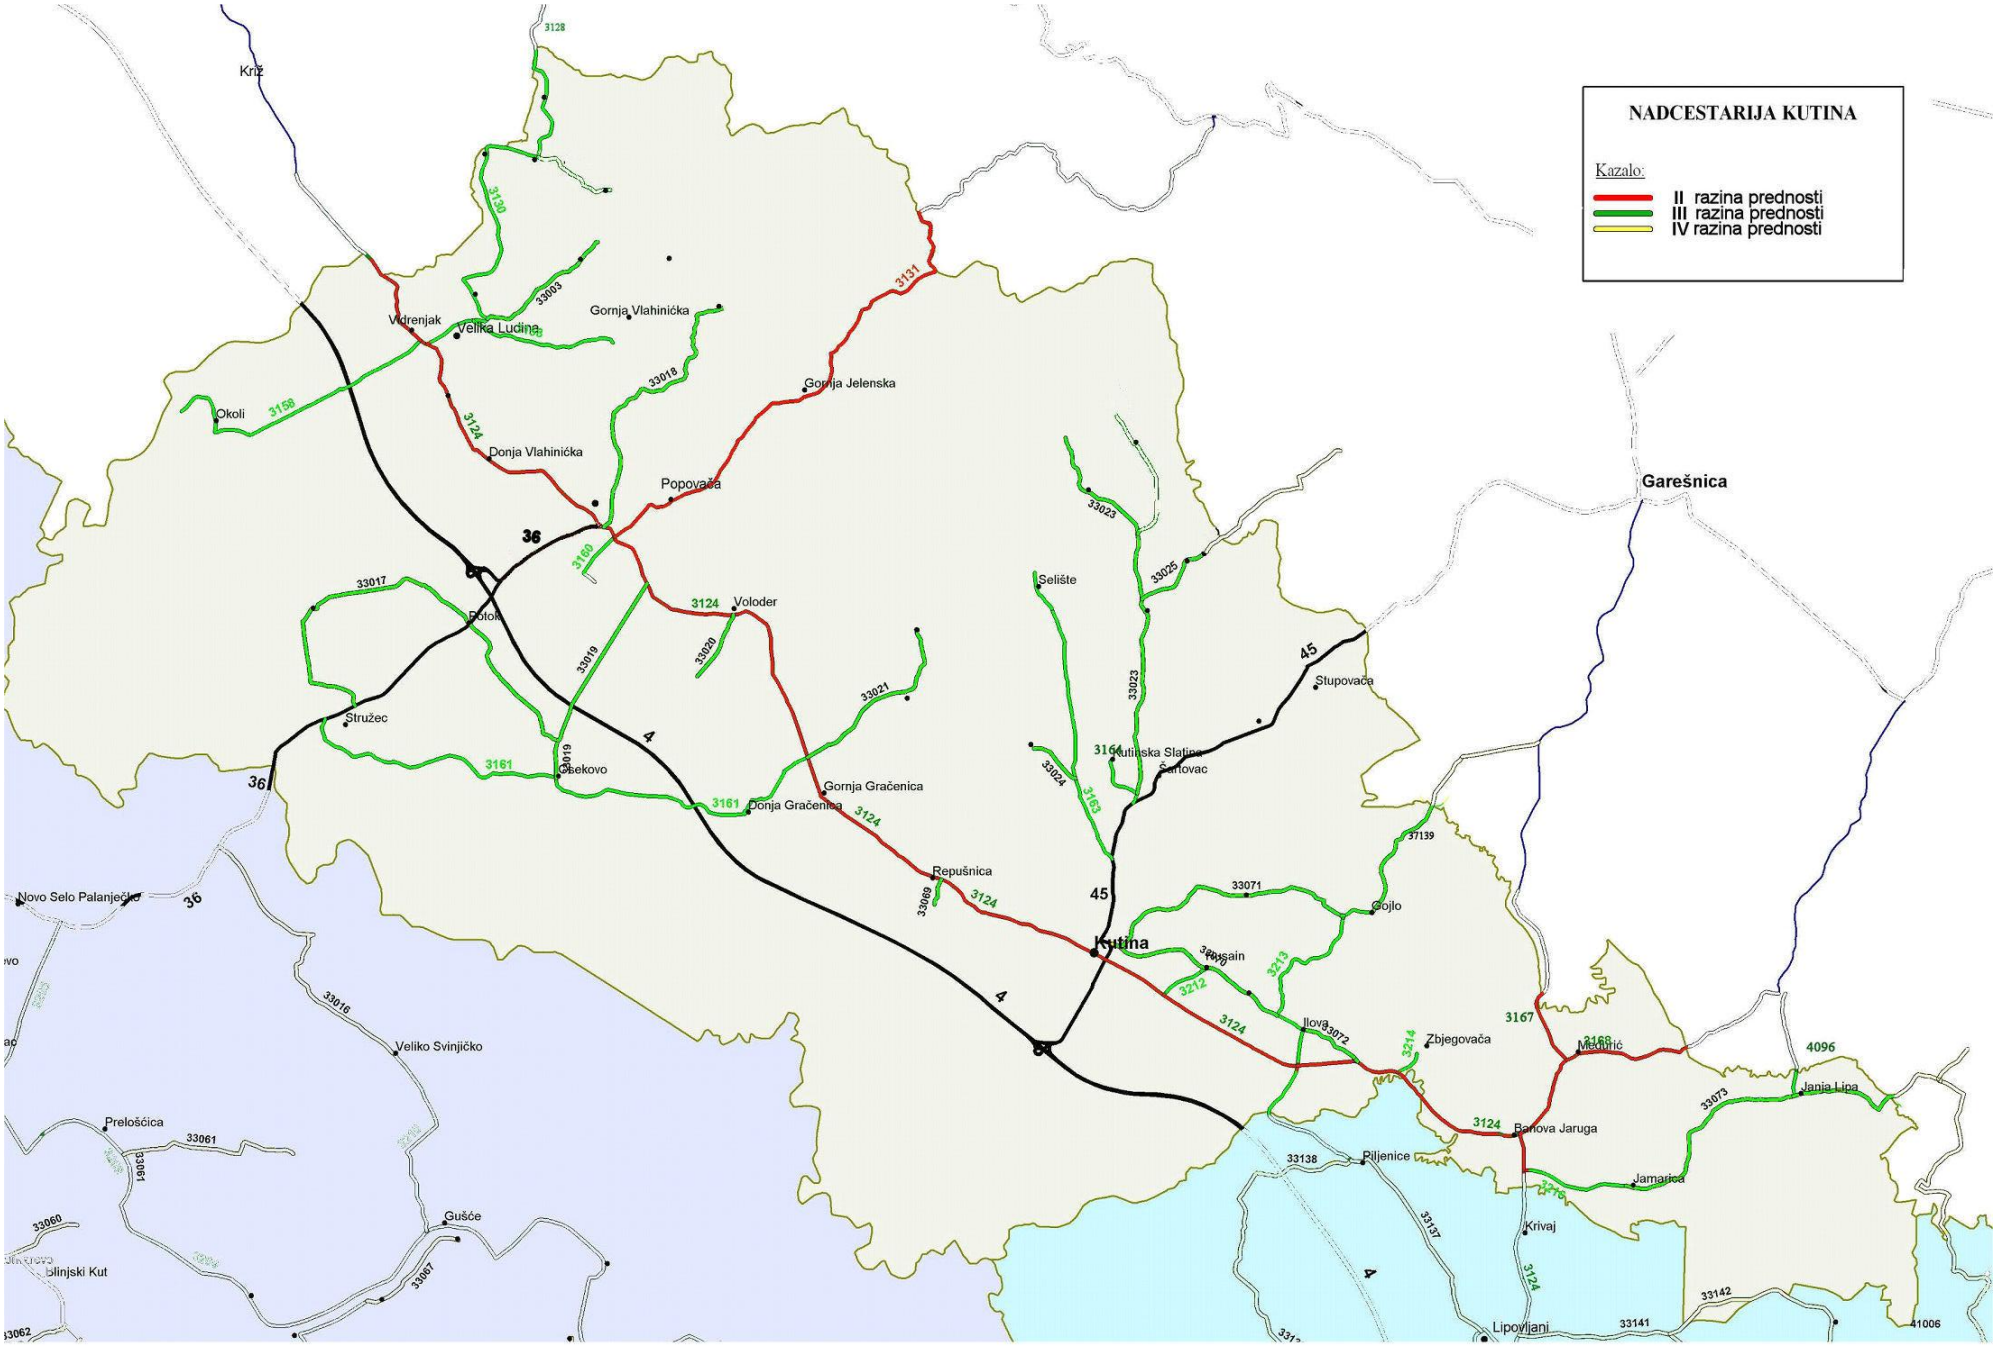
MJESTO PRIPRAVNOSTI NOVSKA

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	Ž 3124	D43 – Bunjani – Voloder – Kutina – Novska (D47)	II	11,400
2.	Ž 3215	Kraljeva Velika (L33138) – Lipovljani (Ul. braće Radić)	II	4,107
3.	Ž 3217	Kozarice (L33141) – D47	II	3,463
4.	Ž 3250	Novska (D312) – Bročice – D47	II	4,901
5.	Ž 3251	Novska: Ž3250 – Želj. postaja	II	0,687
6.	Ž 3252	Novska (D312) – Okučani (D5)	II	15,700
7.	Ž 3304	Ž3215 – Industrijska zona Blatnjača – čvorište Lipovljani	II	1,724
		UKUPNO II RAZINA:		**41,982**
1.	Ž 3213	Gojlo (L37139) – Piljenice (L33137)	III	2,500
2.	Ž 3253	D47 – Košutarica – Mlaka	III	9,409
3.	Ž 3249	Nova Subocka (Ž3124) - St. Subocka - Krapje (Ž3209)	III	12,262
4.	L 33137	Piljenice (Ž3213) – Lipovljani (Ž3215)	III	5,385
5.	L 33138	Piljenice (Ž3213) – Kraljeva Velika (Ž3215)	III	9,721
6.	L 33141	Lipovljani (Ž3124) – Ž3217 – Kozarice	III	8,202
7.	L 33140	St. Subocka (Ž3249) – Sigetac	III	2,772
8.	L 33142	L33141 - Novi Grabovac	III	3,018
9.	L 33143	Ž3124 – Ž3217	III	4,624
10.	L 33144	Rajić (Ž 3252) - željeznička postaja	III	0,946
		UKUPNO III RAZINA		**58,839**
		SVEUKUPNO NOVSKA		**100,821**


NADCESTARIJA NOVSKA
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti
Janja Lipa
33073
3213
Banova Jaruga
Piljenice
33138
Jamarica
3216
33137
Krivaj
4
3124
33142
Lipovljani
33141
33138
Kraljeva Velika
3215
33141
33141
Kozarice
3904
33143
3217
Nova Subocka
3124
Stara Subocka
Brestača
Bok
33140
312
Novska
3249
3251
Stari Grabovac
Paklenica
Jazavica
Puska
3250
Pročice
Roždanik
Rajić
33144
4
Borovac
3252
232
Jasenovac
Uštica
Košutarica
33184
47
3253
3253
Mlaka

MJESTO PRIPRAVNOSTI KUTINA

R.b.	Kategorija i broj ceste	O P I S C E S T E	Razina prednosti	Duljina (održavanja)
1.	Ž 3124	D43 - Bunjani - Voloder - Kutina – Novska (D47)	II	38,600
2.	Ž 3131	G. Garešnica (D26) – G. Jelenska – Podbrđe (Ž3124)	II	11,500
3.	Ž 3167	Garešnica (D26) – Kaniška Iva – Međurić (Ž3168)	II	1,700
4.	Ž 3168	Uljanik (D26) – Poljana – Međurić – B. Jaruga (Ž3124)	II	5,100
		SVEUKUPNO II RAZINA		**56,900**
1.	Ž 3128	Čazma (D43) – Rečica Kriška – Ž3124	III	0,400
2.	Ž 3130	Ž 3128 – M. Ludina – Ž 3158	III	8,916
3.	Ž 3158	Okoli – V. Ludina – Gornja Vlahinička	III	11,802
4.	Ž 3160	Želj. postaja »Popovača« – Popovača (Ž3124)	III	1,100
5.	Ž 3213	Gojlo (L37139) – Piljenice (L33137)	III	6,750
6.	Ž 3161	Stružec (D36) – Osekovo – Gornja Gračenica (Ž3124)	III	13,437
7.	Ž 3163	Selište-D45	III	7,718
8.	Ž 3164	Kutinska Slatina-D45	III	1,433
9.	Ž 3212	Ž3124 – Husain (L33070)	III	1,210
10.	Ž 3214	Zbjegovača – Ž3124	III	0,605
11.	Ž 3216	Ž3124 – Jamarica (L33073)	III	2,722
12.	Ž 4096	Poljana (Ž4236) – Janja Lipa (L33073)	III	0,600
13.	L 33003	Katoličko Selišće – Ž3130	III	2,690
14.	L 33017	Stružec (D36) – Potok – L33019	III	11,110
15.	L 33018	Moslavačka Slatina – Popovača (Ž 3124)	III	7,024
16.	L 33019	Ž3124 – Osekovo (Ž3161)	III	5,137
17.	L 33020	Voloder (Ž3124) – želj. postaja	III	1,703
18.	L 33021	Mikleuška-Ciglenica-Ž 3124	III	5,335
19.	L 33023	Kutinica - Katoličke Čaire - Ž 3164	III	9,226
20.	L 33024	Kletište - Ž 3163	III	1,291
21.	L 33025	Katoličke Čaire (L33023)-Čaire	III	1,804
22.	L 33069	Repušnica (Ž3124) – želj. postaja	III	0,655
23.	L 33070	Kutina (D45)-Husain-Batina-Ž 3213	III	4,530
24.	L 33071	Kutina (L 33070)-Mišinka-Ž 3213	III	6,261
25.	L 33072	Ilova (Ž 3213)-Ž 3124	III	1,382
26.	L 33073	Jamarica(Ž3216)-Janja Lipa - Brezine(Ž4095)	III	7,400
27.	L 37139	Malo Vukovje (Ž 3167) – Gojlo (Ž 3213)	III	3,300
		UKUPNO III RAZINA:		**125,541**
		SVEUKUPNO KUTINA		**182,441**


NADCESTARIJA KUTINA
Kazalo:
II razina prednosti
III razina prednosti
IV razina prednosti
Križ
Vidrenjak
Velika Ludina
Gornja Vlahinićka
Okoli
Donja Vlahinićka
Popovača
Gornja Jelenska
Garešnica
Selište
Voloder
Stružec
Sisekovo
Gornja Gračenica
Donja Gračenica
Repušnica
Stupovača
Kutinska Slatina
Šamovac
Kutina
Gojlo
Ilova
Zbjegovača
Banova Jaruga
Janja Lipa
Jamarica
Piljenice
Krivaj
Lipovljani
Novo Selo Palanječko
Veliko Svinjičko
Prelošćica
Gušće
Blinjski Kut
36
4
45
3124
3131
3130
3158
3159
3169
3161
3163
3164
3167
3168
3212
3213
3214
4096
33003
33017
33018
33019
33020
33021
33023
33024
33025
33061
33067
33071
33072
33073
33137
33138
33141
33142
37139
41006

5. RASPORED MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE, RADNE SNAGE POTREBNE ZA IZVOĐENJE PLANIRANIH RADOVA, RASPORED DEŽURSTAVA TE OBVEZNE PRISUTNUSTI

Za stupanj pripravnosti	MJESTO PRIPRAVNOSTI								
	Sisak	Petrinja	Hrvatska Kostajnica	Glina	Dvor	Sunja	Topusko	Kutina	Novska
I stupanj Dežurni	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cestar II	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kamion do 2 t	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kamion s posipačem	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Utovarivač (rovokopač)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unimog s posipačem i ralicom	1								
II stupanj Dežurni	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cestar II	(2) 6	(3) 5	4	(2) 5	(1) 3	(1)3	(2) 3	(3) 4	(3)4
Kamion do 2 t	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kamion s posipačem i ralicom	(1) 5	(2) 4	2	(0) 3	1	(1)2	(1) 2	(3) 4	(2)3
Unimog s posipačem i ralicom	(1)2	(1)2	1	(2)	(2)	1	(1)	(1)	(1)
Utovarivač (rovokopač)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auto dizalica 28 t	1								
III stupanj Dežurni	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cestar II	(2) 6	(3) 5	4	(2) 5	(1) 3	(1)3	(2) 3	(3) 4	(3)4
Kamion do 2 t	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kamion s posipačem i ralicom	(1)5	(2) 4	2	(0) 3	1	(1)2	(1) 2	(3) 4	(2)3
Unimog s posipačem i ralicom	(1)2	(1)2	1	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)
Utovarivač (rovokopač)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Auto dizalica 28 t	1								

NAPOMENA: Brojke u zagradama označavaju potreban broj ljudstva i mehanizacije uključenih u prvu razinu prednosti i zastupljena su 100% u potrebama ŽUC-a.

Potreban materijal za posipavanje kolnika i njegov razmještaj po mjestima pripravnosti

Prema polaznim osnovama za izradu ovog izvedbenog programa rada zimske službe predviđene su sljedeće količine soli i kamenog agregata.

Mjesto pripravnosti	P o s i p a l o	
	S o l (t)	Kameni agregat 4-8 (m3)
Sisak	**230**	**250**
Petrinja	**230**	**250**
Hr. Kostajnica	**140**	**150**
Glina	**180**	**200**
Dvor	**130**	**150**
Sunja	**220**	**250**
Topusko	**200**	**200**
Kutina	**240**	**260**
Novska	**180**	**190**
UKUPNO:	**1750**	**1900**

Raspored dežurstava, obvezne prisutnosti te raspored radnih skupina određuje Izvoditelj radova samostalno uz poštivanje propisa iz područja radnih odnosa, ali uz obvezu da osigura stalno dežurstvo za vrijeme trajanja zimske službe po svim mjestima stalne pripravnosti kao i da rasporedom dežurstava i obvezne prisutnosti osigura izvršenje radova zimske službe na način i u rokovima definiranim ovim Izvedbenim programom zimske službe.

6. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Zimska služba djeluje uvođenjem stupnjeva pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i geografsko-klimatskim značajkama područja.

Za potrebe proračuna, a na temelju iskustva i višegodišnjih meteoroloških promatranja, stupnjevi pripravnosti vremenski se razgraničavaju:

Zimska služba	Broj dana po stupnjevima		
	I	II	III
Očekivani broj dana	**30**	**60**	**30**

Vremensko razgraničenje stupnjeva pripravnosti treba shvatiti uvjetno jer oni stvarno nisu kalendarski odredivi, već ih određuju meteorološke i vremenske prilike, te se u skladu sa nastalim ili prognoziranim meteorološkim i vremenskim uvjetima vrši prijelaz iz jednog u drugi stupanj pripravnosti.

Odluku o uvođenju pojedinog stupnja pripravnosti donosi odgovorna osoba izvoditelja radova zimske službe uz prethodnu suglasnost s odgovornom osobom za kontrolu i nadzor rada zimske službe te isto evidentira u dnevnik zimske službe.

1. Prvi stupanj pripravnosti uvodi se s početkom rada zimske službe, a prema ovom izvedbenom programu.

Uvodi se stalno dežurstvo u mjestima pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada, te se osigurava potreban broj ljudstva i mehanizacije radi intervencije u slučaju potrebe.

2. Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kad temperatura zraka, oscilira oko 0°C s predvidivom mogućnošću slabih oborina (kiše, susnježice ili snijega), te se s obzirom na stupanj prohlađenosti kolnika može pojaviti poledica.

Po određenom redoslijedu izvode se radovi na spriječavanju poledice i čišćenju snijega.

3. Treći stupanj pripravnosti uvodi se kada se predviđa intezivnije i dulje padanje snijega.

Po određenom redosljedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenju snijega sa kolnika za što se aktivira sva potrebna mehanizacija i ljudstvo.

4. Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kad sniježne oborine, uz jak vjetar, imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega.

U tim uvjetima, u pravilu se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometa.

7. NACRT POSIPAVANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJE SNIJEGA

Redosljed i prvenstvo izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima s obzirom na veličinu cestovne mreže, kao i raznolikosti u svezi važnosti pojedinih pravaca, na županijskim i lokalnim cestama intervenira se prema razinama prednosti.

Izvođenje radova obavlja se po sljedećem redosljedu:

1. Spriječavanje poledice i čišćenje snijega s kolnika ceste i prometne signalizacije.
2. Spriječavanje poledice i čišćenje snijega s autobusnih stajališta.
3. Čišćenje snijega i drugi radovi na ostalim dijelovima ceste.
4. Popuna deponija kamenim agregatom, soli i drugi radovi na održavanju.

TABELARNI PREGLED CESTA PO MJESTIMA PRIPRAVNOSTI I RAZINAMA PREDNOSTI

Razina prednosti	Sisak	Petrinja	Hrvatska Kostajnica	Glina	Dvor	Sunja	Topusko	Novska	Kutina
II	19,605	33,793	-	28,574	8,475	26,432	9,166	41,982	56,900
III	87,473	88,330	55,004	80,439	104,775	72,346	105,503	58,839	125,541
IV	18,926	23,746	12,508	43,981	37,432	40,900	50,500	-	-
Ukupno	126,004	145,869	67,512	152,994	150,682	139,678	165,169	100,821	182,441

8. DINAMIKA PROVOĐENJA POJEDINIH AKTIVNOSTI I OSIGURANJE PROHODNOSTI

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti koja je utvrđena ovim programom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljišno-klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama.

Razvrstavanje cesta po razini prednosti određuje upravitelj ceste na način da osigura i uskladi prohodnost cjelokupne cestovne mreže.

Razvrstavanje cesta u odnosu na razine prednosti i osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima prikazana je u sljedećoj tablici:

Razine prednosti	Vrsta javne ceste	Osiguranje prohodnosti	Intezitet snježenja	
			Prosječni	Iznadprosječni
I.	Autoceste i brze ceste	24 sata	Osiguranje prohodnosti kolnika, važnijih raskrižja, prilaza većim odmorištima i zaustavnih traka	Osiguranje prohodnost jednog prometnog traka i prilaza većim parkiralištima
II.	Javne ceste s PGDP > 4000, priključne ceste, koje povezuju državne ceste sa autocestama, kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje, međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima, međunarodnim zračnim lukama, morskim lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, državnim riječnim lukama, trajektnim lukama kojima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže.	od 5:00 do 22:00 sata	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati	Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog) s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati
III.	Županijske ceste te osobito one koje povezuju državne i županijske ceste s morskim i riječnim lukama županijskog značenja, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, robnim terminalima, izdvojenim građevinskim područjima i lokalitetima ugostiteljsko turističke i sportsko-rekreacijske namjene, izdvojenim građevinskim područjima proizvodne i poslovne namjene, lokalitetima i građevinama ubilježenim u državnim registrima kao povijesno-kulturna ili prirodna baština, naseljima većim od 300 stanovnika, s tim da je udaljenost početka naselja od razvrstane ceste veća od 500 m te važnije lokalne ceste	od 5:00 do 20:00 sati	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati	Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog prometnog traka) s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati
IV.	Ostale lokalne ceste	od 7:00 do 20:00 sati, uskladiti s lokalnim potrebama	Osiguranje prohodnosti s mogućim kraćim zastojima	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana
V.	Ostale javne ceste i površine, parkirališta, biciklističke staze	Uskladiti s lokalnim potrebama	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana	Osiguranje prohodnosti s mogućim višednevnim zastojima
VI.	Ostale javne ceste koje su u zimskom razdoblju zatvorene	-	-	-

Pod osiguranjem prohodnosti, podrazumijeva se prema članku 38. Pravilnika o održavanju cesta (NN broj 90/14; 03/21) da je cesta iz I. i II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Na temelju članka 39. Pravilnika o održavanju cesta (NN broj 90/14; 3/21) a u iznimnim situacijama, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost na cesti u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti, kao zametenost ceste nanosima, zakrčenosti poprečno postavljenim vozilima na prometnici, kao i za zimske uvjete neopremljenim vozilima, kvara radnog vozila ili stroja te nužnosti uključenja drugog vozila ili stroja, navedena dinamika se obavlja u produženom trajanju zavisno od okolnosti s tim da se primjereno ocjenjuje primjena mjera: kao raskrčivanje vozila-izvlačenje, proboj zametenosti, otklanjanje kvarova i zamjena radnog vozila ili stroja, u krajnjem i zatvaranje prometa na takvoj dionici, postavom signalizacije, a sa punom aktivnosti rješavati razloge prekida i osposobljavati prometnicu.

9. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA ZIMSKE SLUŽBE

Nadzor i kontrolu rada zimske službe obavljaju imenovani inženjeri naručitelja za poslove koordinacije, kontrole i nadzora.

Dežurne osobe izvođača u mjestima pripravnosti, **OBAVEZNE** su telefonskim putem prema imenovanim inženjerima naručitelja za poslove koordinacije, kontrole i nadzora sljedeće:

- kod uvedenog drugog, trećeg i četvrtog stupnja pripravnosti, izvjestiti dva puta dnevno o stanju na cestama.
- zatražiti mišljenje prije svake promjene stupnja pripravnosti.
- zatražiti mišljenje prije svakog izlaska vozila na ralenje i posipanje cesta.
- izvjestiti o zatvaranju pojedinih dionica cesta ili cesta u cijelosti, u slučaju poledice, jakih padalina ili događaja više sile.
- izvijestiti o kvarovima ili izlijetanju vozila zimske službe sa cesta, ukoliko bi to značilo kašnjenje pri obavljanju radova na ralenju i posipanju županijskih i lokalnih cesta.
- zatražiti mišljenje za upotrebu posipanja samo sa solju bez kamenog agregata, u slučaju jakih poledica ili nekih drugih opravdanih razloga.
- zatražiti mišljenje kod bilo kakvih bitnih promjena i situacija, koje bi mogle za posljedicu imati poskupljenje rada zimske službe.

Naručitelj radova zadržava pravo ne priznavanja pojedinih izlazaka vozila na posipavanju i ralenju cesta u mjesečnom obračunu sati radova istih, ukoliko se ne zatraži mišljenje imenovanog inženjera naručitelja za poslove koordinacije, kontrole i nadzora prije izlaska vozila.

Nadzorni inženjeri naručitelja provoditi će učestale kontrole rada na sljedeće načine:

- kontrolirati vozila u radu zimske službe na županijskim i lokalnim cesta putem evidentiranih GPS zapisa i podataka o kretanju vozila i strojeva. (U koliko ne postoji GPS zapis vozila na radu u zimskoj službi, isti se neće obračunati)
- kontrolirati potrošnju soli i kamenog agregata utrošenog po metru kvadratnom, uzimanjem uzoraka netom nakon prolaska vozila zimske službe.
- učestalim obilascima mjesta pripravnosti u svim stupnjevima pripravnosti. (U koliko vozila i potrebna radna snaga nije prisutna u mjestima pripravnosti u prvom stupnju pripravnosti, ti dani se neće uzimati u obzir kod obračuna za stavku broj 9.2.1. Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu prema izvedbenom programu.)
- te na sve ostale načine kontrolirati rad zimske službe na županijskim i lokalnim cestama.

Člankom 18. Ugovora o izvođenju radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije, Klasa:406-01/25-01/02, Ur.broj: 2176-154-40-26-33, od 30.04.2026.g. izvođači radova redovitog održavanja na županijskim i lokalnim cestama, odnosno njihova vozila na radu u zimskoj službi obavezni su imati **isključivo roto-posipače** za tretiranje kolnika mješavinom soli i kamenog agregata, potrošnje posipala prema uvjetima na cestama i intenzitetu padalina i to **u omjeru 1/1** (soli/kamenog agregata) na asfaltnim cestama prvog prioriteta (II razine prednosti), te **omjera 1/2 i 1/3** (soli/kamenog agregata) na asfaltnim cestama ostalih prioriteta (III i IV razine prednosti), a u vidu racionalnije potrošnje soli, zaštite okoliša odnosno sprječavanja nastanka zagađenja.

Dužnost odgovornih osoba po mjestima pripravnosti je da vode službeni **dnevnik zimske službe**. Dnevnik je osnovni dokument o kretanju i registraciji svih događaja, obavijesti, naloga, izvršenih radova, vremenskih prilika i drugih važnih sadržaja za rad zimske službe, pa ga treba pomno i ažurno voditi. U dnevnom vođenju u dnevnik treba kronološkim redom upisati sve sadržaje kako oni nastaju.

Potrebno je i važno registrirati:

- Vremenske prognoze, kao i mjerenje temperature zraka svakih 2 sata.
- U izvršavanju redosljeda razine prednosti cesta, upisati vrijeme izlaska kao i povratka vozila, strojeva i ljudstva, kada su pristupili i izvršili zadatak posipanja, čišćenja ili oba zadatka.
- Utrošak soli i kamenog materijala za izvršeno posipavanje tog dana, po brojevima cesta
- Sadržaje predanih izvještaja o stanju na cestama, izvanrednim događajima, udesima i okolnostima kako su nastali.
- Za zatvaranje ceste, privremenu regulaciju obzirom na stanje kolnika i režim prometa, upisati svako postavljanje signalizacije i nastalu promjenu s lokacijom i izvršiteljima.
- Sve štete na cesti ili objektima koje nastanu po učesnicima u prometu, o uviđajima prometnih organa, snimiti podatke o počiniteljima radi ostvarenja odštetnih zahtjeva.
- Po završetku ZS, dnevnike zimske službe društvo kapitala pohranjuje u dokumentacijskom arhivu.
- Dnevnici se označavaju mjestom pripravnosti, brojem i datumom vremenskog razdoblja.
- Nadzorni inženjer naručitelja može tražiti da se evidentiraju i događaji koji nisu naprijed navedeni.

Odgovorne osobe po mjestima pripravnosti mogu voditi i knjigu dežurstva.

10. ODGOVORNOST ZA ŠTETU I ŠTETNE DOGAĐAJE

Temeljem članaka 44. do 49. Ugovora za izvođenje radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije Klasa:406-01/25-01/02, Ur.broj: 2176-154-40-26-33, od 30.04.2026.g., SVU ODGOVORNOST za štetu i štetne događaja snosi ugovoreni izvođač radova.

Prijepis članka 44-49 Ugovora za izvođenje radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije:

Odgovornost za štetu i štetne događaje
Članak 44.
Klauzula „integritet“
(1) Ugovaratelj se obvezuje da će se tijekom ispunjavanja ugovornih obveza ponašati profesionalno, neovisno, etički i s pažnjom dobroga stručnjaka sukladno Izjavi o integritetu iz Ponude Ugovaratelja.

Članak 45.
(1) Ugovaratelj se obvezuje obeštetiti Naručitelja, osoblje Naručitelja i njihove zastupnike u pogledu svih potraživanja šteta, gubitaka i troškova, uključivo i troškove odvjetnika i sudske pristojbe, u odnosu na:
- tjelesne povrede, obolijevanje ili smrt bilo koje osobe, a što je uzrokovano izvođenjem radova, odnosno propustom u izvođenju radova koji su predmet ovog Ugovora, dovršenjem ili otklanjanjem nedostataka, osim ako se to može pripisati nemaru, namjeri ili kršenju ugovora od strane Naručitelja, osoblja Naručitelja ili njegovih zastupnika i
štetu na ili gubitak imovine koja se ne odnosi na same radove u onoj mjeri kada takva šteta ili gubitak:
- nastanu kao posljedica izvođenja radova, odnosno propusta u izvođenju radova, i zbog otklanjanja nedostataka,
- nastanu zbog nemara, namjernog čina ili kršenja ugovora od strane Ugovaratelja, osoblja Ugovaratelja, njihovih zastupnika ili nekog drugoga kojeg je on posredno ili neposredno zaposlio.
Članak 46.
(1) Ugovaratelj ima punu odgovornost u odnosu na ugovorne radove i to od samoga početka njihovog izvođenja do trenutka preuzimanja tih radova.

(2) Ugovaratelj je odgovoran za gubitak ili štetu koja je nastala zbog njegovog djelovanja i nakon što su radovi koje je izveo preuzeti od strane Naručitelja, ako su gubitak ili šteta posljedica nekvalitetne izvedbe koja se nije mogla uočiti prilikom preuzimanja ili ako su gubitak ili šteta posljedica propusta Ugovaratelja u izvršenju svojih obveza, ali najdulje 2 (dvije) godine od dana preuzimanja.

(3) Ukoliko se cesti na kojoj Ugovaratelj izvodi radove ili ih je propustio izvesti, dogodi šteta u razdoblju kada je odgovoran za njih, Ugovaratelj će ispraviti štetu na svoj trošak, tako da te radove izvede sukladno ovom ugovoru.

(4) Ugovorne strane su suglasne da se odredbe ovoga članka neće primjenjivati na dionice cesta gdje su radovi ugovoreni i izvedeni prema ugovoru građenja, izvanrednog održavanja ili rekonstrukcije ceste za vrijeme trajanja radova i jamstvenog roka, koje je Naručitelj ugovorio s drugim Ugovarateljima, ako su gubitak ili šteta posljedica nekvalitetne izvedbe po tim ugovorima.

Članak 47.

(1) Ugovaratelj je obvezan sprječavati sve štetne događaje, nedopuštene radnje i aktivnosti na cesti, cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu, a koje bi mogle oštetiti cestu i ugroziti ili omesti sigurno odvijanje prometa.

(2) Ugovaratelj je obvezan, odmah po saznanju, obavijestiti Naručitelja o svakom štetnom događaju iz stavka 1. ovoga članka, evidentirati ga prema naputku Naručitelja te poduzeti sve mjere radi sprječavanja daljnjeg oštećivanja ceste.

(3) Evidentiranje štete iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i utvrđivanje visine štete, identiteta počinitelja ako je poznat, sve okolnosti vezane za nastanak štete te evidentiranje svih ostalih dostupnih podataka o šteti.

Članak 48.

(1) Ugovaratelj je obvezan osigurati se od odgovornosti prema trećim osobama i Naručitelju za štete nastale prilikom obavljanja radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, a prema uvjetima propisanima u Prilogu ovog Ugovora - „Uvjeti za osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama za štete nastale prilikom obavljanja radova redovitog održavanja“.

(2) Ugovaratelj je obvezan dostaviti presliku sklopljene police osiguranja Naručitelju najkasnije 8 dana prije najavljenog potpisivanja godišnjeg ugovora. Naručitelj ima pravo u roku od daljnjih 2 (dva) dana staviti primjedbe na podneseni nacrt ugovora o osiguranju i police osiguranja. Ugovaratelj je dužan u daljnjem roku od 5 (pet) dana dostaviti Naručitelju presliku sklopljenog ugovora o osiguranju i police osiguranja, u skladu sa iznesenim primjedbama Naručitelja.

Članak 49.

(1) Ugovaratelj je obvezan sudjelovati u svakoj parnici na strani Naručitelja, na poziv Naručitelja, ukoliko je predmet spora šteta trećim osobama prouzročena neispunjenjem odredbi ovog Ugovora od strane Ugovaratelja.

11. UVJETI KADA SE ZBOG SIGURNOSTI PROMETA ISTI OGRANIČAVA ILI ZABRANJUJE ZA POJEDINE VRSTE VOZILA

Pored Zakona o sigurnosti prometa na cestama, promet vozila u zimskim uvjetima reguliran je posebnom **"Pravilnikom o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste".**

Ako javna cesta ili pojedine dionice javnih cesta iz ovog Programa zbog vremenskih nepogoda ne budu sposobne za promet svih ili pojedinih vrsta vozila, odgovorna osoba izvoditelja radova zimske službe u dogovoru s nadzornim inženjerom naručitelja može donijeti odluku o obustavi prometa uopće ili za pojedine vrste vozila.

Ukoliko u operativnom djelovanju ove mjere ne budu dogovorene sa Policijskom upravom Sisačko-moslavačke županije, izvoditelja radova zimske službe dužan je, najkasnije sat vremena prije nastupa mjere zabrane ili ograničenja prometa na pojedinim dionicama cesta, isto javiti Upravi cestovnog prometa i Inspekciji za ceste Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, nadležnoj policijskoj upravi i informativnom centru HAK-a te javnost.

U isto vrijeme izvoditelj radova zimske službe poduzet će mjere da se u skladu s utvrđenim razinama prednosti i prema mogućnostima uklone smetnje i prometnica osposobi za prohodnost.

Na kritičnim mjestima (nadvožnjaci, veći mostovi, usponi, usjeci i sl.) na kojima utjecajem mikroklimatskih i konfiguracijskih okolnosti može sigurnost odvijanja prometa biti ugrožena, na osnovi dugogodišnjih praktičnih iskustava i opažanja, potrebno je takva **"kritična mjesta"** označiti odgovarajućom prometnom signalizacijom.

Odgovorne osobe u mjestima pripravnosti dužne su u pripremnom razdoblju izvršiti postavljanje prometne signalizacije za **"kritična mjesta"** na području svog djelovanja za cijelo vrijeme trajanja zimske službe. Vrijeme postavljanja i skidanja prometne signalizacije dokumentirano se unosi u dnevnik zimske službe.

12. SUSTAV VEZA

Sva mjesta pripravnosti imaju telefon kako je navedeno ovim Programom.

U prilogu ovom izvedbenom programu kojeg moraju izraditi ugovoreni izvoditelji radova zimske službe do početka rada zimske službe sadržavati će i ostale telefonske brojeve (kućni, mobitel) za odgovorne osobe i eventualno za mjesta pripravnosti.

U mjestima pripravnosti postoje stabilni i mobilni telefoni i oni su navedeni u prilogu ovog Programa sa naznakom mogućeg korištenja.

U mjestu pripravnosti koje odredi ugovoreni izvoditelji radova zimske službe mora postojati telefaks broj (044/531-554), kao i telefonski broj (044/531-591 ili 098/980-5220) ili elektronska pošta dezurstvo@ceste-sisak.hr za primanje vremenske prognoze od Državnog hidrometeorološkog zavoda ili za davanja informacija o stanju na cestama.

Člankom 21. Ugovora o izvođenju radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije, Klasa:406-01/25-01/02, Ur.broj: 2176-154-40-26-33, od 30.04.2026.g. ugovoreni izvođači radova redovnog održavanja dužna su osigurati praćenje cijelokupne mehanizacija prilikom rada za potrebe zimske službe putem GPS sustava.

13. OBAVJEŠĆIVANJE O STANJU I PROHODNOSTI CESTA

Obavješćivanju javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenjima i zabrani prometa, te obavijesti o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama za promet na javnim cestama, provodi društvo kapitala preko sredstava javnog informiranja.

Iste podatke obvezatno je dostaviti i Hrvatskom autoklubu (HAK) koji će putem informativnog centra u Zagrebu također izvršiti obavješćivanje javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, na sljedeće brojeve:

telefon 01/ 6611-283 ili 01/ 6611-284
telefax 01/ 4693-702 ili 01/6603-287

Da bi sistem prikupljanja podataka, a potom i obavješćivanje javnosti bio što efikasniji u mjestima pripravnosti organizira se dežurstvo tijekom od 0-24 sata, a informacije o stanju na prometnicama prikupljaju se tri puta dnevno (05,00 ; 13,00; 17,00 sati), a po potrebi i više puta dnevno, ako to vremenske prilike i stanje prometnica zahtijevaju.

Izvještaji se predaju putem telefona ili faksom dežurnom u mjestu pripravnosti, a sadrže iscrpan izvještaj o sposobnosti ceste za promet, stanju kolnika, radovima na kolniku i vremenskim prilikama.

Objedinjene izvještaje po mjestima pripravnosti dežurni upisuje u dnevnik zimske službe, a potom ih predaje Županijskoj upravi za ceste (tri puta dnevno 06,00; 14,00; 18,00 sati), a po potrebi i više puta, **osim kad je stanje redovno (nema aktivnosti) ne treba izvješćivati Županijsku upravu za ceste**, ovisno o značaju informacija obaviješćivaju se i ostali nadležni i organi organizacije (Policija, radio i dr.).

Po pozivu dežurni u mjestu pripravnosti određenog od strane ugovorenog izvođača radova redovnog održavanja pružit će informacije o stanju na cestama svim zainteresiranim osobama.

14. METEOROLOŠKI PODACI

Mjesta pripravnosti u pojedinim društvima kapitala povezana su telefonom sa Državnim hidrometeorološkim zavodom – Meteorološkim centrom, od kojeg dobiva podatke o izgledima vremena za 3-5 dana unaprijed (jednom tjedno), te dnevne prognoze vremena dva puta dnevno (07,30 i 13,30 sati).

Meteorološki izvještaji obuhvaćaju izglede vremena sa svim elementima (najviše i najniže temperature, mogućnost i intezitet padavina, mogućnost nastanka zapuha, snagu vjetra i mogućnost nastanka poledice).

Prognoze vremena upisuju se u dnevnik zimske službe i putem telefona ili faksa prosljeđuju se ostalim mjestima pripravnosti.

Pored ovog, ugovoreni izvođači radova redovnog održavanja primaju i dugoročne prognoze vremena, koje predviđaju maksimalne i minimalne temperature zraka u kojima su moguće padavine kao i vrstu padavina.

Ove prognoze pomažu da se unaprijed pripremi ljudstvo i tehnika za moguće intervencije na cestama.

15. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Procjena troškova zimske službe napravljena je na temelju dugogodišnjeg praćenja zimske službe, smjernica za izradu izvedbenog programa zimske službe i usuglašenosti Hrvatske uprave za ceste, Županijske uprave za ceste županije Sisačko-moslavačke i društava kapitala.

Potrebne količine soli kao i dopremu na mjesta pripravnosti osiguravaju izvođači radova.

Svi troškovi su predvidivi, a obračun rada zimske službe vršit će se na temelju stvarno obavljenih radova uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena.

PREDVIDIVI TROŠAK ZIMSKE SLUŽBE

od 15.11.2026. - 15.04. 2027. godine

9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	Jed. mjera	Količina	Jed. cjena	Vrijednost radova (€)
9.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				19.850,00
9.1.1.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe:** obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje prometnog znaka. **Obračun po komadu postavljenog i uklonjenog znaka sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	300,00	51,00	15.300,00
9.1.2.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe:** obuhvaća jednokratno postavljanje na postojeći stup i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje dopunske ploče. **Obračun po komadu postavljene i uklonjene ploče sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	100,00	25,50	2.550,00
9.1.3.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova:** obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje rubnih štapova. **Obračun po komadu postavljenog i uklonjenog rubnog štapa sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	200,00	10,00	2.000,00
9.2.	**Objedinjeni iznos za radove i usluge za koje nije moguće predvidjeti količinu**				240.000,00
9.2.1.	**Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu prema izvedbenom programu:** fiksna naknada za stalnu pripravnost vozila, strojeva i priključaka, uključujući i radnu snagu te troškove 24 satnog dežurstva prosječnog broja cestara u pripravnosti. **Stavka je fiksno određena i ne nudi se.**	dan			240.000,00
9.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				253.591,00
9.3.1.	**Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit):** obuhvaća zapunjavanje lokalnih oštećenja kolnika - udarnih jama odgovarajućim hladnim smjesama u zimskim uvjetima s uklanjanjem oštećenog asfaltnog materijala, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju i ručnu ugradnju smjese prosječne količine 0,15 t/m2. **Obračun po toni ugrađene hladne smjese.**	t	40,00	225,00	9.000,00
9.3.2.	**Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl.:** obuhvaća interventno posipanje manjih površina po potrebi. **Obračun po satu efektivnog rada.**	h	75,00	35,00	2.625,00
9.3.3.	**Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem. Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju županijskih i lokalnih cesta**	h	125,00	95,00	11.875,00
9.3.4.	**Kamion ili specijalno vozilo preko 3,5t na posipavanju s roto posipačem Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju županijskih i lokalnih cesta**	h	1.500,00	94,00	141.000,00
9.3.5.	**Sredstvo za utovar posipnog materijala. Obračun po satu efektivnog rada.**	h	150,00	46,44	6.966,00
9.3.6.	**Specijalno vozilo komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem). Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju županijskih i lokalnih cesta**	h	375,00	95,00	35.625,00
9.3.7.	**Traktor na čišćenju i posipavanju - komplet s priključcima (plugom i posipačem). Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju županijskih i lokalnih cesta**	h	150,00	65,00	9.750,00
9.3.8.	**Ostali specijalni strojevi (utovarivač, grejder i buldozer). Obračun po satu efektivnog rada.**	h	25,00	90,00	2.250,00
9.3.9.	**Radna snaga. Obračun po satu efektivnog rada.**	h	2.000,00	17,25	34.500,00
9.4.	**Posipala (materijali za spriječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)**				113.403,53
9.4.1.	Natrijev klorid za skladište	t	25,00	80,00	2.000,00
9.4.2.	Sol za posipavanje	t	1.000,00	80,00	80.000,00
9.4.3.	Kalcijev klorid	t	0,50	497,06	248,53
9.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m^3	1.550,00	20,10	31.155,00
				UKLUPNO:	**626.844,53**
				PDV:	**156.711,13**
				SVEUKUPNO:	**783.555,66**

PREDVIDIVI TROŠAK ZIMSKE SLUŽBE

od 15.11.2026. - 31.12. 2026. godine

9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	Jed. mjera	Količina	Jed. cjena	Vrijednost radova (€)
9.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				19.850,00
9.1.1.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe:** obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje prometnog znaka. **Obračun po komadu postavljenog i uklonjenog znaka sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	300,00	51,00	15.300,00
9.1.2.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe:** obuhvaća jednokratno postavljanje na postojeći stup i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje dopunske ploče. **Obračun po komadu postavljene i uklonjene ploče sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	100,00	25,50	2.550,00
9.1.3.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova:** obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje rubnih štapova. **Obračun po komadu postavljenog i uklonjenog rubnog štapa sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	200,00	10,00	2.000,00
9.2.	**Objedinjeni iznos za radove i usluge za koje nije moguće predvidjeti količinu**				0,00
9.2.1.	**Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu prema izvedbenom programu:** fiksna naknada za stalnu pripravnost vozila, strojeva i priključaka, uključujući i radnu snagu te troškove 24 satnog dežurstva prosječnog broja cestara u pripravnosti. **Stavka je fiksno određena i ne nudi se.**	dan			
9.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				76.077,30
9.3.1.	**Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama:** obuhvaća zapunjavanje lokalnih oštećenja kolnika - udarnih jama odgovarajućim hladnim smjesama u zimskim uvjetima s uklanjanjem oštećenog asfaltnog materijala, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju i ručnu ugradnju smjese prosječne količine 0,15 t/m2. **Obračun po toni ugrađene hladne smjese.**	t	12,00	225,00	2.700,00
9.3.2.	**Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl.:** obuhvaća interventno posipanje manjih površina po potrebi. **Obračun po satu efektivnog rada.**	h	22,50	35,00	787,50
9.3.3.	**Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem. Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju žup. i lokalnih cesta**	h	37,50	95,00	3.562,50
9.3.4.	**Snježna freza samohodna Obračun po satu efektivnog sata**	h	450,00	94,00	42.300,00
9.3.5.	**Sredstvo za utovar posipnog materijala. Obračun po satu efektivnog rada.**	h	45,00	46,44	2.089,80
9.3.6.	**Specijalno vozilo komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem). Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju žup. i lokalnih cesta**	h	112,50	95,00	10.687,50
9.3.7.	**Traktor na čišćenju i posipavanju - komplet s priključcima (plugom i posipačem). Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju žup. i lokalnih cesta**	h	45,00	65,00	2.925,00
9.3.8.	**Ostali specijalni strojevi (utovarivač, grejder i buldozer). Obračun po satu efektivnog rada.**	h	7,50	90,00	675,00
9.3.9.	**Radna snaga. Obračun po satu efektivnog rada.**	h	600,00	17,25	10.350,00
9.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)**				33.501,06
9.4.1.	Natrijev klorid za skladište	t	1,00	80,00	80,00
9.4.2.	Sol za posipavanje osiguravaju Hrvatske ceste - ne nudi se	t	300,00	80,00	24.000,00
9.4.3.	Kalcijev klorid	t	0,15	497,06	74,56
9.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m^3	465,00	20,10	9.346,50
				UKLUPNO:	**129.428,36**
				PDV:	**32.357,09**
				SVEUKUPNO:	**161.785,45**

PREDVIDIVI TROŠAK ZIMSKE SLUŽBE

od 01.01.2027. - 15.04. 2027. godine

		Jed. mjera	Količina	Jed. cjena	Vrijednost radova (€)
9.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**				
9.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				0,00
9.1.1.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe:** obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje prometnog znaka. **Obračun po komadu postavljenog i uklonjenog znaka sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	0,00	51,00	0,00
9.1.2.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe:** obuhvaća jednokratno postavljanje na postojeći stup i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje dopunske ploče. **Obračun po komadu postavljene i uklonjene ploče sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	0,00	25,50	0,00
9.1.3.	**Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova:** obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje rubnih štapova. **Obračun po komadu postavljenog i uklonjenog rubnog štapa sa obračunskom amortizacijom za period od dvije godine.**	kom	0,00	10,00	0,00
9.2.	**Objedinjeni iznos za radove i usluge za koje nije moguće predvidjeti količinu**				240.000,00
9.2.1.	**Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu prema izvedbenom programu:** fiksna naknada za stalnu pripravnost vozila, strojeva i priključaka, uključujući i radnu snagu te troškove 24 satnog dežurstva prosječnog broja cestara u pripravnosti. **Stavka je fiksno određena i ne nudi se.**	dan			240.000,00
9.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				177.513,70
9.3.1.	**Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama:** obuhvaća zapunjavanje lokalnih oštećenja kolnika - udarnih jama odgovarajućim hladnim smjesama u zimskim uvjetima s uklanjanjem oštećenog asfaltnog materijala, utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju i ručnu ugradnju smjese prosječne količine 0,15 t/m2. **Obračun po toni ugrađene hladne smjese.**	t	28,00	225,00	6.300,00
9.3.2.	**Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl.:** obuhvaća interventno posipanje manjih površina po potrebi. **Obračun po satu efektivnog rada.**	h	52,50	35,00	1.837,50
9.3.3.	**Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem. Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju žup. i lokalnih cesta**	h	87,50	95,00	8.312,50
9.3.4.	**Snježna freza samohodna Obračun po satu efektivnog sata**	h	1.050,00	94,00	98.700,00
9.3.5.	**Sredstvo za utovar posipnog materijala. Obračun po satu efektivnog rada.**	h	105,00	46,44	4.876,20
9.3.6.	**Specijalno vozilo komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem). Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju žup. i lokalnih cesta**	h	262,50	95,00	24.937,50
9.3.7.	**Traktor na čišćenju i posipavanju - komplet s priključcima (plugom i posipačem). Obračun po satu efektivnog rada provedenog na čišćenju žup. i lokalnih cesta**	h	105,00	65,00	6.825,00
9.3.8.	**Ostali specijalni strojevi (utovarivač, grejder i buldozer). Obračun po satu efektivnog rada.**	h	17,50	90,00	1.575,00
9.3.9.	**Radna snaga. Obračun po satu efektivnog rada.**	h	1.400,00	17,25	24.150,00
9.4.	**Posipala (materijali za spriječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)**				79.902,47
9.4.1.	Natrijev klorid za skladište	t	24,00	80,00	1.920,00
9.4.2.	Sol za posipavanje osiguravaju Hrvatske ceste - ne nudi se	t	700,00	80,00	56.000,00
9.4.3.	Kalcijev klorid	t	0,35	497,06	173,97
9.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m^3	1.085,00	20,10	21.808,50
				UKUPNO:	**497.416,17**
				PDV:	**124.354,04**
				SVEUKUPNO:	**621.770,21**

URBROJ: 4211-501-1137/1 /2018
Ivanja Reka, 17.09.2018. godine

Predmet: Izjava o usklađenosti izvedbenih programa zimske službe 2018/2019 godine

IZJAVLJUJEMO

Da nije došlo do promjena granica održavanja između naših dvaju pravnih subjekata koji izvode radove održavanja u zimskom periodu, kao ni promjene u načinu rada održavanja u zimskom periodu u odnosu na zimsko održavanje 2017/2018 godine te su Izvedbeni programi zimske službe između naših dvaju pravnih subjekata usklađeni.

ČVOR: „LEKENIK"

VODITELJ TJO SISAK

JURAJ JAGUNIĆ
Ime i prezime

Potpis

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Naziv pravnog subjekta

STIPO SARINA
Ime i prezime

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAK 2

Potpis

direktor Sektora za održavanje

Ivica Križanić, dipl.ing.stroj.

STIPO ŠAPINA

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 340-07/26-01/49
URBROJ: 2176-154-32-26-6
U Sisku, 26. listopada 2026.g.

HRVATSKE CESTE d.o.o.
Sektor za održavanje i promet
Poslovna jedinica Zagreb
Tehnička ispostava Sisak
Lađarska 28c
44000. Sisak

PREDMET: Izjava o usuglašenosti Izvedbenog programa održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine

Izjavljujemo da su Izvedbeni programi održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i Hrvatskih cesta d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Sisak, međusobno usklađeni i usuglašeni u smislu članka 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14; 03/21)

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

HRVATSKE CESTE D.O.O.
SEKTOR ZA ODRŽAVANJE I PROMET
POSLOVNA JEDINICA ZAGREB
TEHNIČKA ISPOSTAVA SISAK

KREŠIMIR PERIĆ

STIPO ŠAPINA
HR-70285854217

Elektronički potpisano: 27.10.2026T08:45:34 (UTC:2026-10-27T07:45:34Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: d7a4d24f-07f1-4ca3-9a8d-26eeea76daba

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 340-07/26-01/49
URBROJ: 2176-154-32-26-4
U Sisku, 26. listopada 2026.g.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Josipa Jelačića 2
43000. Bielovar

PREDMET: Izjava o usuglašenosti Izvedbenog programa održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine

Izjavljujemo da su Izvedbeni programi održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, međusobno usklađeni i usuglašeni u smislu članka 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14; 03/21)

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

30.10.2026
340-09-26-08/640 03-1
345-0501-03-126/1275-2

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

REPUBLIKA HRVATSKA - BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE - ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE - BJELOVAR

STIPO ŠAPINA
HR-70285854217

Elektronički potpisano: 27.10.2026T08:44:49 (UTC:2026-10-27T07:44:49Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: 2c3046a8-087a-4d98-bef8-16482957072f

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 340-07/26-01/49
URBROJ: 2176-154-32-26-7
U Sisku, 26. listopada 2026.g.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1a,
47250. Duga Resa

PREDMET: Izjava o usuglašenosti Izvedbenog programa održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine

Izjavljujemo da su Izvedbeni programi održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i Županijska uprava za ceste Karlovačke županije, međusobno usklađeni i usuglašeni u smislu članka 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14; 03/21)

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KARLOVAČKE ŽUPANIJE
Belajske Poljice
Poslovni park Karlovac 1/A
Barilovic
47250 DUGA RESA

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
POŽEGA, REPUBLIKE HRVATSKE
1B

Požega, 21.10.2026.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ANTUNA CUVAJA 16
44 000 SISAK

Predmet: Izjava o usuglašenosti Izvedbenog programa održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026./2027. godine

Izjavljujemo da su Izvedbeni programi održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026./2027. godine Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije i Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, međusobno usklađeni i usuglašeni u smislu članka 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/2014 i 3/21).

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

STIPO ŠAPINA

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 340-07/26-01/49
URBROJ: 2176-154-32-26-8
U Sisku, 26. listopada 2026.g.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Remetinačka cesta 3
10020. Zagreb

PREDMET: Izjava o usuglašenosti Izvedbenog programa održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine

Izjavljujemo da su Izvedbeni programi održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, međusobno usklađeni i usuglašeni u smislu članka 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14; 03/21)

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

STIPO ŠAPINA

Elektronički potpisano: 27.10.2026T08:45:18 (UTC:2026-10-27T07:45:18Z)
Provjera: https://epotpis.rdd.hr/provjera
Broj zapisa: b868d65e-e4ad-45ba-b83b-a09c357ce732

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 340-07/26-01/49
URBROJ: 2176-154-32-26-5
U Sisku, 26. listopada 2026.g.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
I.G. Kovačića 58
35000. Slavonski Brod

PREDMET: Izjava o usuglašenosti Izvedbenog programa održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine

Izjavljujemo da su Izvedbeni programi održavanja cesta u zimskom razdoblju 2026/2027. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, međusobno usklađeni i usuglašeni u smislu članka 37. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14; 03/21)

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

OLIVERA MAGLIĆ

Digitalno potpisao:
OLIVERA MAGLIĆ
Datum: 2026.10.27
12:41:56 +01'00'

16. ZAVRŠNE NAPOMENE

Odgovorna osoba ispred "ŽUC-a SMŽ" je **Stipo Šapina.**
telefon u uredu: 044/522-885
fax: 044/526-611

Nadzorni inženjer ispred "ŽUC-a SMŽ" je **Marijo Pušić, mag.ing.aedif.,**
telefon u uredu: 044/526-619
fax: 044/526-611

Odgovorna osoba za kontrolu i nadzor rada zimske službe je **Ratko Vujić, ing. prom.**
telefon u uredu: 044/526-618
fax: 044/526-611
mobilni: 098/980-6780

Izvedbeni programi zimske službe međusobno su usklađeni sa svim Upravama koje djeluju ili graniče s područjem nadležnosti naše Uprave. Dokaz o istom su izjave obostrano potpisane koje su sastavni dio ovog programa.

Pravilnik o održavanju cesta obvezuje na niz pripremnih radnji, kojim se mora osigurati ne samo mogućnost organizacije i kapaciteta po ovom programu već i priprema cesta, kao što su osiguranje odvodnje, ispravnost kolnika i eventualne obilježavanje rubova kolnika za slučajeve zapuha.

U pripremnom periodu potrebno je na veće uspone na cestama dovesti posipalo koje će koristiti sami vozači i njihovi pomoćnici u slučaju iznenadne poledice. To posipalo treba označiti kolcima, kojima je vrh obojen crvenom bojom.

U zimskoj službi ne čiste se nogostupi, ali se obvezno čiste pješačke staze na mostovima. Isto tako obveza je uklanjanje snijega sa kolnika mostova i čišćenje uređaja za odvodnju.

Obvezuju se odgovorne osobe po mjestima pripravnosti na ekonomično trošenje soli i kamenog agregata.

Ravnatelj:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE SISAK 2

Stipo Šapina
