Hrvatske ceste d.o.o.
Poslovna jedinica: Zagreb
Tehnička ispostava: Zagreb

Izvedbeni program zimske službe na državnim cestama na području Tehničke ispostave Zagreb (županija Zagrebačka, Krapinsko-zagorska i Grad Zagreb) u zimskom razdoblju 2026./2027.

Zagreb, 12.10.2026.

Hrvatske ceste d.o.o.

Poslovna jedinica: Zagreb

Tehnička ispostava: Zagreb

Izvedbeni program zimske službe na državnim cestama na području Tehničke ispostave Zagreb (županija Zagrebačka, Krapinsko-zagorska i Grad Zagreb) u zimskom razdoblju 2026./2027.

Voditelj Tehničke ispostave
Božidar
Šnajder,mag.ing.aedif.
mag.ing.traff.

Zagreb, 12.10.2026.

SADRŽAJ

1. UVOD 1
2. PRIPREMNI RADOVI 2
2.1. Dopunska prometna signalizacija 2
2.2. Sol za ceste 4
2.3. Poledica i posipanje kolnika 4
2.4. Održavanje prohodnosti cesta 5
3. IZVODITELJ RADOVA 7
3.1. Organizacijska shema ustroja izvoditelja radova u zimskoj službi 7
3.2. Područje u nadležnosti izvoditelja 11
3.3. Ovlasti i odgovornosti izvoditelja radova 13
3.4. Članovi zajednice gospodarskih subjekata 14
4. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA IZVEDBENOG PROGRAMA 15
4.1. Centar zimske službe 15
5. RASPORED MJESTA PRIPRAVNOSTI 16
6. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA S OBZIROM NA UTVRĐENE RAZINE PREDNOSTI 19
6.1. Opis razina prednosti 19
6.2. Cestovni pravci prve razine prednosti 20
6.3. Cestovni pravci druge razine prednosti 20
6.4. Cestovni pravci treće razine prednosti 21
6.5. Cestovni pravci pete razine prednosti 21
6.6. Popis državnih cesta na području Tehničke ispostave Zagreb 23
7. RADNI ITINERARI VOZILA U ZIMSKOJ SLUŽBI 41
7.1. I razina prednosti 42
7.2. II razina prednosti 48
8. RASPORED POTREBNE MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE TE RADNE SNAGE 73
8.1. Raspored potrebne mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage po mjestima pripravnosti 73
8.2. Planirane količine posipala 79
8.3. Planirane količine ostalog materijala 79
8.4. Popis vozila i strojeva koje će izvoditelj koristiti u obavljanju zimske službe 80
9. RASPORED DEŽURSTAVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI TE RASPORED RADNIH SKUPINA 87
10. KRITIČNE DIONICE I MJERE OGRANIČENJA PROMETA 89
10.1. Kritične dionice 89
10.2. Rampe i prometni znakovi u privremenom svojstvu i snjegobrani 89
10.3. Popis opasnih mjesta na kojima se vrše obvezni preventivni radovi za sprječavanje nastanka poledice u II stupnju pripravnosti 102
11. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIH VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA 108
11.1. Uvjeti kad se zbog sigurnosti prometa on ograničava ili zabranjuje za sva ili za pojedine vrste vozila 108
11.2. Mjesta za isključivanje vozila 109
12. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I OBAVJEŠĆIVANJA O STANJU I PROHODNOSTI DRŽAVNIH CESTA 114
12.1. Obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta 116
12.2. Kontakt podaci u mjestima stalnog dežurstva 121
12.3. Meteorološko - informacijski sustav 121
12.4. Sustav veza 122
12.5. Prognoze vremena 123
13. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE 124
14. USKLAĐENJE IZVEDBENIH PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE 130

1. UVOD

Zimsko razdoblje, sukladno članku 34. Pravilnika o održavanju cesta („Narodne novine“ broj: 90/2014 i 3/2021), traje, u pravilu, od 15. studenoga tekuće do 15. travnja sljedeće godine.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24), zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjen je promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Iznimno, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li ili ne zimski uvjeti.

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa.

Zimska služba je pojam i uobičajeni izraz za cijeli niz radnji, mjera, postupaka i aktivnosti u zimskom razdoblju, koje imaju zadaću osigurati mogućnost odvijanja prometa na cestama uz najveću moguću sigurnost sudionika u prometu i prihvatljive troškove.

U zimskom razdoblju ceste se održavaju u skladu s izvedbenim programom zimske službe, kojeg donosi upravitelj ceste, a za državne ceste to je društvo Hrvatske ceste d.o.o.

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito:

- organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
- raspored mjesta stalne pripravnosti,
- karta cestovne mreže s označenim razinama prednosti i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,
- raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
- raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
- nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
- mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
- način prikupljanja podataka i shema obavještavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

2. PRIPREMNI RADOVI

Člankom 35. Pravilnika o održavanju cesta utvrđeni su pripremni radovi zimske službe, koji se izvode prije početka zimskoga razdoblja, u cilju omogućavanja njezinog učinkovitog djelovanja.
Pripremni radovi obuhvaćaju prvenstveno radove i aktivnosti na:

- pripremi mehanizacije, prometne signalizacije i opreme, posipnog materijala,
- pripremi javnih cesta i neposrednog okoliša (postavljanje dopunske prometne signalizacije na opasnim mjestima, postavljanje snježnih kolaca, postavljanje naprava i provođenje mjera za zaštitu od snježnih zapuha i sl.),
- osposobljavanju i stručnom usavršavanju svih radnika koji sudjeluju u obavljanju zimske službe.

Izvoditelj radova redovitog održavanja i zaštite državnih cesta (u daljnjem tekstu: **izvoditelj**) je, u suradnji s predstavnicima Tehničke ispostave Zagreb prije početka zimskog razdoblja obvezan:

- kontrolirati pripremu mehanizacije i opreme koja se koristi u zimskoj službi,
- kontrolirati deponiranje posipala po mjestima stalne pripravnosti,
- kontrolirati uređenje objekata i potrebne infrastrukture u svim mjestima stalne pripravnosti,
- nadzirati postavljanje posebne prometne signalizacije,
- kontrolirati osiguranje eventualnih nedostajućih kapaciteta mehanizacije,
- obaviti dogovore (koordinacije) s predstavnicima upravitelja drugih cesta,
- obaviti dogovore s policijskim upravama i policijskim postajama na području Poslovne jedinice Zagreb o suradnji tijekom trajanja zimske službe,
- obaviti dogovore s ostalim uključenim subjektima (služba 112, vatrogasna službe, jedinice lokalne samouprave i dr.).

2.1. Dopunska prometna signalizacija

Na dijelu ceste gdje se poledica učestalo pojavljuje postavlja se dopunska prometna signalizacija koja upozorava na moguću opasnost (prije svega na autocestama i glavnim cestovnim pravcima) te se stalno poduzimaju mjere i radnje u cilju sprječavanja nastajanja poledice na kolniku.

Dopunska prometna signalizacija postavlja se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i drugim važećim propisima, na svim državnim cestama ili pojedinim dionicama prema višegodišnjem iskustvu, u cilju što boljeg označavanja pojedinih dionica i upozorenja koja su od značaja za sudionike u prometu.

Izvoditelj postavlja dopunsku prometnu signalizaciju na državnim cestama prije početka zimskog razdoblja, najkasnije do 15.11.2026., a uklanjanje takve dopunske signalizacije obavit će se najkasnije do 30.04.2027.
Pregled osnovnih prometnih znakova u svojstvu privremene prometne signalizacije dan je na sljedećoj slici.

Slika	Oznaka	Opis
	A01	"Opasnost na cesti" označava blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnosti«.
	A10	"Skliz̆ak kolnik" označava blizinu dijela ceste na kojem kolnik u određenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu.
	A11	"Poledica" označava blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane pojave poledice.
	B03	"Zabrana prometa u oba smjera" označava cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera.
	B08	"Zabrana prometa za teretne motorna vozila" označava cestu, odnosno dio ceste na kojem, je zabranjen promet teretnim motornim vozilima.
	B12	"Zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo" označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo.
	B13	"Zabrana prometa za teretna motorna vozila koja vuku priključno vozilo" označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet za teretna motorna vozila koja vuku priključno vozilo.
	B30	"Ograničenje brzine" označava cestu ili dio ceste kojim se vozila u idealnim uvjetima ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku.
	B39	"zimska oprema" naznačuje dio ceste na kojem motorna vozila osim motocikla moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima.
	E02	"Dopunska ploča" , označava duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena prometnim znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča.
	E03	"Dopunska ploča", označava udaljenost i smjer od prometnog znaka do objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi.
	E13	"Dopunska ploča" označava početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivanih meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa kiše, postavlja se uz prometni znak »Opasnost na cesti« (A01)
	E13-1 E13-2 E13-3	"Dopunske ploče" označavaju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivanih meteoroloških uvjeta značajnih za sigurno odvijanje prometa snijeg i dr., postavljaju se uz prometni znak »Opasnost na cesti« (A01)
	E16	"Dopunska ploča" označava početak dijela ceste na kojem se obavlja čišćenje snijega.
	K04	"Štapovi za snijeg" u zimskom razdoblju označavaju rub kolnika i naznačuju pružanje ceste ili cestovne građevine.
	K04-1 K04-2 K04-3	"Štapovi za snijeg s graničnikom" - štap s graničnikom okrenutim prema dolje (K04-1) po potrebi postavlja se na početku cestovne građevine, a na kraju cestovne građevine štap s graničnikom okrenutim prema gore (K04-2). Štap za snijeg sa prekriženim graničnicima crvene boje (K04-3) po potrebi postavlja se na cestovnim građevinama ispod kojih prolazi druga prometnica gdje je zabranjeno odbacivanje snijega s cestovne građevine na prometnicu koja
	K09 K09-1	"Ploče za označavanje zapreka na cesti" označavaju zapreke na cesti na lijevoj strani (K09) i na desnoj strani (K09-1), a u smjeru vožnje označavaju radove ili zapreke na cestama, objektima i ostalim prometnim površinama.
	K14 K14-1	"Branici za označivanje zapreka" služe za označavanje zapreka na prometnoj površini.
	K15 K15-1	"Ploče za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti ili oštećenja kolnika s treptačem" služe za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti ili oštećenja kolnika.

2.2. Sol za ceste

Proces nabave i isporuke soli za ceste podrazumijeva ugovaranje, koordinaciju te praćenje nabave i utroška soli za ceste. Praćenje nabave i utroška soli za ceste obavlja se kroz SAP sustav Hrvatskih cesta.

U cilju očuvanja kvalitete soli za posipanje cesta, sol se skladišti u drvene silose i nadstrešnice za sol. Time se podiže razina kvalitete skladištenja i čuvanja ali i racionalizacija potrošnje soli za posipanje cesta, što u konačnici rezultira boljom učinkovitošću i smanjenjem troškova zimske službe.
Na području Tehničke ispostave Zagreb izgrađeno je 11 nadstrešnica za sol različitog kapaciteta i 6 drvenih silosa za sol u vlasništvu Hrvatskih cesta d.o.o.

Od ukupnog broja silosa za sol na području ove Tehničke ispostave Zagreb, 0 silosa opremljeno je radarskim mjeračima popunjenosti, koji, kroz posebno izrađenu web aplikaciju, omogućuju uvid u stanje njihove popunjenosti, kao i upozorenja prilikom njihove eventualne neispravnosti, što omogućuje promptnu reakciju u smislu njihovog održavanja.

2.3. Poledica i posipanje kolnika

U zimskom razdoblju i u slučajevima kad postoji opasnost od nastanka poledice na cesti, izvoditelj je dužan pojedine opasne dijelove ceste posipati sredstvima koja sprječavaju nastajanje poledice. Mjesta i način posipanja tih sredstava određuje se u odnosu na zemljišno - klimatske uvjete, položaj, nagib i značaj ceste te druge lokalne uvjete.

U odnosu na vrstu i nastanak oborina, provodi se preventivno i kurativno posipavanje cesta.
Preventivno posipavanje izvodi se:
- pri vlažnom kolniku kad temperatura naglo pada prema 0°C,
- neposredno prije početka padanja snijega,
- kod suhog ili vlažnog kolnika kad se očekuje ili je prognozirana pojava „ledene kiše“.

Kurativno posipavanje izvodi se kad je na kolniku smanjena hvatljivost, a može se koristiti suha i ovlažena sol što ovisi o stanju na kolniku. Količina posipala ovisi o klimatskoj zoni održavanja cesta te o temperaturi i stanju kolnika.

Poledica na kolniku je vremenska pojava koja uvelike ugrožava sigurno odvijanje prometa. Meteorološki pokazatelji koji upućuju na mogućnost njezinog naglog nastanka su temperatura tla (pothlađenost kolnika) i zraka iznad kolnika, vlažnost zraka, mogućnost pojave oborina i dr. U tom smislu razlikuje se poledica nastala uslijed:
- pothlađenosti kolnika kao posljedica duže izloženosti kolnika niskim temperaturama i
- niskih temperatura zraka iznad kolnika.

Prema specifičnim stanjima na kolniku (klizavost), u smislu posipavanja cesta protiv poledice, primjenjuju se:
- abrazivna sredstva,
- sredstva za otapanje leda, odnosno sprječavanje njegovog nastajanja.

Od abrazivnih sredstava koriste se čisti kameni materijali (sipina i/ili pijesak), koji ne sadržavaju štetne sastojke (glinu i sl.). Abrazivna sredstva prvenstveno se primjenjuju na cestama kod zaleđenog kolnika, odnosno za ceste II. razne prednosti nakon uklanjanja snijega do “bijelog”, kad na kolniku ostaje snježni pokrivač. Abrazivna sredstva koriste se i kao preventivno sredstvo na cestama na visini preko 400 m/nm i za vrijeme padanja ledene kiše. Ne primjenjuju se u gradovima.

Sredstva za otapanje leda otapaju ledenu površinu kemijsko-termičkim postupkom. Danas su najčešće u primjeni kloridi odnosno soli i to:
- natrijev klorid (NaCl),
- kalcijev klorid (CaCl2).

Obje vrste soli mogu se koristiti u suhom stanju ili kao otopina.

Pojedine državne i županijske ceste te ceste prve razine prednosti tretiraju se mješavinom suhog natrijevog klorida i otopine kalcijevog klorida (takozvano vlažno posipavanje). Ovoj tehnologiji, koja je već dugi niz godina prisutna u održavanju cesta većine europskih zemalja, pristupa se zbog njezine efikasnosti i racionalnosti. Njome se postižu veći efekti kod posipavanja, znatnije uštede materijala i troška mehanizacije. Isti materijali su razgradivi te ne djeluju abrazivno, tako da čuvaju postojeću horizontalnu signalizaciju te odvodne sustave.

Vlažno posipanje je postupak kojim se sol prilikom razastiranja vlaži otopinom natrijevog ili kalcijevog klorida.
Vlažno posipanje koristi se kod:
- zaleđenog kolnika,
- povišene vlage u zraku i niskih temperatura,
- golomrazice – slane,
- niske magle i kiše koja sipi na pothlađeni kolnik,
- smrznutog zaglađenog snijega na kolniku,
- vlažnog kolnika s potencijalnim zaleđivanjem,
- u kombinaciji navedenog s bočnim vjetrom.

U takvim slučajevima vlažno posipanje ima najveći učinak, jer se primjenom ove tehnologije smanjuje gubitak soli u odnosu na posipanje suhom solju. Djelovanje ovog slanog filma traje i po nekoliko dana ukoliko nema većih oborina.

Ostale ceste manjeg značaja i razina prednosti tretiraju se klasičnim posipalima (sol i kamena sitnež).
Sredstva za otapanje leda primjenjuju se obavezno na cestama sa zatvorenim sustavima odvodnje. S obzirom na to da kalcijev klorid ima daleko agresivnije djelovanje i otapa ledene površine na temperaturama od -7°C do -21°C, dopušteno ga je koristiti primjenjujući norme zemalja Europske unije.

Količine posipala ovise o:
- nivou služnosti,
- klimatskim zonama održavanja cesta,
- temperaturama kolnika,
- vremenu posipavanja u odnosu na oborine (preventivno ili kurativno),
- načinu korištenja (suha ili ovlažena sol).

Otapajuća sredstva za snijeg i led koja su štetna za okoliš izvoditelj može upotrebljavati samo u minimalnim količinama. Za posipanje navedenih otapajućih sredstava dozvoljeno je upotrebljavati samo takve uređaje koji omogućavaju precizno doziranje količine posipa. Kod određivanja količine posipa potrebno je uzimati u obzir količinu otapajućeg sredstva koji se već nalazi na kolniku.

2.4. Održavanje prohodnosti cesta

Održavanje prohodnosti pojedinih cesta u zimskom razdoblju određeno je prema razini prednosti koja je utvrđena godišnjim planom, a ovisno o vrsti ceste, gustoći i strukturi prometa, zemljišno - klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama.

Razvrstavanje cesta po razini prednosti određuje upravitelj ceste na način da osigura i uskladi prohodnost cjelokupne cestovne mreže.

Pod osiguranjem prohodnosti ceste podrazumijeva se da je cesta iz I. i II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć vozilima koja imaju zimsku opremu.

Iznimno, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost na cesti u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem

području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Uklanjanje snijega i leda mehanizacijom treba izvoditi tako da se ne ošteti cesta, a ako to nije moguće, onda se ti radovi trebaju obaviti ručno. U naseljenim mjestima uklanjanje snijega s kolnika javne ceste treba se izvoditi tako da je osiguran pristup pješačkim prijelazima. Kod topljenja snijega i leda treba osigurati otjecanje vode s kolnika.

Po završetku zimskog razdoblja s ceste je potrebno ukloniti ostatke posipnog materijala (sipine), privremenu dopunsku prometnu signalizaciju i opremu, cestovne naprave i uređaje za osiguranje ceste i prometa.

Radi provedbe zimske službe 2026./2027. na državnim cestama kojima, temeljem Zakona o cestama, upravljaju, grade i održavaju Hrvatske ceste d.o.o., a na temelju Pravilnika o održavanju cesta, donosi se ovaj Izvedbeni program zimske službe na državnim cestama na području Tehničke ispostave Zagreb (u daljnjem tekstu: Izvedbeni program).

Tehnička ispostava Zagreb, kao ustrojbena jedinica Poslovne jedinice Zagreb, ima u nadležnosti održavanja državne ceste na području sljedećih županija:

1. Zagrebačka, u duljini 446,11 km
2. Krapinsko-zagorska, u duljini 319,52 km
3. Grad Zagreb, u duljini 24,74 km

3. IZVODITELJ RADOVA

Na temelju Okvirnog sporazuma, sklopljenog 03.04.2024 godine sa Zajednicom gospodarskih subjekata CESTE KARLOVAC D.D., CESTE SISAK D.O.O., PZC VARAŽDIN D.D., ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O., sklopljen je pojedinačni Ugovor o izvođenju radova za razdoblje od 01.01.2026 do 31.12.2026. Sljedeći ugovor planira se, na temelju Okvirnog sporazuma, sklopiti za razdoblje od 01.01.2027 do 31.12.2027.

Na temelju Ugovora, Ugovaratelj je preuzeo obvezu izvođenja radova redovitog održavanja i zaštite državnih cesta, koji uključuju i sve aktivnosti u zimskoj službi na području zagrebačke, krapinsko-zagorske, sisačko-moslavačke, karlovačke i Grada Zagreba županije, koji su između gospodarskih subjekata teritorijalno podijeljeni prema troškovniku radova, opisu i popisu radova te popisu državnih cesta koji čine sastavni dio Ugovora.
Sukladno tome, izvođenje radova redovitog održavanja i zaštite državnih cesta, a time i radova i aktivnosti zimske službe, na području:

- zagrebačke, krapinsko-zagorske i Grada Zagreba županije povjereno je društvu ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.

3.1. Organizacijska shema ustroja izvoditelja radova u zimskoj službi

Početkom rada zimske službe, odnosno uvođenjem prvog stupnja pripravnosti, izvoditelj radova osniva svoj operativni stožer za mrežu državnih cesta koju je preuzeo na održavanje.
Na čelo operativnog stožera imenovan je šef stožera, koji je odgovoran za pravovremeno i djelotvorno provođenje svih potrebnih aktivnosti na mreži državnih cesta koje pokriva operativni stožer.
Operativni stožer podrazumijeva više mjesta stalne pripravnosti u kojima je smješten potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za provođenje svih aktivnosti zimske službe.

U nastavku se daje grafički prikaz ustroja Operativnog stožera zimske službe izvoditelja ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O. za područje u nadležnosti:

OPERATIVNI STOŽER ZIMSKE SLUŽBE IZVOĐAČA RADOVA: ŽC Zagrebačke županije - stožer zimske službe

Zagrebačka cesta 42, 10380, Goričica, Sveti Ivan Zelina, Hrvatska

tel: 01 2317517, fax: 01 2360507, email: dezurna-sluzba@zczz.hr

Mjesto stalnog dežurstva

Zagrebačka cesta 46, 10382, Goričica, Hrvatska

tel: 01 2317517, fax: 01 2360507, email: dezurna-sluzba@zczz.hr

Šef stožera Josip Kralj tel: +3851 655 7944 fax: +3851 231 5576 mob: +38591 350 5703 email: josip.kralj@zczz.hr Član stožera Silvio Čehulić tel: fax: mob: 0913505123 email: silvio.cehulic@zczz.hr	Zamjenik šefa stožera Danijel Pavić tel: +3851 563 4761 fax: mob: +38591 350 7847 email: danijel.pavic@zczz.hr Član stožera Mato Bilobrk tel: +38501 331 0828 fax: +38501 331 0828 mob: +38591 350 5738 email: mato.bilobrk@zczz.hr

Centralno mjesto pripravnosti: Zagreb			
Selci 93, 10410, Okuje, Velika Gorica, Hrvatska	tel: 01 6219067	fax: 01 6219067	e-mail: drazen.roginek@zczz.hr
Dražen Roginek (Voditelj nadcestarije)	tel:	fax:	mob: +385913505737

Stalno mjesto pripravnosti: Goričica			
Zagrebačka cesta 35, 10382, Goričica, Hrvatska	tel: 01 2065103	fax: 01 2065103	e-mail: cestarija.goricica@zczz.hr
Josip Fila (Voditelj cestarije)	tel:	fax:	mob: +385916203737

Stalno mjesto pripravnosti: Velika Gorica			
Selci 93, 10410, Okuje	tel: 01 6219067	fax: 01 6219067	e-mail: nczagreb@zczz.hr
Dario Cizerlin (Voditelj cestarije)	tel: +38516219063	fax:	mob: +385913415542

Stalno mjesto pripravnosti: Zaprešić			
Veliki Vrh 1, Zaprešić	tel: 01 3310828	fax: 01 3310828	e-mail: nadcestar_zapresic@zczz.hr
Zoran Nikolić (Voditelj nadcestarije)	tel: +3851 331 0828	fax: +3851 331 0828	mob: +38591 347 8412
Ivan Kuternik (Voditelj cestarije)	tel:	fax:	mob: +385913415519

Stalno mjesto pripravnosti: Samobor			
Čudomerščak ul. 1, 10430, Samobor, Hrvatska	tel: 01 3360760	fax: 01 3360160	e-mail: ncsamobor@zczz.hr
Zoran Nikolić (Voditelj nadcestarije)	tel: +3851 331 0828	fax: +3851 331 0828	mob: +38591 347 8412
Zoran Gotal (Voditelj cestarije)	tel: +3851 336 0760	fax: +3851 336 0760	mob: +38591 350 5751

Stalno mjesto pripravnosti: Vrbovec			
Zagrebačka ulica 130 A, Vrbovec	tel: 012791213	fax: 012795220	e-mail: ncvrbovec@zczz.hr
Damir Jakopec (Voditelj nadcestarije)	tel:	fax:	mob:
Josip Zdorc (Voditelj cestarije)	tel: +3851 279 5220	fax: +3851 279 0682	mob: +38591 341 5523
Tomislav Vacenovski (Voditelj cestarije)	tel: +3851 279 1213	fax:	mob: +38591 350 5702

Stalno mjesto pripravnosti: NC Ivanić Grad			
Zajčićeva ul. 54, 10310, Jalševec Breški, Hrvatska	tel: 01 2888177	fax: 01 2888177	e-mail: cestarija.ivanicgrad@zczz.hr
Bonislav Margić (Voditelj nadcestarije)	tel: +38501 288 8177	fax: +3851 288 8177	mob: +38591 350 5733

Stalno mjesto pripravnosti: Jastrebarsko			
Murat Brijeg bb Jastrebarsko, 10450, Hrvatska	tel: +385 1 628 1219	fax: +385 1 628 1219	e-mail: nc.jastrebarsko@cest e-karlovac.hr
Ivan Malkoč (Voditelj nadcestarije)	tel: 0993968509	fax:	mob: 0992714303
Mateo Šetinc (Voditelj cestarije)	tel: +385992940586	fax:	mob: + 385997077957
Dario Delač (Voditelj cestarije)	tel:	fax:	mob: +38598408675
Danijel Prokopović (Voditelj cestarije)	tel: +385 99 396 8514	fax: +385 47 645 088	mob: +385 99 275 1668

Centralno mjesto pripravnosti: Krapina			
Podgora Krapinska 117a, Krapina	tel: 049 370845	fax: 049 370845	e-mail: nckrapina@zczz.hr
Vjekoslav Vrhovec (Voditelj nadcestarije)	tel: +38549 221 370	fax: +38549 503 506	mob: +38591 350 5015

Stalno mjesto pripravnosti: Podgora Krapinska (Krapina)			
Podgora Krapinska 117B, 49000, Podgora Krapinska, Krapina, Hrvatska	tel: 049 346141	fax: 049 346141	e-mail: nckrapina@zczz.hr
Nikica Krasnik (Voditelj cestarije)	tel:	fax:	mob: + 385912553392

Stalno mjesto pripravnosti: Pregrada			
Janka Leskovara bb, Pregrada	tel: 049 376408	fax: 049 376408	e-mail: cestarija.pregrada@zczz.hr
Nikica Krasnik (Voditelj cestarije)	tel:	fax:	mob: + 385912553392

Stalno mjesto pripravnosti: Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)			
Kolodvorska ul. 5, 49247, Zlatar Bistrica, Hrvatska	tel: 049/461706	fax:	e-mail: alen.bajzek@zczz.hr
Vjekoslav Vrhovec (Voditelj nadcestarije)	tel: +38549 221 370	fax: +38549 503 506	mob: +38591 350 5015
Alen Bajzek (Voditelj cestarije)	tel: 042611162	fax: 042611219	mob: + 385916093516

Centralno mjesto pripravnosti: Zabok			
Ulica 103. brigade 1, Zabok	tel: 049 221370	fax: 049 503506	e-mail: dario.vrancic@zczz.hr
Dario Vrančić (Voditelj nadcestarije)	tel: +38549 221370	fax: +38549 503506	mob: +38591 3505706

Stalno mjesto pripravnosti: Zabok			
Ulica 103. brigade 1, Zabok	tel: 049 221370	fax: 049 503506	e-mail: nczabok@zczz.hr
Lovro Mikulec (Voditelj cestarije)	tel:	fax:	mob: + 385916195700

Stalno mjesto pripravnosti: Donja Stubica			
Ul. Župana Vratislava 6, 49240, Donja Stubica, Hrvatska	tel: 049 286871	fax: 049 286871	e-mail: cestarija.dstubica@zczz.hr
Danijel Čupar (Voditelj cestarije)	tel: 049286871	fax: 049286871	mob: + 385913415550

3.2. Područje u nadležnosti izvoditelja

Izvoditelj radova redovitog održavanja na području Tehničke ispostave Zagreb, društvo ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O., preuzeo je održavanje državnih cesta na području sljedećih županija:


1. Zagrebačka, u duljini 446,11 km
2. Krapinsko-zagorska, u duljini 319,52 km
3. Grad Zagreb, u duljini 24,74 km

Karta organizacijske strukture zimske službe na području Tehničke ispostave Zagreb

U nastavku se daje pregledna karta državnih cesta u nadležnosti Tehničke ispostave Zagreb, na kojima aktivnosti u zimskoj službi obavlja društvo ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O., s prikazom lokacija:

- Centra zimske službe Zagreb u sjedištu Tehničke ispostave Zagreb,
- Operativnog stožera Zagreb i

svih mjesta stalne pripravnosti na području Tehničke ispostave Zagreb.

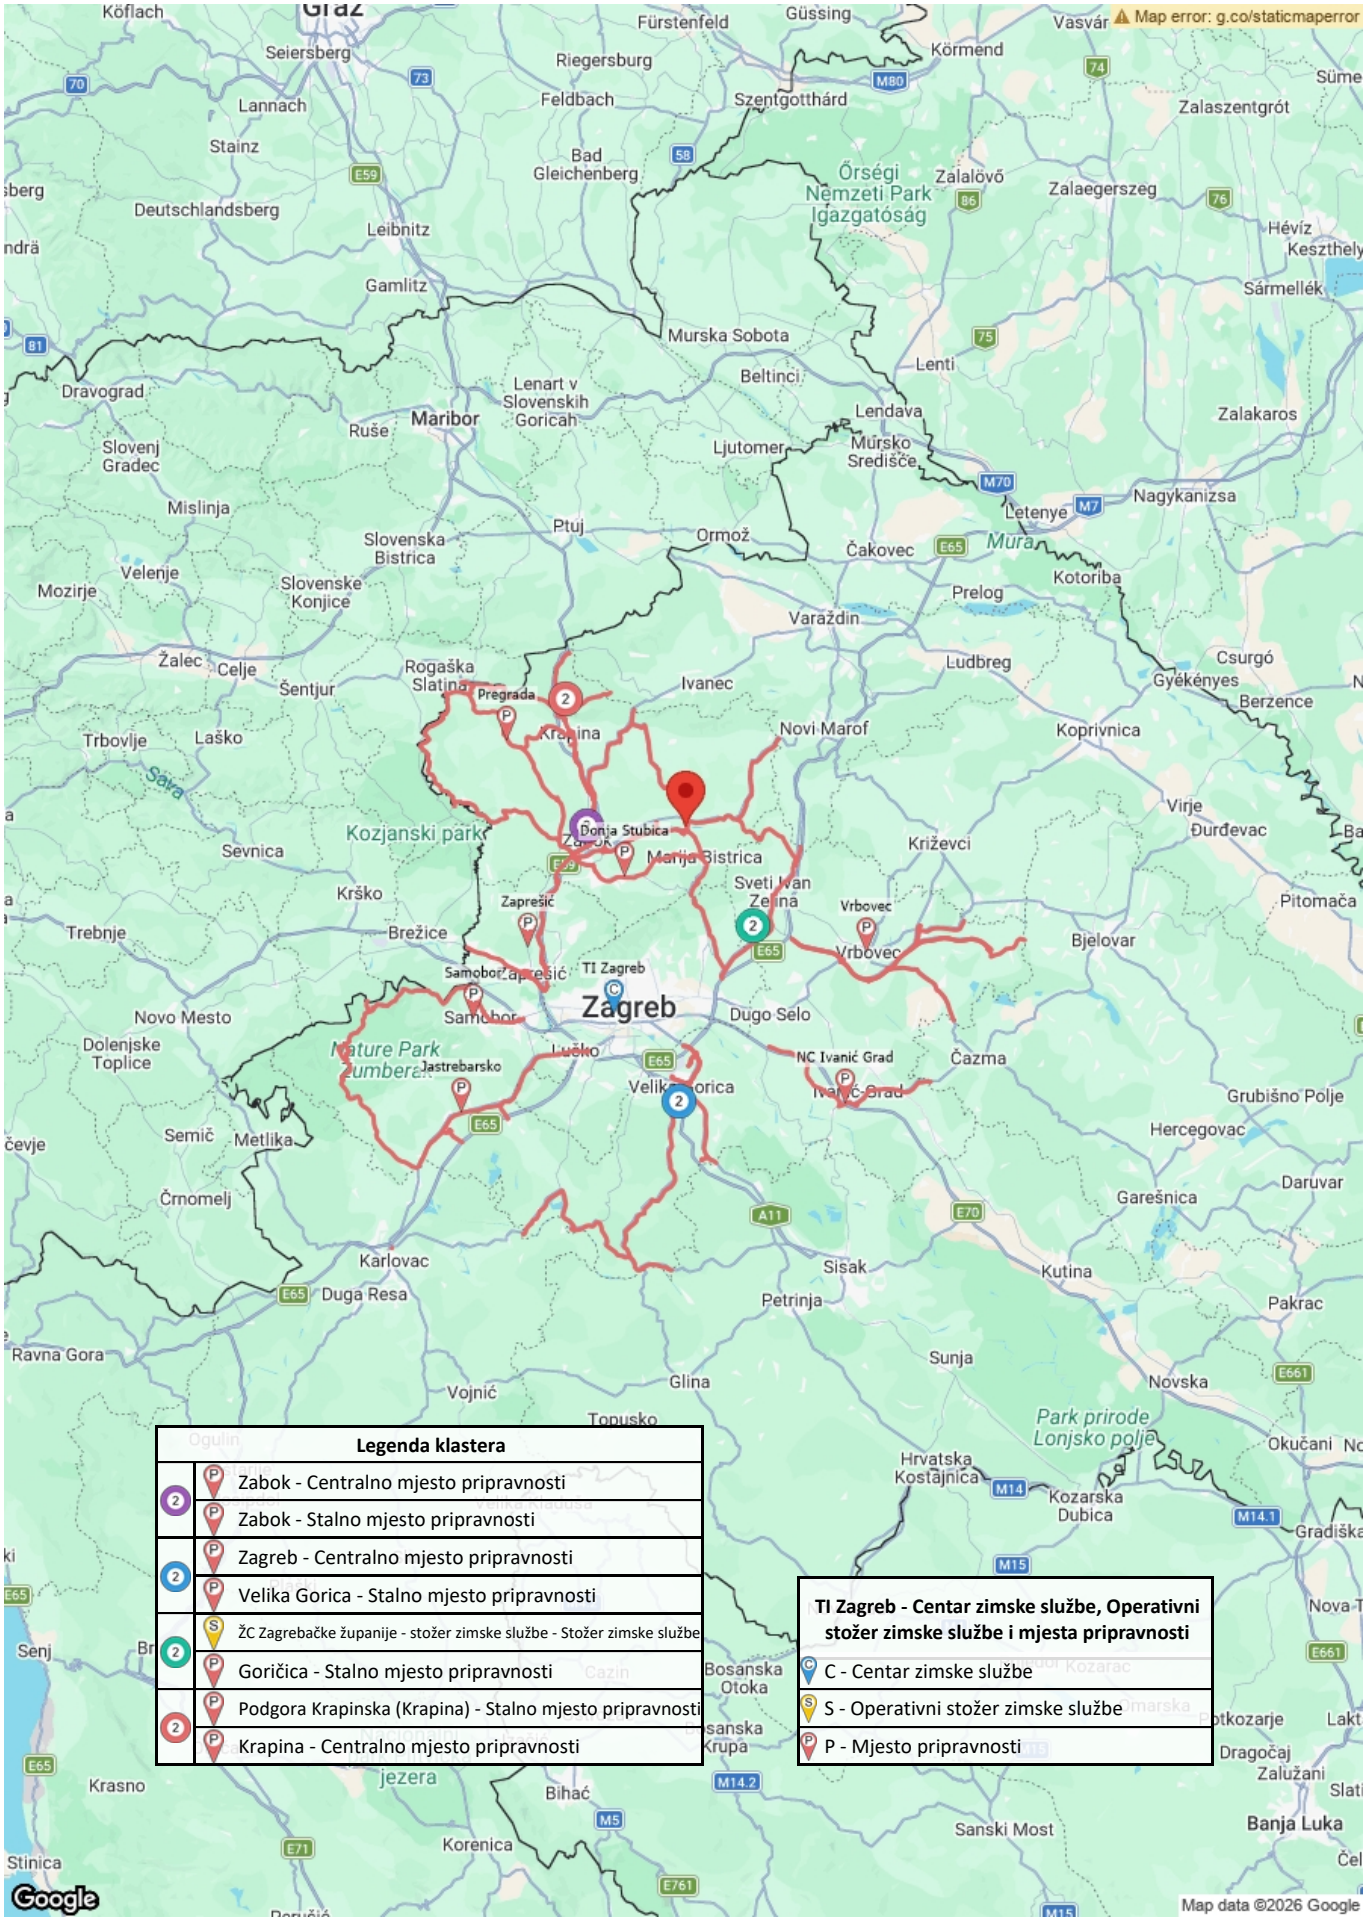

Legenda klastera	
2	Zabok - Centralno mjesto pripravnosti
	Zabok - Stalno mjesto pripravnosti
2	Zagreb - Centralno mjesto pripravnosti
	Velika Gorica - Stalno mjesto pripravnosti
2	ŽC Zagrebačke županije - stožer zimske službe - Stožer zimske službe
	Goričica - Stalno mjesto pripravnosti
2	Podgora Krapinska (Krapina) - Stalno mjesto pripravnosti
	Krapina - Centralno mjesto pripravnosti

TI Zagreb - Centar zimske službe, Operativni stožer zimske službe i mjesta pripravnosti
C - Centar zimske službe
S - Operativni stožer zimske službe
P - Mjesto pripravnosti

3.3. Ovlasti i odgovornosti izvoditelja radova

U obavljanju poslova iz ovog Izvedbenog programa, izvoditelj je dužan pridržavati se rokova i dinamike izvođenja radova utvrđenim mjesečnim operativnim programom radova, a kod izvanrednih događaja i nepredvidivih radova, sukladno odredbama Ugovora.

U slučaju nastanka izvanrednog događaja izvoditelj je obvezan, odmah po saznanju, poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje daljnjih štetnih posljedica koje je prouzročio taj događaj kao i osigurati sigurno odvijanje prometa državnim cestama.

O nastanku izvanrednih događaja, posljedicama, poduzetim mjerama i radovima na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja koji ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa ili bi mogli prouzročiti veća oštećenja ceste, izvoditelj je obvezan odmah obavijestiti odgovornu odnosno ovlaštenu osobu Hrvatskih cesta d.o.o.

O svim poduzetim aktivnostima tijekom obavljanja zimske službe izvoditelj radova mora voditi svu propisanu dokumentaciju iz koje će se moći utvrditi tijek događaja te poduzete radnje i mjere, obavljeni radovi, utrošeni materijal, angažirana sredstava i radnici i to za svaku dionicu državne ceste koju je preuzeo na održavanje.

Za cijelo vrijeme zimskog razdoblja izvoditelj mora uspostaviti takvu organizaciju koja će omogućiti obavljanje svih radova i poslova iz ovog Izvedbenog programa, kao i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za osiguranje sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa na svim državnim cestama preuzetim na održavanje.

Izvoditelj je odgovoran i za uspostavu sustava za praćenje stanja i prohodnosti državnih cesta, a radi obavještavanja javnosti te poduzimanja pravovremenih i djelotvornih aktivnosti za uspostavu sigurnog odvijanja prometa u slučaju zatvaranja ceste za pojedine ili sve kategorije vozila.

Sve štete nastale na cesti i opremi ceste učinjene od strane sudionika u prometu ili drugih pravnih i fizičkih osoba, izvoditelj radova treba odmah evidentirati, utvrditi visinu štete te sve druge okolnosti o nastaloj šteti te o tome odmah obavijestiti odgovornu odnosno ovlaštenu osobu Hrvatskih cesta d.o.o.

Odgovornost za nanesenu materijalnu i nematerijalnu štetu prema sudionicima u prometu i Hrvatskim cestama d.o.o., nastalu zbog nepravovremeno i/ili nekvalitetno izvedenih radova redovitog održavanja i zaštite državnih cesta u zimskom razdoblju, snosi izvoditelj radova.

Ako radovi redovitog održavanja i zaštite državnih cesta nisu obavljeni u skladu s ovim Izvedbenim programom, mjesečnim operativnim programom, utvrđenim i propisanim rokovima ili rokovima koje je posebnim nalogom odredila odgovorna odnosno ovlaštena osoba Hrvatskih cesta d.o.o. ili nisu poduzete sve potrebne mjere za uspostavu sigurnog odvijanja prometa u slučaju izvanrednog događaja, smatra se da su isti obavljeni nepotpuno i/ili nekvalitetno i/ili nepravovremeno.

3.4. Članovi zajednice gospodarskih subjekata

Na području Zagrebačka županije nositelj izvedbenog programa zimske službe je poduzeće ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.. ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O. na području Zagrebačka županije nastupa zajedno sa sljedećim ugovornim izvoditeljima:

Redni broj	Naziv izvoditelja radova	Održava državne ceste na području cestarije/a	Ukupna duljina državnih cesta (km)
1.	ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O.	Samobor, Velika Gorica, Goričica, Zaprešić, Vrbovec, Ivanić Grad	384,990
2.	CESTE KARLOVAC D.D.	Jastrebarsko	77,235

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O. će biti i koordinator svih kooperanata u zimskoj službi, angažiranih od strane nositelja, kao i od strane ostalih članova zajednice gospodarskih subjekata.

4. NADZOR I KONTROLA PROVOĐENJA IZVEDBENOG PROGRAMA

4.1. Centar zimske službe

Za nadzor i kontrolu provođenja ovog Izvedbenog programa na području Tehničke ispostave Zagreb uspostavljen je Centar zimske službe Centar zimske službe Zagreb u sjedištu Tehničke ispostave Zagreb. Na čelo centra imenovana je odgovorna osoba u funkciji šefa. Šef centra zimske službe odobrava i donosi mjesečni operativni program radova, obavlja kontrolu izvođenja svih ugovorenih radova, kontrolira kvalitetu obavljenih radova, kvalitativno i kvantitativno preuzima obavljene radove.

Šef centra zimske službe imenuje svoje pomoćnike i zadužuje ih za operativnu provedbu, nadzor, kontrolu, evidenciju te obračun svih obavljenih aktivnosti tijekom zimskog razdoblja.
Šef i njegovi pomoćnici moraju raspolagati potpunim informacijama o trenutnom stanju i prohodnosti državnih cesta koje su u njihovoj nadležnosti te su u obvezi izdavati potrebne naloge šefu Operativnog stožera ŽC Zagrebačke županije - stožer zimske službe ako se radovi ne izvode sukladno meteorološkim prilikama.

Na razini Centra zimske službe TI Zagreb svakodnevno se objedinjuju podaci o stanju i prohodnosti državnih cesta u nadležnosti Centra, o izvanrednim događajima na njima, kao i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa. Tako objedinjeni podaci šalju se, kroz web aplikaciju OSP - obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta u, HAK te svima zainteresiranima.

U nastavku se daju kontakt podaci šefa Centra zimske službe TI Zagreb i njegovih pomoćnika:

Redni broj	Ime i prezime	Funkcija	Sjedište	Kontakt podaci				Područje u nadležnosti
				Fiksni tel.	Mobilni tel.	Fax	E-mail	
1.	Božidar Šnajder	Šef centra zimske službe	Metalčeva ul. 5, 10000, Zagreb, Hrvatska	01/3091-679	+ 385993124748	01/3091-678	bozidar.snajder@hrvatske-ceste.hr	
2.	Juraj Pakrac	Pomoćnik šefa centra zimske službe	Metalčeva ul. 5, 10000, Zagreb, Hrvatska		+ 38599/2350022		juraj.pakrac@hrvatske-ceste.hr	
3.	Domagoj Zrinski	Pomoćnik šefa centra zimske službe	Metalčeva ul. 5, 10000, Zagreb, Hrvatska		+38599 1677 294		domagoj.zrinski@hrvatske-ceste.hr	
4.	Mario Puškar	Član centra zimske službe	Metalčeva ul. 5, 10000, Zagreb, Hrvatska		+38598 420 288		mario.puskar@hrvatske-ceste.hr	

5. RASPORED MJESTA PRIPRAVNOSTI


Sukladno članku 6. Pravilnika o ophodnji javnih cesta („Narodne novine“ broj 75/2014, 07/21), mjesto stalne pripravnosti je mjesto u kojem je organizirana osposobljena i specijalizirana grupa za hitne intervencije i koja je opremljena odgovarajućim vozilima, strojevima i alatom s kojim je moguće poduzeti najnužnije mjere za zaštitu javne ceste i prometa na njoj te najnužnije radove za sprječavanje daljnjih oštećenja i ugrožavanja sigurnosti odvijanja prometa na javnoj cesti.
Na određenoj mreži javnih cesta broj mjesta stalne pripravnosti i njihov raspored mora biti takav da od zaprimljenog poziva za intervenciju do početka intervencije ne prođe više od 1 (jednog) sata.

Na području Tehničke ispostave Zagreb utvrđuju se, prema područjima županija, sljedeća mjesta stalne pripravnosti:

Redni broj	Županija	Mjesto stalne pripravnosti				Odgovorna osoba	
		Naziv	Sjedište	Telefon	Faks	Ime i prezime	Telefon (mob)
1.	Zagrebačka	Goričica	Zagrebačka cesta 35, 10382, Goričica, Hrvatska	01 2065103	01 2065103	Dražen Roginek Josip Fila	+385913505737 +385916203737
2.		Velika Gorica	Selci 93, 10410, Okuje	01 6219067	01 6219067	Dražen Roginek Dario Cizerlin	+385913505737 +385913415542
3.		Zaprešić	Veliki Vrh 1, Zaprešić	01 3310828	01 3310828	Ivan Kuternik Zoran Nikolić	+385913415519 +38591 347 8412
4.		Samobor	Čudomerščak ul. 1, 10430, Samobor, Hrvatska	01 3360760	01 3360160	Zoran Gotal Zoran Nikolić	+38591 350 5751 +38591 347 8412
5.		Vrbovec	Zagrebačka ulica 130 A, Vrbovec	012791213	012795220	Damir Jakopec Josip Zdorc Tomislav Vacenovski	+38591 341 5523 +38591 350 5702
6.		NC Ivanić Grad	Zajčićeva ul. 54, 10310, Jalševec Breški, Hrvatska	01 2888177	01 2888177	Bonislav Margić	+38591 350 5733
7.		Jastrebarsko	Murat Brijeg bb Jastrebarsko, 10450, Hrvatska	+385 1 628 1219	+385 1 628 1219	Danijel Prokopović Dario Delač Ivan Malkoč Mateo Šetinc	+385 99 275 1668 +38598408675 0992714303 +385997077957
8.	Krapinsko-zagorska	Podgora Krapinska (Krapina)	Podgora Krapinska 117B, 49000, Podgora Krapinska, Krapina, Hrvatska	049 346141	049 346141	Vjekoslav Vrhovec Nikica Krasnik	+38591 350 5015 +385912553392
9.		Pregrada	Janka Leskovara bb, Pregrada	049 376408	049 376408	Vjekoslav Vrhovec Nikica Krasnik	+38591 350 5015 +385912553392
10.		Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	Kolodvorska ul. 5, 49247, Zlatar Bistrica, Hrvatska	049/461706		Vjekoslav Vrhovec Alen Bajzek	+38591 350 5015 +385916093516
11.		Zabok	Ulica 103. brigade 1, Zabok	049 221370	049 503506	Dario Vrančić Lovro Mikulec	+38591 3505706 +385916195700
12.		Donja Stubica	Ul. Župana Vratislava 6, 49240, Donja Stubica, Hrvatska	049 286871	049 286871	Dario Vrančić Danijel Čupar	+38591 3505706 +385913415550

Raspored radnika, potrebne mehanizacije i posipala za svako mjesto pripravnosti razrađeni su u dijelu programa koji obrađuje pripravnosti te redoslijed i prvenstvo izvođenja radova na održavanju cesta u zimskim uvjetima.

Kartografski prikaz rasporeda mjesta stalne pripravnosti daje se u nastavku:

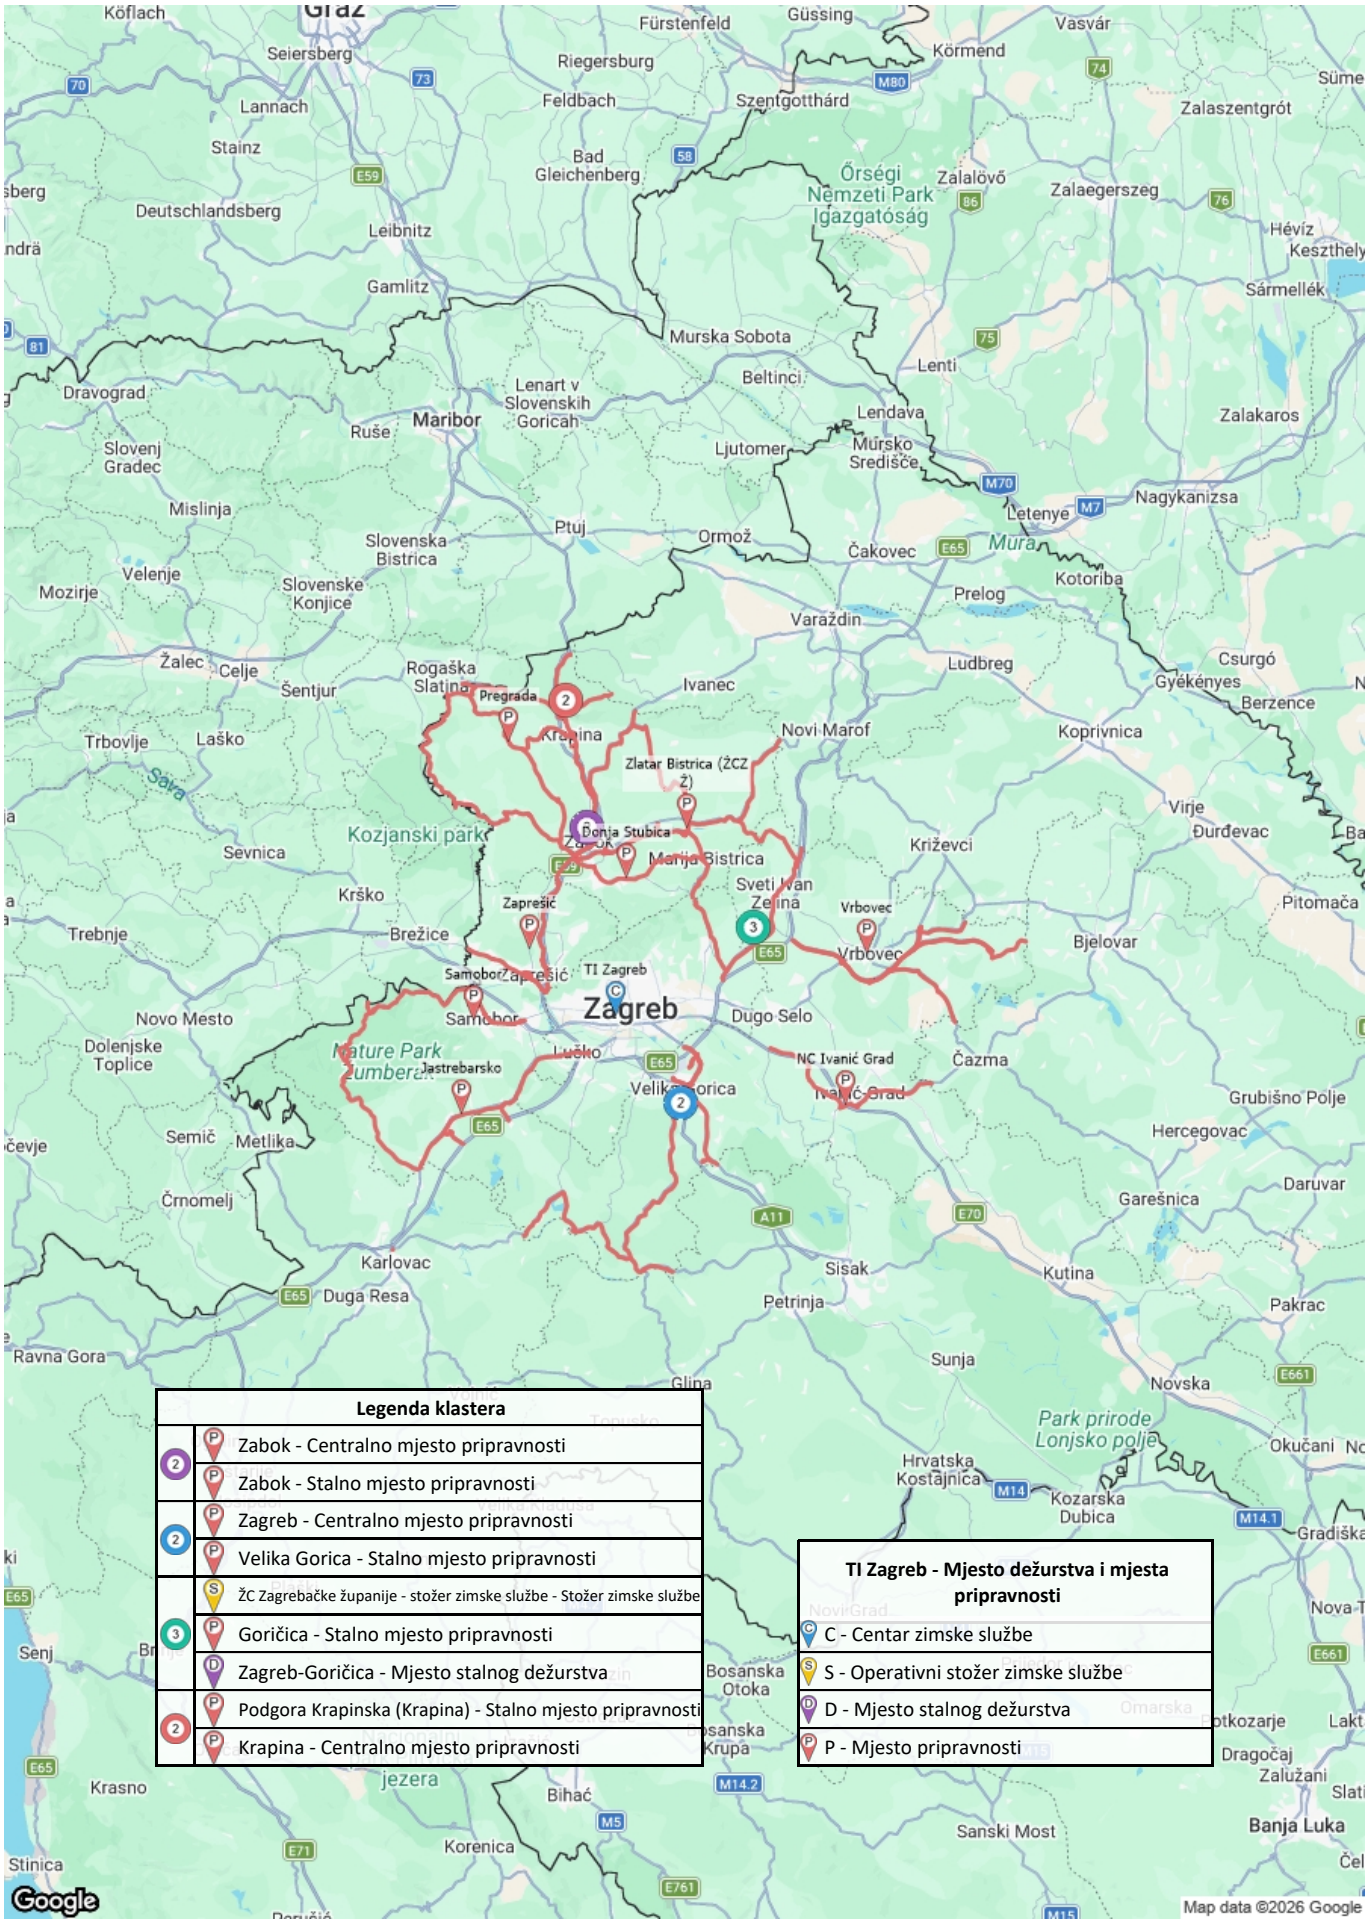

Legenda klastera	
2	Zabok - Centralno mjesto pripravnosti
	Zabok - Stalno mjesto pripravnosti
2	Zagreb - Centralno mjesto pripravnosti
	Velika Gorica - Stalno mjesto pripravnosti
3	ŽC Zagrebačke županije - stožer zimske službe - Stožer zimske službe
	Goričica - Stalno mjesto pripravnosti
	Zagreb-Goričica - Mjesto stalnog dežurstva
2	Podgora Krapinska (Krapina) - Stalno mjesto pripravnosti
	Krapina - Centralno mjesto pripravnosti

TI Zagreb - Mjesto dežurstva i mjesta pripravnosti
C - Centar zimske službe
S - Operativni stožer zimske službe
D - Mjesto stalnog dežurstva
P - Mjesto pripravnosti

6. REDOSLIJED IZVOĐENJA RADOVA S OBZIROM NA UTVRĐENE RAZINE PREDNOSTI

Sukladno članku 37., 38. i 39. Pravilnika o održavanju cesta, mreža državnih cesta na području Tehničke ispostave Zagreb razvrstana je u I, II razinu prednosti. Razine su utvrđene prema gustoći i strukturi prometa, zemljišno klimatskim uvjetima i lokalnim potrebama.
Prioritet je izvođenje radova na sprečavanju poledice, posipanjem, tj. uklanjanju snijega s kolnika na cestama I razine prednosti te zatim na cestama II razine prednosti.
Razine prednosti usklađene su sa svim susjednim tehničkim ispostavama, županijskim upravama za ceste, Hrvatskim autocestama d.o.o. i lokalnim samoupravama.

6.1. Opis razina prednosti

Razine prednosti utvrđene su Pravilnikom o održavanju cesta. U I. razini su autoceste i brze ceste. U II. razinu prednosti razvrstane su javne ceste s prosječnim godišnjim dnevnim prometom većim od 4000 vozila, priključne ceste koje povezuju državne ceste s autocestama, kad je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje, zatim s međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima, međunarodnim zračnim lukama, morskim lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, državnim riječnim lukama, trajektnim lukama te one kojima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže.
Razvrstavanje i ostalih cesta u odnosu na razine prednosti i osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima, sukladno odredbama Pravilnika, prikazano je u sljedećoj tablici:

Razine prednosti	Vrsta javne ceste	Osiguranje prohodnosti	Intezitet snježenja	
			Prosječni	Iznadprosječni
I.	Autoceste i brze ceste	24 sata	Osiguranje prohodnosti kolnika, važnijih raskrižja, prilaza većim odmorištima i zaustavnih traka	Osiguranje prohodnost jednog prometnog traka i prilaza većim parkiralištima
II.	Javne ceste s PGDP > 4000, priključne ceste, koje povezuju državne ceste sa autocestama, kada je državna cesta prva javna cesta na koju se autocesta priključuje, međunarodnim cestovnim graničnim prijelazima, međunarodnim zračnim lukama, morskim lukama od osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, državnim riječnim lukama, trajektnim lukama kojima se ostvaruje kontinuitet državne cestovne mreže.	od 5:00 do 22:00 sata	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati	Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog) s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati
III.	Županijske ceste te osobito one koje povezuju državne i županijske ceste s morskim i riječnim lukama županijskog značenja, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, robnim terminalima, izdvojenim građevinskim područjima i lokalitetima ugostiteljsko turističke i sportsko-rekreacijske namjene, izdvojenim građevinskim područjima proizvodne i poslovne namjene, lokalitetima i građevinama ubilježenim u državnim registrima kao povijesno-kulturna ili prirodna baština, naseljima većim od 300 stanovnika, s tim da je udaljenost početka naselja od razvrstane ceste veća od 500 m te važnije lokalne ceste	od 5:00 do 20:00 sati	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati	Osiguranje prohodnosti (kod kolnika s više prometnih trakova samo jednog prometnog traka) s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 sati
IV.	Ostale lokalne ceste	od 7:00 do 20:00 sati, uskladiti s lokalnim potrebama	Osiguranje prohodnosti s mogućim kraćim zastojima	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana
V.	Ostale javne ceste i površine, parkirališta, biciklističke staze	Uskladiti s lokalnim potrebama	Osiguranje prohodnosti s mogućim zastojima do jednog dana	Osiguranje prohodnosti s mogućim višednevnim zastojima
VI.	Ostale javne ceste koje su u zimskom razdoblju zatvorene	-	-	-

6.2. Cestovni pravci prve razine prednosti

Prohodnost treba osigurati 24 sata dnevno na autocestama i brzim cestama te kod važnijih raskrižja, prilaza većim odmorištima i zaustavnim trakama uz prosječni intenzitet snježenja.
Treba osigurati prohodnost minimum jednog prometnog traka i prilaza većim parkiralištima.

6.3. Cestovni pravci druge razine prednosti

Prohodnost je nužno osigurati u vremenu od 5:00 sati do 22:00 sata s mogućim zastojima do 2 sata između 22:00 i 5:00 sati.
Posipavanje se obavlja natrijevim kloridom ili natrijevim kloridom pomiješanim s kamenom sitneži.

6.4. Cestovni pravci treće razine prednosti

Prohodnost je nužno osigurati u vremenu od 5:00 h do 20:00 h, s mogućim zastojima do 2 sata između 20:00 i 5:00 h.
Posipavanje se obavlja natrijevim kloridom ili natrijevim kloridom pomiješanim s kamenom sitneži.

6.5. Cestovni pravci četvrte razine prednosti

Prohodnost je nužno osigurati u vremenu od 7:00 sati do 20:00 sati s mogućim zastojima do jednog dana, usklađeno s lokalnim potrebama.
Posipavanje se obavlja natrijevim kloridom ili natrijevim kloridom pomiješanim s kamenom sitneži.

6.5. Cestovni pravci pete razine prednosti

Prohodnost je potrebno uskladiti s lokalnim potrebama, čišćenju pristupiti po završetku svih radova na cestovnim pravcima druge i treće razine prednosti, s mogućim zastojima do jednog dana, odnosno višednevno kod iznadprosječnih oborina.


Tijekom izvođenja radova na uklanjanju snijega s kolnika na cestama, uz angažman ljudstva i mehanizacije, obavljaju se i ostale aktivnosti:
-čisti se prometna signalizacija,
-rade se i otvaraju procjednice
-čiste se raskrižja,
-čiste se autobusna i ostala ugibališta, parkirališta, pješački prijelazi i sl.,
-čiste se slivnici i pješačke staze na mostovima,
-proširuje se ranije čišćeni kolnik,
-dobavljaju se posipala,
-vrše se proširenja u krivinama,
-čiste se osuline u usjecima i zasjecima.

Po završetku predmetnih radova na cestama prve, druge i treće razine prednosti, pristupa se radovima na cestama pete razine.

Iznimno, zimska služba nije dužna osigurati prohodnost na cesti u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu velikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem području npr, zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima.

Radovi po završetku rada zimske službe obuhvaćaju slijedeće aktivnosti:
-uklanjanje privremenih prometnih oznaka i signalizacije koji su bili u funkciji sigurnijeg odvijanja prometa u zimskim uvjetima
-uklanjanje signalnog kolja i snjegobrana
-čišćenje prometnih površina od zaostalog posipala.

Na karti u nastavku prikazane su državne ceste na području Tehničke ispostave Zagreb prema razinama prednosti:

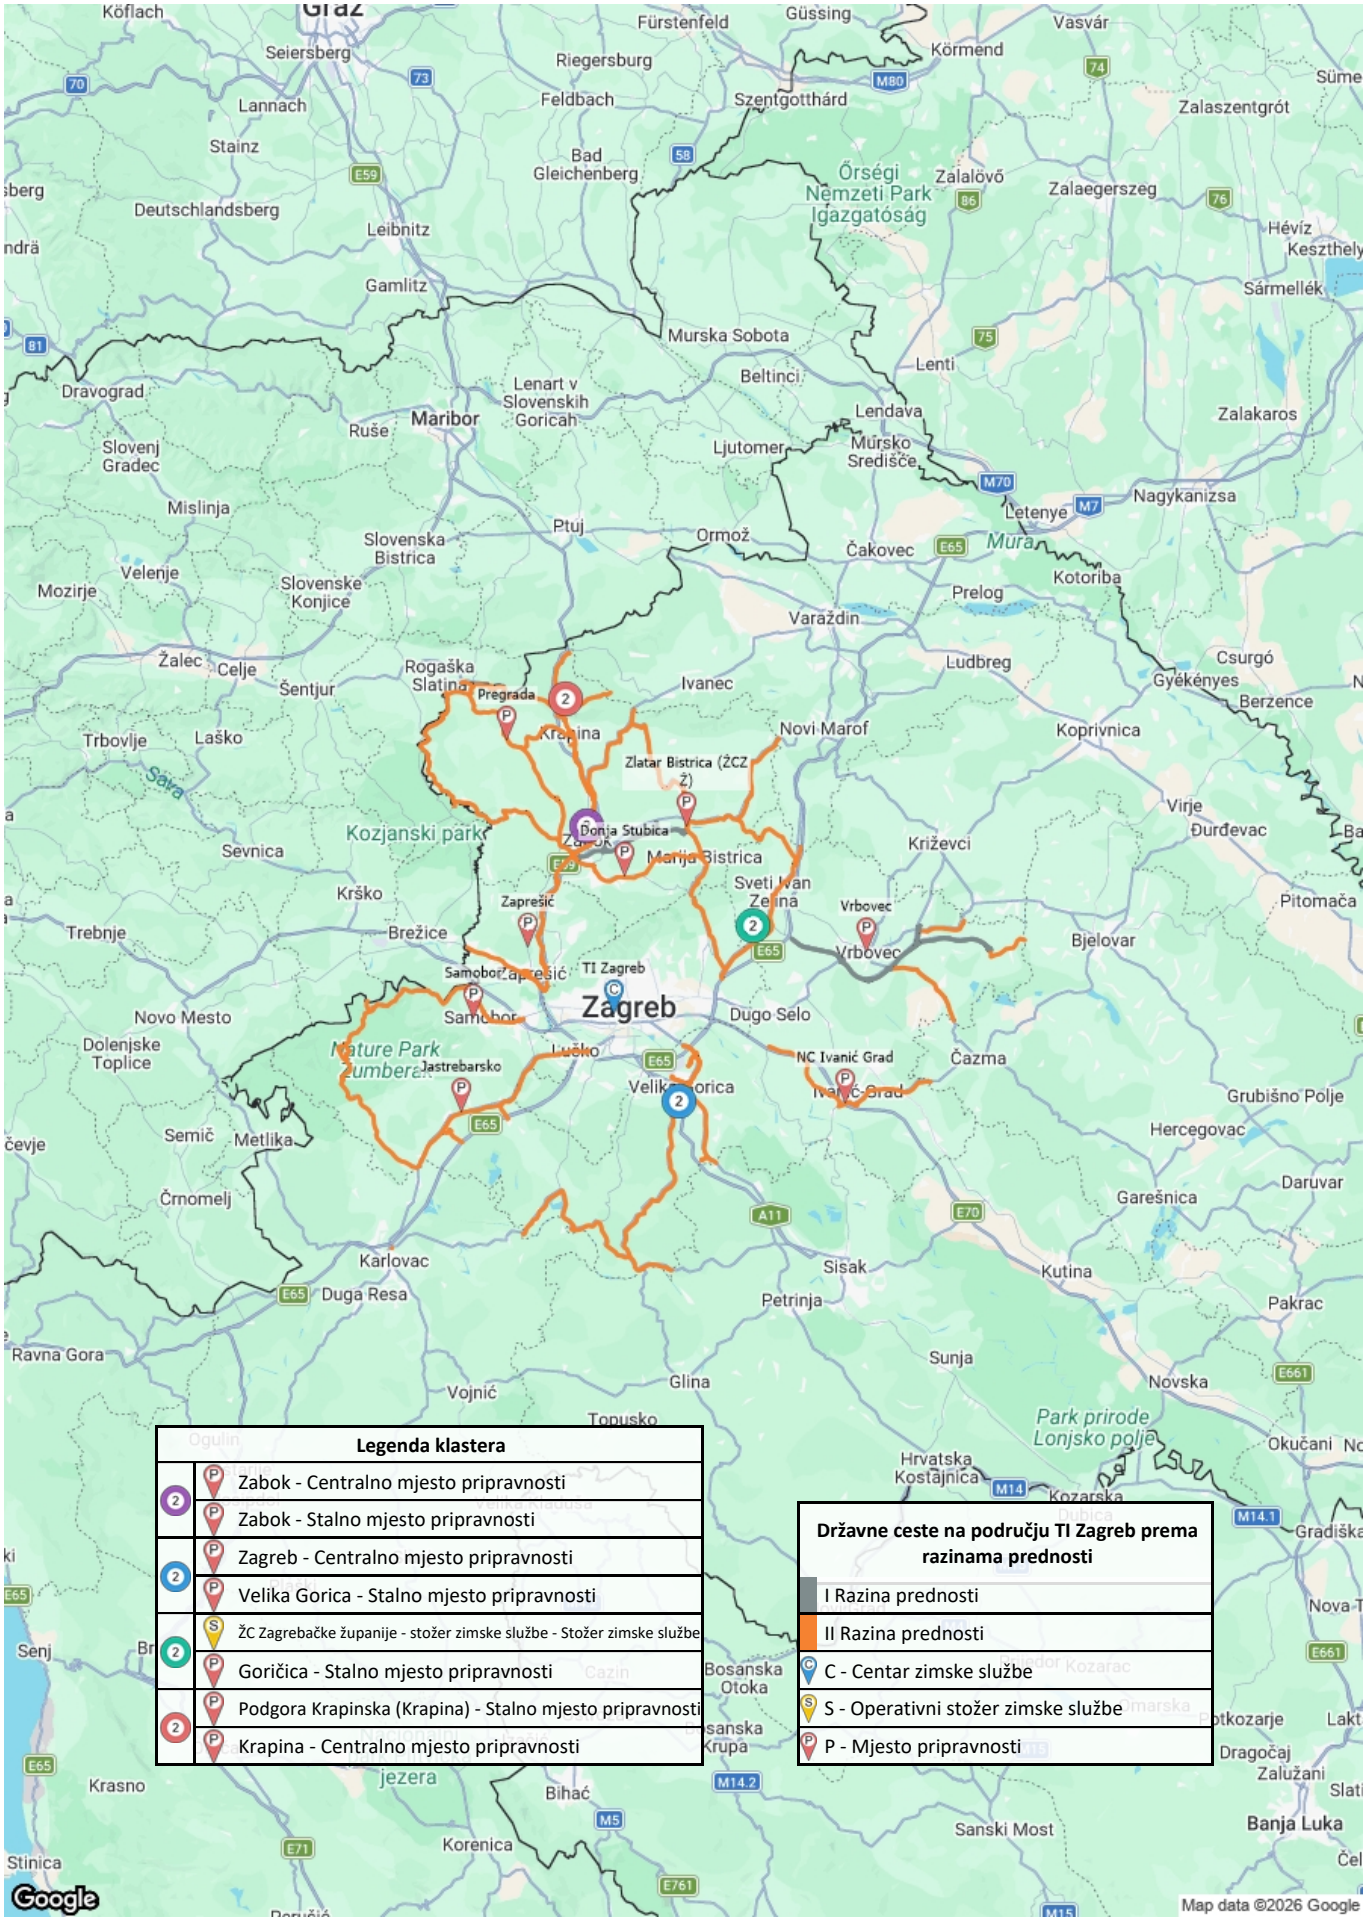

Legenda klastera	
2	Zabok - Centralno mjesto pripravnosti
	Zabok - Stalno mjesto pripravnosti
2	Zagreb - Centralno mjesto pripravnosti
	Velika Gorica - Stalno mjesto pripravnosti
2	ŽC Zagrebačke županije - stožer zimske službe - Stožer zimske službe
	Goričica - Stalno mjesto pripravnosti
2	Podgora Krapinska (Krapina) - Stalno mjesto pripravnosti
	Krapina - Centralno mjesto pripravnosti

Državne ceste na području TI Zagreb prema razinama prednosti
I Razina prednosti
II Razina prednosti
C - Centar zimske službe
S - Operativni stožer zimske službe
P - Mjesto pripravnosti

6.6. Popis državnih cesta na području Tehničke ispostave Zagreb

Popis državnih cesta na području Tehničke ispostave Zagreb prema razinama prednosti na području pojedinih mjesta pripravnosti daje se u nastavku:

Mjesto stalne pripravnosti Goričica:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC3	0008	Čvorište Breznički Hum (A4) - Čvorište Komin (A4/D540)	2,598	P1-0008, P2-0008	0,322	2,92	II
DC3	0009	Čvorište Komin (A4/D540) - Donja Zelina (Ž3016)	10,187	P1-0009, 0109	0,116	10,303	II
DC3	0010	Donja Zelina (Z3016) - Čvorište Popovec (A4)	10,799	P1-0010, P2-0010, 0110	0,168	10,967	II
DC29	0001	Laz Bistrički (gr. KZŽ)-Soblinec (A3)	13,176		0	13,176	II
DC540	0001	Beloslavec (gr.KZŽ) - Komin (D3)	9,522	0101, P2-0001	0,12	9,642	II
Ukupno:						47,008	

Mjesto stalne pripravnosti Velika Gorica:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC30	0001	Velika Kosnica (NC311670) - Velika Gorica (D31)	8,181	P1-0001, P2-0001, P4-0001, P7-0001	1,198	9,379	II
DC30	0002	Velika Gorica (D31) - Žažina (D36)	11,901	P1-0002	0,079	11,98	II
DC30	0101	Velika Gorica (D31) - Velika Kosnica (nerazvrstana cesta)	8,211		0	8,211	II
DC31	0001	V. Gorica (D30) - Pokupsko (D36)	31,288		0	31,288	II
DC31	0002	Gladovec Pokupski (D36) - Slatina Pokupska (gr. SMŽ)	3,787	0202	0,032	3,819	II
DC31	0101	Velika Gorica (D30)	3,383		0	3,383	II
DC36	0001	Lijevo Sredićko - Cerje Pokupsko (D31)	10,337		0	10,337	II
DC36	0002	Pokupsko - Kluka (g.ž.)	4,848		0	4,848	II
DC408	0001	Velika Gorica: Zračna luka Zagreb - D30	2,925	P1-0001, P2-0001, P3-0001	0,205	3,13	II
DC408	0101	Velika Gorica (DC30)	2,922		0	2,922	II
DC430	0001	Kosnica (D30) - Zračna luka Franjo Tuđman	2,108	P1-0001	0,25	2,358	II
DC430	0101	Velika Gorica (Žračna luka Franjo Tuđman) - Selnica Šćitarjevska (D30)	2,105		0	2,105	II
DC536	0001	Čvorište Buševec (A11) - Buševec (D30)	1,009	0101, 0201, P1-0001	0,244	1,253	II
Ukupno:						95,013	

Mjesto stalne pripravnosti Zaprešić:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC1	0007	Čvorište Žeinci (A2) - čvorište Zaprešić (A2)	14,945	P4-0007, P6-0007, P7-0007, P9-0007, P10-0007, P11-0007, P12-0007, P15-0007, P16-0007, P17-0007, P18-0007, P19-0007, P20-0007, P21-0007, P22-0007, P23-0007	1,983	16,928	II
DC1	0107	Ivanec Bistranski (A2) - Novaki Bistranski (Ž2262)	2,567		0	2,567	II
DC225	0001	Harmica (GP Harmica (granica RH/Slovenija)) - Brdovec - Ivanec Bistranski (A2)	14,5	P11-0001, P1-0001, P12-0001, P13-0001, P14-0001, P15-0001, P16-0001, P17-0001, P18-0001, P2-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001, P9-0001, P10-0001, 0101, 0301, 0501	2,687	17,187	II
DC225	0001	granica grada Zagreba-Ivanec Bistranski (A2)	0,632		0	0,632	II
DC225	0201	Zaprešić	2,518		0	2,518	II
Ukupno:						39,832	

Mjesto stalne pripravnosti Samobor:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC1	0008	Stupnik (gr. Grada Zagreba) - Pavučnjak	12,059		0	12,059	II
DC1	0008	Zagreb (A1) - Stupnik (gr. Grada Zagreba)	3,67		0	3,67	II
DC231	0001	G.P. Bregana Naselje (gr. R. Slovenije) - Samobor - čvor Sv. Nedelja (A3)	10,886	0101, 0201, 0301, 0401, 0501, 0601, 0701, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001, P9-0001, P10-0001, P11-0001	1,036	11,922	II
DC546	P1-0002	Novo Selo Žumberačko - gr. rep. Slovenije	1,987		0	1,987	II
DC546	0001	Bregana (DC231) - Novo Selo Žumberačko	22,838		0	22,838	II
DC546	0002	Novo Selo Žumberačko - Gornaj Vas (gr. NC Jastrebarsko)	6,83		0	6,83	II
Ukupno:						59,306	

Mjesto stalne pripravnosti Vrbovec:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC10	P1-0002	Greda,krak	0,509		0	0,509	I
DC10	P1-0004	Cugovec krak	0,76		0	0,76	I
DC10	P4-0004	Cugovec krak	0,551		0	0,551	I
DC10	P5-0004	Cugovec krak	0,812		0	0,812	I
DC10	P8-0003	Grabrić krak	0,926		0	0,926	I
DC10	P9-0003	Grabrić krak	0,62		0	0,62	I
DC10	0001	Sveta Helena: Čvorište Sv. Helena (A4) - čvorište Vrbovec1	7,626		0	7,626	I

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC10	0002	Čvorište Vrbovec1 - čvorište Dubrava (D26)	8,259	P10-0002, P11-0002, P12-0002, P13-0002, P14-0002, P15-0002, P16-0002, P2-0002, P3-0002, P4-0002, P5-0002, P6-0002, P7-0002, P8-0002, P9-0002	3,097	11,356	I
DC10	0003	Čvorište Dubrava (D26) - čvorište Gradec (D28)	7,413	P1-0003, P2-0003, P3-0003, P4-0003, P5-0003, P6-0003, P7-0003	1,641	9,054	I
DC10	0004	Cugovec (D28/Ž3052) - Križevci (D22)	0,641	P2-0004, P3-0004, P6-0004	0,429	1,07	I
DC10	0101	Greda (Ž3034) - Sveta Helena (A4)	8,143		0	8,143	I
DC10	0102	Naselje Stjepana Radića (D26/Ž3288) - Greda (Ž3034)	8,135		0	8,135	I
DC10	0103	Lubena (D28/Ž3052) - Naselje Stjepana Radića (D26/Ž3288)	7,827		0	7,827	I
DC12	P1-0001	Farkaševac,krak	0,727		0	0,727	I
DC12	P3-0001	Farkaševac,krak	0,684		0	0,684	I
DC12	0001	Čvorište Vrbovec 2 (D10) - čvorište Farkaševac (D544)	11,824	P2-0001, P4-0001	0,759	12,583	I
DC12	0101	Zvonik (D544/Ž2231) - Haganj - Potočec (D10)	12,4		0	12,4	I
DC26	0001	Naselje Stjepana Radića: Čvorište Dubrava (D10/Z3288) - Čazma (D43)	13,783	0201	0,027	13,81	II
DC28	0001	Čvorište Gradec (D10) - Haganj (granica NC Križevci)	7,358		0	7,358	II
DC43	0004	Trebovec - čvorište Rugvica (A3)	8,991	0104	0,034	9,025	II
DC544	0001	Čvorište Farkaševac (D12) - Bolč	7,374	0101	0,015	7,389	II
Ukupno:						121,365	

Mjesto stalne pripravnosti NC Ivanić Grad:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC43	0003	Šumečani (g.ž.) - Ivanić Grad: Čvor Ivanić Grad (A3)	12,154	P3-0003, P4-0003, P5-0003, 0103	0,259	12,413	II
DC43	0004	Čvorište Ivanić Grad (A3) - Trebovec	9,71	P1-0004, 0204, 0304	0,343	10,053	II
Ukupno:						22,466	

Mjesto stalne pripravnosti Jastrebarsko:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC1	0008	Pavučnjak - Jastrebarsko (D310)	11,008		0	11,008	II
DC1	0009	Jastrebarsko (D310) - Karlovac (D36)	6,203		0	6,203	II
DC36	0001	Donja Kupćina(g.ž.)- Lijevo Središko	18,294	P2-0001, 0101	0,147	18,441	II
DC310	0001	Jastrebarsko (D1) - Čabdin: čvorište Jastrebarsko (A1)	4,526	0101, 0201, P2-0001, 0301	0,26	4,786	II
DC543	0001	Klinča Sela (D1) – čvorište Donja Zdenčina (A1)	2,324	0101	0,059	2,383	II
DC546	0002	Gornja Vas (gr. NC Samobor) - Kostanjevac (ŽC3273)	13,075		0	13,075	II
DC546	0003	Kostanjevac (ŽC3273) - Krašić - Draganić (gr. TI Karlovac)	17,494		0	17,494	II
DC683	0001	Kalje (DC546 - DC546)	3,845		0	3,845	II
Ukupno:						77,235	

Mjesto stalne pripravnosti Podgora Krapinska (Krapina):

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC1	0001	Gornji Macelj (A2/ŽC2258) - Đurmanec (DC207)	8,425	P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, 0101	0,491	8,916	II
DC1	0002	Đurmanec (DC207) - Krapina (DC206)	5,108	P1-0002, P11-0002, P14-0002, P2-0002, P3-0002, P4-0002, P6-0002, P7-0002, P8-0002, P9-0002	2,28	7,388	II
DC1	0003	Krapina (DC206) - Velika Ves (A2)	2,848	0103, P1-0003, P2-0003	0,269	3,117	II
DC1	0003	Krapina (DC 206)- Velika Ves (A2)	0,107		0	0,107	II
DC1	0004	Velika Ves (A2) - Sveti Križ Začretje (DC35)	7,316	P1-0004, P2-0004, P3-0004, P4-0004, 0104	0,738	8,054	II
DC1	0004	Velika Ves (A2)-Sveti Križ Začretje(DC35)	7,316	P1-0004, P2-0004, P3-0004, P4-0004, 0104	0,738	8,054	II
DC35	0002	Kuzminec - Švaljkovec (D1)	9,346	0102	0,052	9,398	II
DC74	0001	Đurmanec (D207) - Šaša	11,385		0	11,385	II
DC207	0001	Hum na Sutli (D206) - Đurmanec (D1)	14,515	P1-0001, P2-0001, P3-0001, 0101	0,376	14,891	II
DC434	0001	Bobovje - Mihaljekov Jarek (D1)	0,623	0101	0,032	0,655	II
Ukupno:						71,965	

Mjesto stalne pripravnosti Pregrada:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC206	0001	GP Hum na Sutli (gr. R. Slov.) -MP Pregrada	14,233	P1-0001, 0101	0,133	14,366	II
DC206	0001	Pregrada - Valentinovo (D507)	1,771		0	1,771	II
DC206	0002	Valentinovo (D507) - Krapina (D1)	12,712	P1-0002, P2-0002, P3-0002, 0102, 0202	0,195	12,907	II
DC229	0001	Hum Na Sutli (D206) - Mali Tabor - Luke Poljanske - Miljana - Razvor (D205)	26,741	P1-0001, P2-0001, P3-0001	0,456	27,197	II
DC233	0002	Mali Tabor - Hum na Sutli (D206)	1,923		0	1,923	II
Ukupno:						58,164	

Mjesto stalne pripravnosti Zlatar Bistrica (ŽCZŽ):

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC24	0001	Zlatar Bistrica (D29) - Pece (DC24)	22,399		0	22,399	II
DC29	0001	Novi Golubovec (D35) - Zlatar Bistrica	36,005	0101, 0201, 0301, 0401, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001	0,486	36,491	II
DC29	0001	Zlatar Bistrica (DC29)- Zlatar Bistrica (DC24)	0,991		0	0,991	II
DC35	0002	Očura-Kuzminec	6,416		0	6,416	II
DC540	0001	Konjščina (DC24) - Beloslavec	5,525	P1-0001	0,04	5,565	II
Ukupno:						71,862	

Mjesto stalne pripravnosti Zabok:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC1	0005	Sveti Križ Začretje (A2) - Zabok (Ž2195)	6,351	P1-0005, P2-0005, 0105	0,187	6,538	II

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC1	0005	Sveti Križ Začretje (DC35) - Zabok (ŽC2264)	6,351	0105, P1-0005, P2-0005	0,187	6,538	II
DC1	0006	Zabok (Ž2195) - Gubaševo (D205)	3,454	P10-0006, P1-0006, P11-0006, P12-0006, P13-0006, P2-0006, P3-0006, P4-0006, P5-0006, P6-0006, P7-0006, P8-0006, P9-0006, 0106, 0206, 0306, 0406, 0506	1,01	4,464	II
DC1	0006	Zabok (ŽC2264) - Pavlovec Zabočki (DC205/ŽC2267)	3,454	0106, 0206, 0306, 0406, 0506, P1-0006, P2-0006, P3-0006, P4-0006, P5-0006, P6-0006, P7-0006, P8-0006, P9-0006, P10-0006, P11-0006, P12-0006, P13-0006	1,01	4,464	II
DC1	0007	Gubaševo (D205) - čvorište Žeinci (A2)	5,082	P1-0007, P18-0007, P19-0007, P20-0007, P2-0007, P21-0007, P22-0007, P23-0007, P3-0007, P4-0007, P5-0007, P6-0007, P7-0007, P8-0007, P9-0007, 0207, 0307	1,535	6,617	II
DC1	0107	Ivanec Bistranski (A2) - Novaki Bistranski (ŽC2262)	2,567		0	2,567	II
DC14	P1-0001	čvor Bračak,krak	0,666		0	0,666	I

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC14	P1-0002	Bedekovčina,krak	0,597		0	0,597	I
DC14	P11-0002	Bedekovčina,krak	0,58		0	0,58	I
DC14	P12-0001	čvor Bračak,krak	0,902		0	0,902	I
DC14	P12-0002	Hum Bistrički,krak	0,575		0	0,575	I
DC14	P13-0001	čvor Bračak,krak	0,972		0	0,972	I
DC14	P15-0002	Poznanovec	1,64		0	1,64	I
DC14	P17-0002	Poznanovec,krak	0,57		0	0,57	I
DC14	P2-0002	Poznanovec,krak	0,647		0	0,647	I
DC14	P21-0002	Zlatar Bistrica,krak	0,524		0	0,524	I
DC14	P23-0002	Zlatar Bistrica,krak	0,774		0	0,774	I
DC14	P24-0002	Zlatar Bistrica,krak	0,628		0	0,628	I
DC14	P3-0002	Zlatar Bistrica,krak	0,582		0	0,582	I
DC14	P4-0001	čvor Bračak,krak	0,865		0	0,865	I
DC14	P4-0002	Bedekovčina,krak	1,134		0	1,134	I
DC14	P7-0001	čvor Bračak,krak	0,525		0	0,525	I
DC14	P8-0001	čvor Bračak,krak	0,778		0	0,778	I
DC14	0001	Mokrice (D307) - Dubrava Zabočka - Bedekovčina	8,973	P10-0001, P11-0001, P2-0001, P3-0001, P5-0001, P6-0001, P9-0001	0,856	9,829	I
DC14	0002	Bedekovčina - Dubovec - Selnica - Podgrađe (D29)	8,444	P13-0002, P14-0002, P16-0002, P18-0002, P19-0002, P20-0002, P22-0002, 0102	1,444	9,888	I
DC14	0101	Dubrava Zabočka - Andraševec	1,019		0	1,019	I
DC14	0201	Mokrice (D307)	0,648		0	0,648	I
DC14	0202	Selnica	1,122		0	1,122	I
DC14	0302	Selnica - Dubovec	1,224		0	1,224	I
DC14	0402	Vučak - Bedekovčina	1,73		0	1,73	I
DC35	0002	Švaljkovec (ŽC2160) - Sveti Križ Začretje (DC1)	2,954		0	2,954	II
DC205	0001	GP Razvor (granica RH/R Slovenija) - Gubaševo (D1)	24,493	0101, 0201, P1-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001, P2-0001	1,027	25,52	II

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC507	0001	Bušin (D206) - Klokovec - Jezero Klanječko (D205)	15,638	0101, P1-0001, P2-0001, P3-0001	0,507	16,145	II
Ukupno:						114,226	

Mjesto stalne pripravnosti Donja Stubica:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)	Razina prednosti
DC307	0001	Gubaševo (D1) – Oroslavje – D. Stubica - Marija Bistrica (D29)	23,794	0101, 0201, 0301, 0401, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001	0,721	24,515	II
Ukupno:						24,515	

Popis državnih cesta na području Tehničke ispostave Zagreb prema razinama prednosti na području pojedinih županija daje se u nastavku:

Cestovni pravci I. razine prednosti

Zagrebačka:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)
DC10	P1-0002	Greda,krak	0,509		0	0,509
DC10	P1-0004	Cugovec krak	0,76		0	0,76
DC10	P4-0004	Cugovec krak	0,551		0	0,551
DC10	P5-0004	Cugovec krak	0,812		0	0,812
DC10	P8-0003	Grabrić krak	0,926		0	0,926
DC10	P9-0003	Grabrić krak	0,62		0	0,62
DC10	0001	Sveta Helena: Čvorište Sv. Helena (A4) - čvorište Vrbovec1	7,626		0	7,626
DC10	0002	Čvorište Vrbovec1 - čvorište Dubrava (D26)	8,259	P10-0002, P11-0002, P12-0002, P13-0002, P14-0002, P15-0002, P16-0002, P2-0002, P3-0002, P4-0002, P5-0002, P6-0002, P7-0002, P8-0002, P9-0002	3,097	11,356
DC10	0003	Čvorište Dubrava (D26) - čvorište Gradec (D28)	7,413	P1-0003, P2-0003, P3-0003, P4-0003, P5-0003, P6-0003, P7-0003	1,641	9,054
DC10	0004	Cugovec (D28/Ž3052) - Križevci (D22)	0,641	P2-0004, P3-0004, P6-0004	0,429	1,07
DC10	0101	Greda (Ž3034) - Sveta Helena (A4)	8,143		0	8,143
DC10	0102	Naselje Stjepana Radića (D26/Ž3288) - Greda (Ž3034)	8,135		0	8,135
DC10	0103	Lubena (D28/Ž3052) - Naselje Stjepana Radića (D26/Ž3288)	7,827		0	7,827
DC12	P1-0001	Farkaševac,krak	0,727		0	0,727
DC12	P3-0001	Farkaševac,krak	0,684		0	0,684
DC12	0001	Čvorište Vrbovec 2 (D10) - čvorište Farkaševac (D544)	11,824	P2-0001, P4-0001	0,759	12,583
DC12	0101	Zvonik (D544/Ž2231) - Haganj - Potočec (D10)	12,4		0	12,4
Ukupno:						83,783

Krapinsko-zagorska:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)
DC14	P1-0001	čvor Bračak,krak	0,666		0	0,666
DC14	P1-0002	Bedekovčina,krak	0,597		0	0,597
DC14	P11-0002	Bedekovčina,krak	0,58		0	0,58
DC14	P12-0001	čvor Bračak,krak	0,902		0	0,902
DC14	P12-0002	Hum Bistrički,krak	0,575		0	0,575
DC14	P13-0001	čvor Bračak,krak	0,972		0	0,972
DC14	P15-0002	Poznanovec	1,64		0	1,64
DC14	P17-0002	Poznanovec,krak	0,57		0	0,57
DC14	P2-0002	Poznanovec,krak	0,647		0	0,647
DC14	P21-0002	Zlatar Bistrica,krak	0,524		0	0,524
DC14	P23-0002	Zlatar Bistrica,krak	0,774		0	0,774
DC14	P24-0002	Zlatar Bistrica,krak	0,628		0	0,628
DC14	P3-0002	Zlatar Bistrica,krak	0,582		0	0,582
DC14	P4-0001	čvor Bračak,krak	0,865		0	0,865
DC14	P4-0002	Bedekovčina,krak	1,134		0	1,134
DC14	P7-0001	čvor Bračak,krak	0,525		0	0,525
DC14	P8-0001	čvor Bračak,krak	0,778		0	0,778
DC14	0001	Mokrice (D307) - Dubrava Zabočka - Bedekovčina	8,973	P10-0001, P11-0001, P2-0001, P3-0001, P5-0001, P6-0001, P9-0001	0,856	9,829
DC14	0002	Bedekovčina - Dubovec - Selnica - Podgrađe (D29)	8,444	0102, P13-0002, P14-0002, P16-0002, P18-0002, P19-0002, P20-0002, P22-0002	1,444	9,888
DC14	0101	Dubrava Zabočka - Andraševec	1,019		0	1,019
DC14	0201	Mokrice (D307)	0,648		0	0,648
DC14	0202	Selnica	1,122		0	1,122
DC14	0302	Selnica - Dubovec	1,224		0	1,224
DC14	0402	Vučak - Bedekovčina	1,73		0	1,73
Ukupno:						38,419

Cestovni pravci II. razine prednosti

Zagrebačka:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)
DC1	0007	Čvorište Žeinci (A2) - čvorište Zaprešić (A2)	14,945	P10-0007, P11-0007, P12-0007, P15-0007, P16-0007, P17-0007, P18-0007, P19-0007, P20-0007, P21-0007, P22-0007, P23-0007, P4-0007, P6-0007, P7-0007, P9-0007	1,983	16,928
DC1	0008	Stupnik (gr. Grada Zagreba) - Pavučnjak	12,059		0	12,059
DC1	0008	Pavučnjak - Jastrebarsko (D310)	11,008		0	11,008
DC1	0008	Zagreb (A1) - Stupnik (gr. Grada Zagreba)	3,67		0	3,67
DC1	0009	Jastrebarsko (D310) - Karlovac (D36)	6,203		0	6,203
DC1	0107	Ivanec Bistranski (A2) - Novaki Bistranski (Ž2262)	2,567		0	2,567
DC3	0008	Čvorište Breznički Hum (A4) - Čvorište Komin (A4/D540)	2,598	P1-0008, P2-0008	0,322	2,92
DC3	0009	Čvorište Komin (A4/D540) - Donja Zelina (Ž3016)	10,187	0109, P1-0009	0,116	10,303
DC3	0010	Donja Zelina (Z3016) - Čvorište Popovec (A4)	10,799	0110, P1-0010, P2-0010	0,168	10,967
DC26	0001	Naselje Stjepana Radića: Čvorište Dubrava (D10/Z3288) - Čazma (D43)	13,783	0201	0,027	13,81
DC28	0001	Čvorište Gradec (D10) - Haganj (granica NC Križevci)	7,358		0	7,358
DC29	0001	Laz Bistrički (gr. KZŽ)-Soblinec (A3)	13,176		0	13,176
DC30	0001	Velika Kosnica (NC311670) - Velika Gorica (D31)	8,181	P1-0001, P2-0001, P4-0001, P7-0001	1,198	9,379
DC30	0002	Velika Gorica (D31) - Žažina (D36)	11,901	P1-0002	0,079	11,98
DC30	0101	Velika Gorica (D31) - Velika Kosnica (nerazvrstana cesta)	8,211		0	8,211
DC31	0001	V. Gorica (D30) - Pokupsko (D36)	31,288		0	31,288
DC31	0002	Gladovec Pokupski (D36) - Slatina Pokupska (gr. SMŽ)	3,787	0202	0,032	3,819
DC31	0101	Velika Gorica (D30)	3,383		0	3,383
DC36	0001	Donja Kupćina(g.ž.)-Lijevo Sredičko	18,294	0101, P2-0001	0,147	18,441
DC36	0001	Lijevo Sredićko - Cerje Pokupsko (D31)	10,337		0	10,337
DC36	0002	Pokupsko - Kluka (g.ž.)	4,848		0	4,848

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)
DC43	0003	Šumečani (g.ž.) - Ivanić Grad: Čvor Ivanić Grad (A3)	12,154	0103, P3-0003, P4-0003, P5-0003	0,259	12,413
DC43	0004	Čvorište Ivanić Grad (A3) - Trebovec	9,71	0204, 0304, P1-0004	0,343	10,053
DC43	0004	Trebovec - čvorište Rugvica (A3)	8,991	0104	0,034	9,025
DC225	0001	Harmica (GP Harmica (granica RH/Slovenija)) - Brdovec - Ivanec Bistranski (A2)	14,5	0101, 0301, 0501, P10-0001, P1-0001, P11-0001, P12-0001, P13-0001, P14-0001, P15-0001, P16-0001, P17-0001, P18-0001, P2-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001, P9-0001	2,687	17,187
DC225	0001	granica grada Zagreba- Ivanec Bistranski (A2)	0,632		0	0,632
DC225	0201	Zaprešić	2,518		0	2,518
DC231	0001	G.P. Bregana Naselje (gr. R. Slovenije) - Samobor - čvor Sv. Nedelja (A3)	10,886	0101, 0201, 0301, 0401, 0501, 0601, 0701, P10-0001, P1-0001, P11-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001, P9-0001	1,036	11,922
DC310	0001	Jastrebarsko (D1) - Čabdin: čvorište Jastrebarsko (A1)	4,526	0101, 0201, 0301, P2-0001	0,26	4,786
DC408	0001	Velika Gorica: Zračna luka Zagreb - D30	2,925	P1-0001, P2-0001, P3-0001	0,205	3,13
DC408	0101	Velika Gorica (DC30)	2,922		0	2,922
DC430	0001	Kosnica (D30) - Zračna luka Franjo Tuđman	2,108	P1-0001	0,25	2,358
DC430	0101	Velika Gorica (Žračna luka Franjo Tuđman) - Selnica Šćitarjevska (D30)	2,105		0	2,105
DC536	0001	Čvorište Buševec (A11) - Buševec (D30)	1,009	0101, 0201, P1-0001	0,244	1,253
DC540	0001	Beloslavec (gr.KZŽ) - Komin (D3)	9,522	0101, P2-0001	0,12	9,642
DC543	0001	Klinča Sela (D1) – čvorište Donja Zdenčina (A1)	2,324	0101	0,059	2,383
DC544	0001	Čvorište Farkaševac (D12) - Bolč	7,374	0101	0,015	7,389
DC546	P1-0002	Novo Selo Žumberačko - gr. rep. Slovenije	1,987		0	1,987

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)
DC546	0001	Bregana (DC231) - Novo Selo Žumberačko	22,838		0	22,838
DC546	0002	Gornja Vas (gr. NC Samobor) - Kostanjevac (ŽC3273)	13,075		0	13,075
DC546	0002	Novo Selo Žumberačko - Gornaj Vas (gr. NC Jastrebarsko)	6,83		0	6,83
DC546	0003	Kostanjevac (ŽC3273) - Krašić - Draganić (gr. TI Karlovac)	17,494		0	17,494
DC683	0001	Kalje (DC546 - DC546)	3,845		0	3,845
Ukupno:						378,442

Krapinsko-zagorska:

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)
DC1	0001	Gornji Macelj (A2/ŽC2258) - Đurmanec (DC207)	8,425	0101, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001	0,491	8,916
DC1	0002	Đurmanec (DC207) - Krapina (DC206)	5,108	P1-0002, P11-0002, P14-0002, P2-0002, P3-0002, P4-0002, P6-0002, P7-0002, P8-0002, P9-0002	2,28	7,388
DC1	0003	Krapina (DC206) - Velika Ves (A2)	2,848	0103, P1-0003, P2-0003	0,269	3,117
DC1	0003	Krapina (DC 206)- Velika Ves (A2)	0,107		0	0,107
DC1	0004	Velika Ves (A2) - Sveti Križ Začretje (DC35)	7,316	0104, P1-0004, P2-0004, P3-0004, P4-0004	0,738	8,054
DC1	0004	Velika Ves (A2)-Sveti Križ Začretje (DC35)	7,316	0104, P1-0004, P2-0004, P3-0004, P4-0004	0,738	8,054
DC1	0005	Sveti Križ Začretje (A2) - Zabok (Ž2195)	6,351	0105, P1-0005, P2-0005	0,187	6,538
DC1	0005	Sveti Križ Začretje (DC35) - Zabok (ŽC2264)	6,351	0105, P1-0005, P2-0005	0,187	6,538
DC1	0006	Zabok (Ž2195) - Gubaševo (D205)	3,454	0106, 0206, 0306, 0406, 0506, P10-0006, P1-0006, P11-0006, P12-0006, P13-0006, P2-0006, P3-0006, P4-0006, P5-0006, P6-0006, P7-0006, P8-0006, P9-0006	1,01	4,464

Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)
DC1	0006	Zabok (ŽC2264) - Pavlovec Zabočki (DC205/ŽC2267)	3,454	0106, 0206, 0306, 0406, 0506, P10-0006, P1-0006, P11-0006, P12-0006, P13-0006, P2-0006, P3-0006, P4-0006, P5-0006, P6-0006, P7-0006, P8-0006, P9-0006	1,01	4,464
DC1	0007	Gubaševo (D205) - čvorište Žeinci (A2)	5,082	0207, 0307, P1-0007, P18-0007, P19-0007, P20-0007, P2-0007, P21-0007, P22-0007, P23-0007, P3-0007, P4-0007, P5-0007, P6-0007, P7-0007, P8-0007, P9-0007	1,535	6,617
DC1	0107	Ivanec Bistranski (A2) - Novaki Bistranski (ŽC2262)	2,567		0	2,567
DC24	0001	Zlatar Bistrica (D29) - Pece (DC24)	22,399		0	22,399
DC29	0001	Novi Golubovec (D35) - Zlatar Bistrica	36,005	0101, 0201, 0301, 0401, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001	0,486	36,491
DC29	0001	Zlatar Bistrica (DC29)- Zlatar Bistrica (DC24)	0,991		0	0,991
DC35	0002	Kuzminec - Švaljkovec (D1)	9,346	0102	0,052	9,398
DC35	0002	Očura-Kuzminec	6,416		0	6,416
DC35	0002	Švaljkovec (ŽC2160) - Sveti Križ Začretje (DC1)	2,954		0	2,954
DC74	0001	Đurmanec (D207) - Šaša	11,385		0	11,385
DC205	0001	GP Razvor (granica RH/R Slovenija) - Gubaševo (D1)	24,493	0101, 0201, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001	1,027	25,52
DC206	0001	GP Hum na Sutli (gr. R. Slov.) -MP Pregrada	14,233	0101, P1-0001	0,133	14,366
DC206	0001	Pregrada - Valentinovo (D507)	1,771		0	1,771
DC206	0002	Valentinovo (D507) - Krapina (D1)	12,712	0102, 0202, P1-0002, P2-0002, P3-0002	0,195	12,907


Broj (oznaka) ceste	Broj glavne dionice	Naziv (relacija) glavne dionice	Duljina glavne dionice (km)	Ostale dionice	Duljina ostalih dionica (km)	Duljina ukupno (km)
DC207	0001	Hum na Sutli (D206) - Đurmanec (D1)	14,515	0101, P1-0001, P2-0001, P3-0001	0,376	14,891
DC229	0001	Hum Na Sutli (D206) - Mali Tabor - Luke Poljanske - Miljana - Razvor (D205)	26,741	P1-0001, P2-0001, P3-0001	0,456	27,197
DC233	0002	Mali Tabor - Hum na Sutli (D206)	1,923		0	1,923
DC307	0001	Gubaševo (D1) – Oroslavje – D. Stubica - Marija Bistrica (D29)	23,794	0101, 0201, 0301, 0401, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001	0,721	24,515
DC434	0001	Bobovje - Mihaljekov Jarek (D1)	0,623	0101	0,032	0,655
DC507	0001	Bušin (D206) - Klokovec - Jezero Klanječko (D205)	15,638	0101, P1-0001, P2-0001, P3-0001	0,507	16,145
DC540	0001	Konjščina (DC24) - Beloslavec	5,525	P1-0001	0,04	5,565
Ukupno:						302,313

7. RADNI ITINERARI VOZILA U ZIMSKOJ SLUŽBI

U nastavku se daje kartografski i tablični prikaz radnih itinerara vozila u zimskoj službi, prema mjestima pripravnosti za svaku razinu prednosti:

7.1. I razina prednosti

7.1.1. Mjesto pripravnosti: Vrbovec

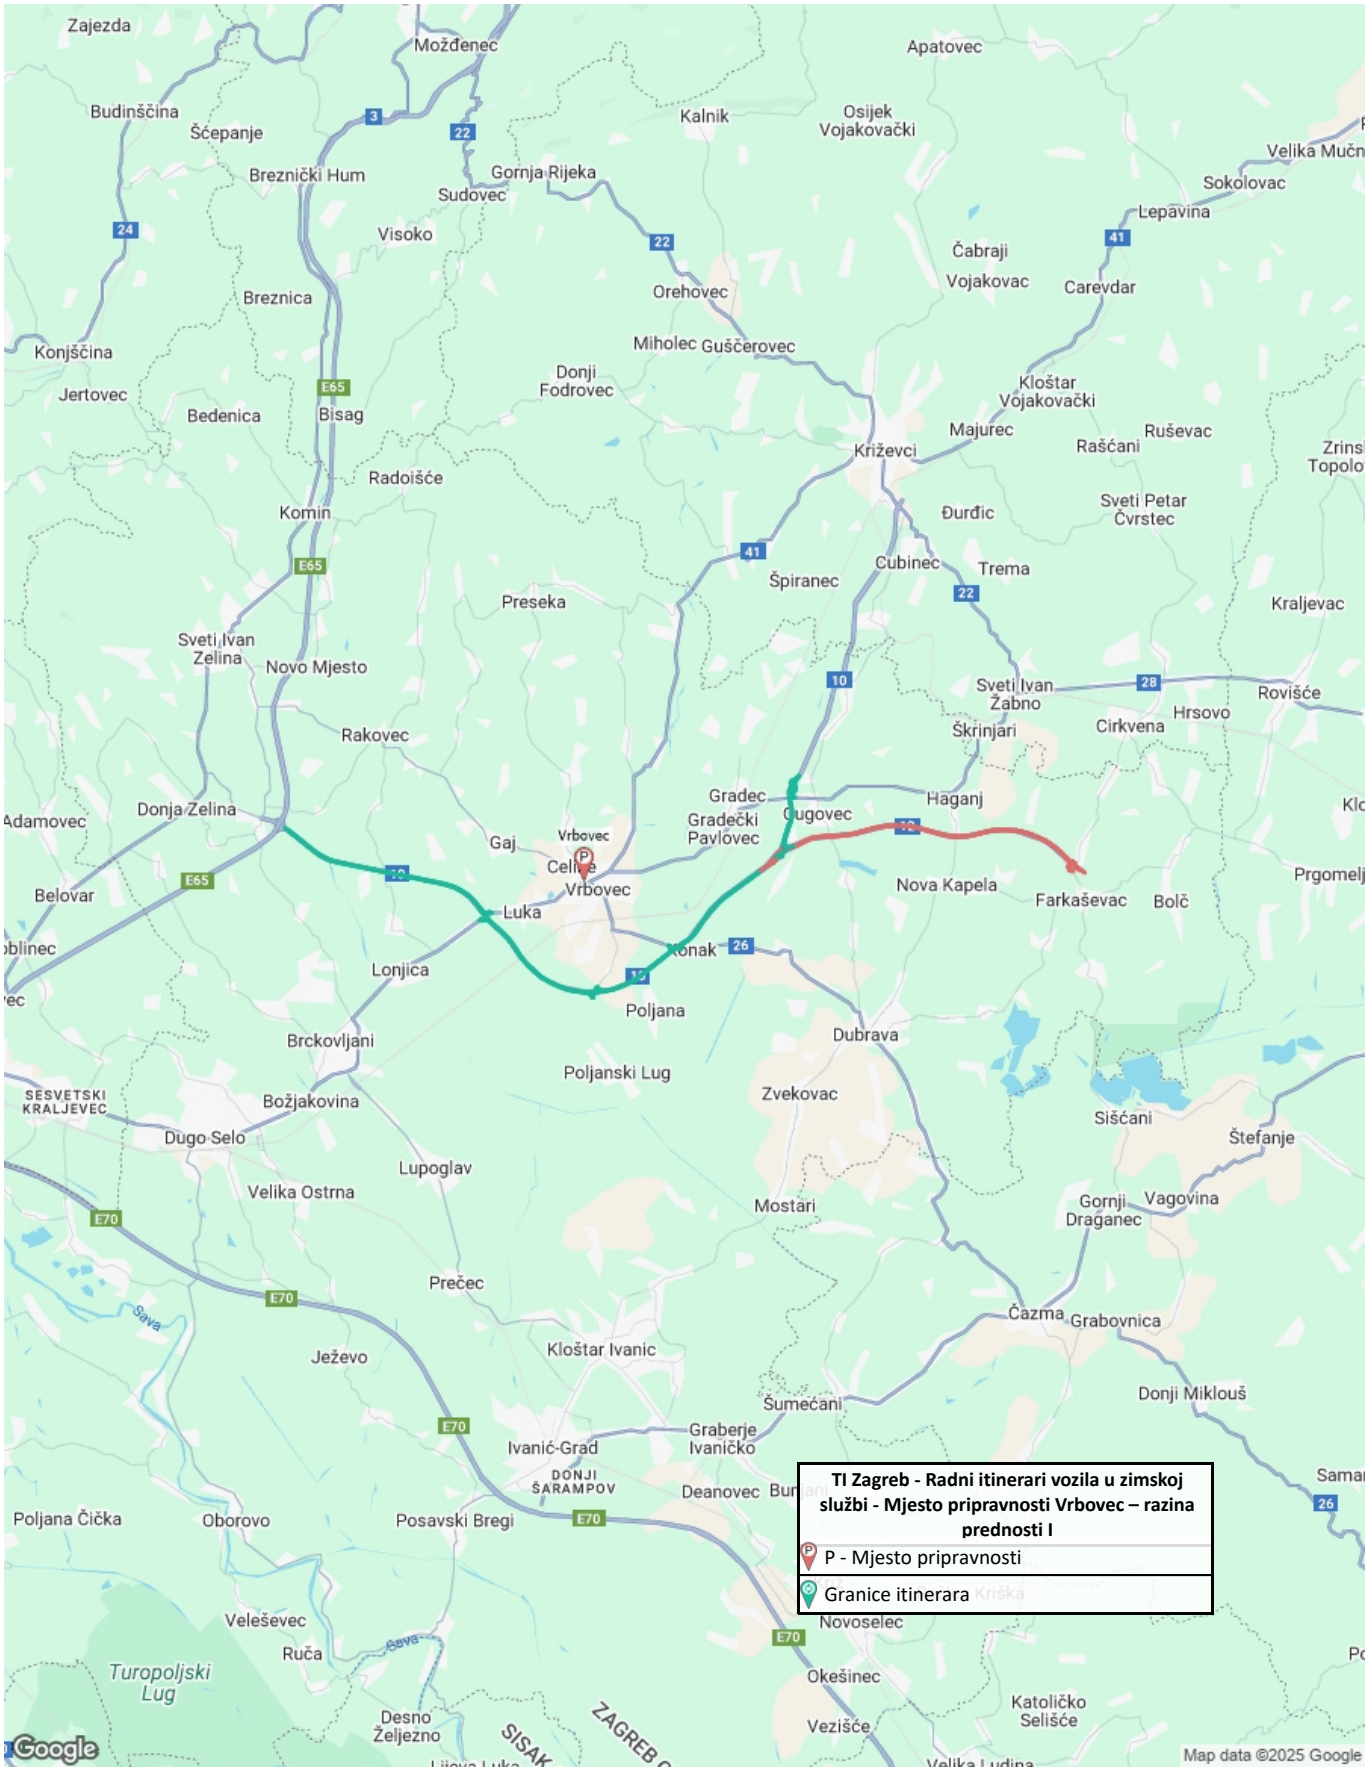

Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG6357AZ, ZG5345EE, ZG6532GG, ZG7473HU, ZG6032IV	Vrbovec2-Farkaševac	DC12	Farkaševac,krak	P1-0001	0,727	1,454
			Farkaševac,krak	P3-0001	0,684	1,368
			Čvorište Vrbovec 2 (D10) - čvorište Farkaševac (D544)	0001, P2-0001, P4-0001	12,583	25,166
			Zvonik (D544/Ž2231) - Haganj - Potočec (D10)	0101	12,4	24,8
ZG9355EN, ZG6357AZ, ZG5345EE, ZG5201GB, ZG6032IV	Čvorište Sv. Helena (A4)-Čvorište Vrbovec 1-Čvorište Gradec (DC28)	DC10	Greda,krak	P1-0002	0,509	1,018
			Cugovec krak	P1-0004	0,76	1,52
			Cugovec krak	P4-0004	0,551	1,102
			Cugovec krak	P5-0004	0,812	1,624
			Grabrić krak	P8-0003	0,926	1,852
			Grabrić krak	P9-0003	0,62	1,24

Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG9355EN, ZG6357AZ, ZG5345EE, ZG5201GB, ZG6032IV	Čvorište Sv. Helena (A4)-Čvorište Vrbovec 1-Čvorište Gradec (DC28)	DC10	Sveta Helena: Čvorište Sv. Helena (A4) - čvorište Vrbovec1	0001	7,626	15,252
			Čvorište Vrbovec1 - čvorište Dubrava (D26)	0002, P10-0002, P11-0002, P12-0002, P13-0002, P14-0002, P15-0002, P16-0002, P2-0002, P3-0002, P4-0002, P5-0002, P6-0002, P7-0002, P8-0002, P9-0002	11,356	22,712
			Čvorište Dubrava (D26) - čvorište Gradec (D28)	0003, P1-0003, P2-0003, P3-0003, P4-0003, P5-0003, P6-0003, P7-0003	9,054	18,108
			Cugovec (D28/Ž3052) - Križevci (D22)	0004, P2-0004, P3-0004, P6-0004	1,07	2,14
			Greda (Ž3034) - Sveta Helena (A4)	0101	8,143	16,286
			Naselje Stjepana Radića (D26/Ž3288) - Greda (Ž3034)	0102	8,135	16,27
			Lubena (D28/Ž3052) - Naselje Stjepana Radića (D26/Ž3288)	0103	7,827	15,654
Ukupno:					**83,783**	**167,566**

7.1.2. Mjesto pripravnosti: Zabok




Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG6443JF, ZG7150DO	Brza cesta Zabok - Bedekovčina - Zlatar Bistrica	DC14	čvor Bračak,krak	P1-0001	0,666	1,332
			Bedekovčina,krak	P1-0002	0,597	1,194
			Bedekovčina,krak	P11-0002	0,58	1,16
			čvor Bračak,krak	P12-0001	0,902	1,804
			Hum Bistrički,krak	P12-0002	0,575	1,15
			čvor Bračak,krak	P13-0001	0,972	1,944
			Poznanovec	P15-0002	1,64	3,28
			Poznanovec,krak	P17-0002	0,57	1,14
			Poznanovec,krak	P2-0002	0,647	1,294
			Zlatar Bistrica,krak	P21-0002	0,524	1,048
			Zlatar Bistrica,krak	P23-0002	0,774	1,548
			Zlatar Bistrica,krak	P24-0002	0,628	1,256
			Zlatar Bistrica,krak	P3-0002	0,582	1,164
			čvor Bračak,krak	P4-0001	0,865	1,73
			Bedekovčina,krak	P4-0002	1,134	2,268
			čvor Bračak,krak	P7-0001	0,525	1,05
			čvor Bračak,krak	P8-0001	0,778	1,556

Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG6443JF, ZG7150DO	Brza cesta Zabok - Bedekovčina - Zlatar Bistrica	DC14	Mokrice (D307) - Dubrava Zabočka - Bedekovčina	0001, P10-0001, P11-0001, P2-0001, P3-0001, P5-0001, P6-0001, P9-0001	9,829	19,658
			Bedekovčina - Dubovec - Selnica - Podgrađe (D29)	0002, P13-0002, P14-0002, P16-0002, P18-0002, P19-0002, P20-0002, P22-0002, 0102	9,888	19,776
			Dubrava Zabočka - Andraševec	0101	1,019	2,038
			Mokrice (D307)	0201	0,648	1,296
			Selnica	0202	1,122	2,244
			Selnica - Dubovec	0302	1,224	2,448
			Vučak - Bedekovčina	0402	1,73	3,46
Ukupno:					**38,419**	**76,838**


7.2. II razina prednosti

7.2.1. Mjesto pripravnosti: Goričica

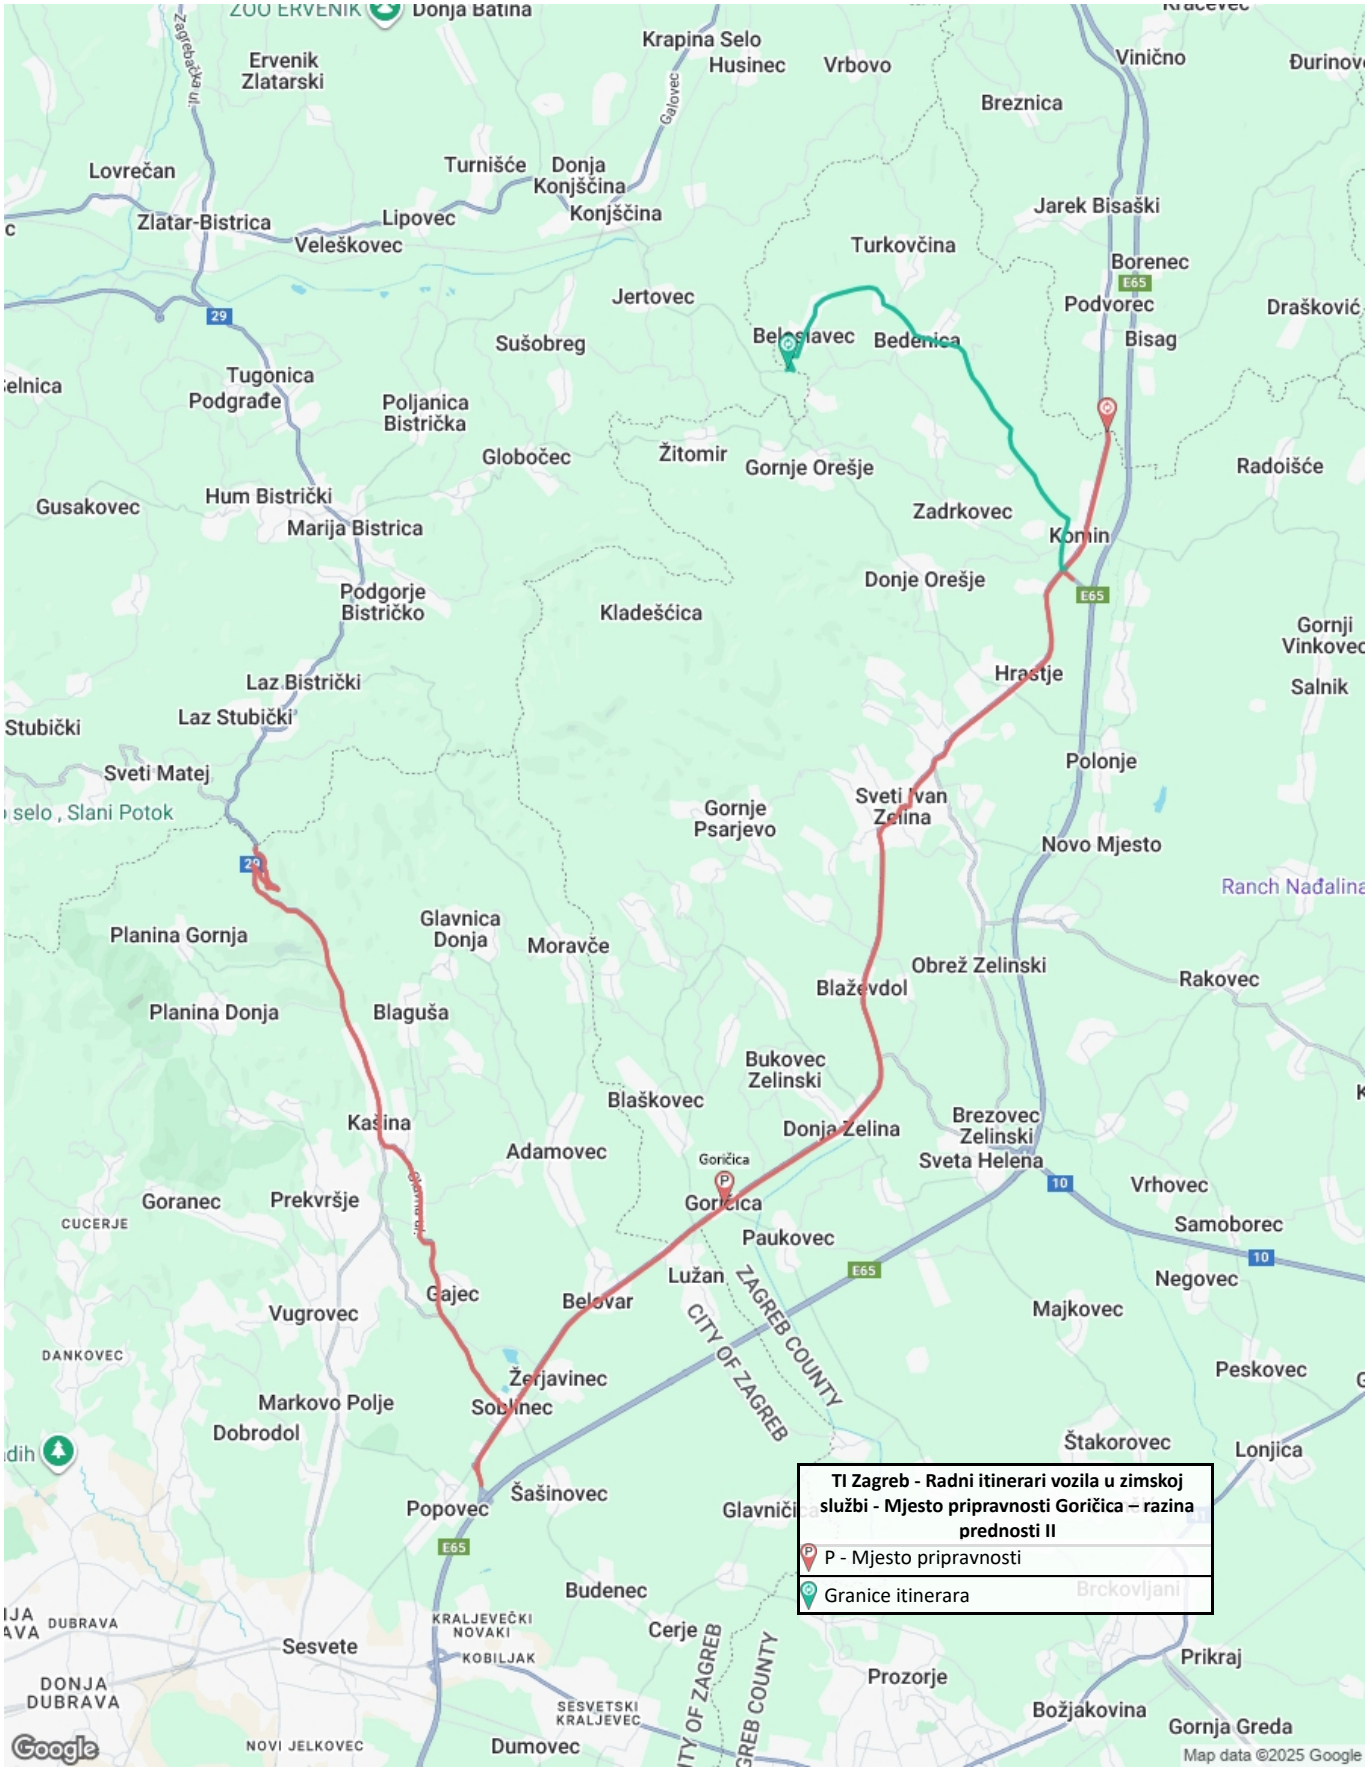


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG1591IC, ZG5201GB, ZG5202GB	Dubovec(g.ž.)-Sveti Ivan Zelina-čvorište Popovec (A4)	DC3	Čvorište Breznički Hum (A4) - Čvorište Komin (A4/D540)	0008, P1-0008, P2-0008	2,92	5,84
			Čvorište Komin (A4/D540) - Donja Zelina (Ž3016)	0009, P1-0009, 0109	10,303	20,606
			Donja Zelina (Z3016) - Čvorište Popovec (A4)	0010, P1-0010, P2-0010, 0110	10,967	21,934
	Laz Bistrički (gr. KZŽ)-Soblinec (A3)	DC29	Laz Bistrički (gr. KZŽ)-Soblinec (A3)	0001	13,176	26,352
ZG5201GB, ZG5202GB, ZG5961JN	gran. Zagrebačke županije-Komin (D3)	DC540	Beloslavec (gr.KZŽ) - Komin (D3)	0001, 0101, P2-0001	9,642	19,284
Ukupno:					**47,008**	**94,016**

7.2.2. Mjesto pripravnosti: Velika Gorica

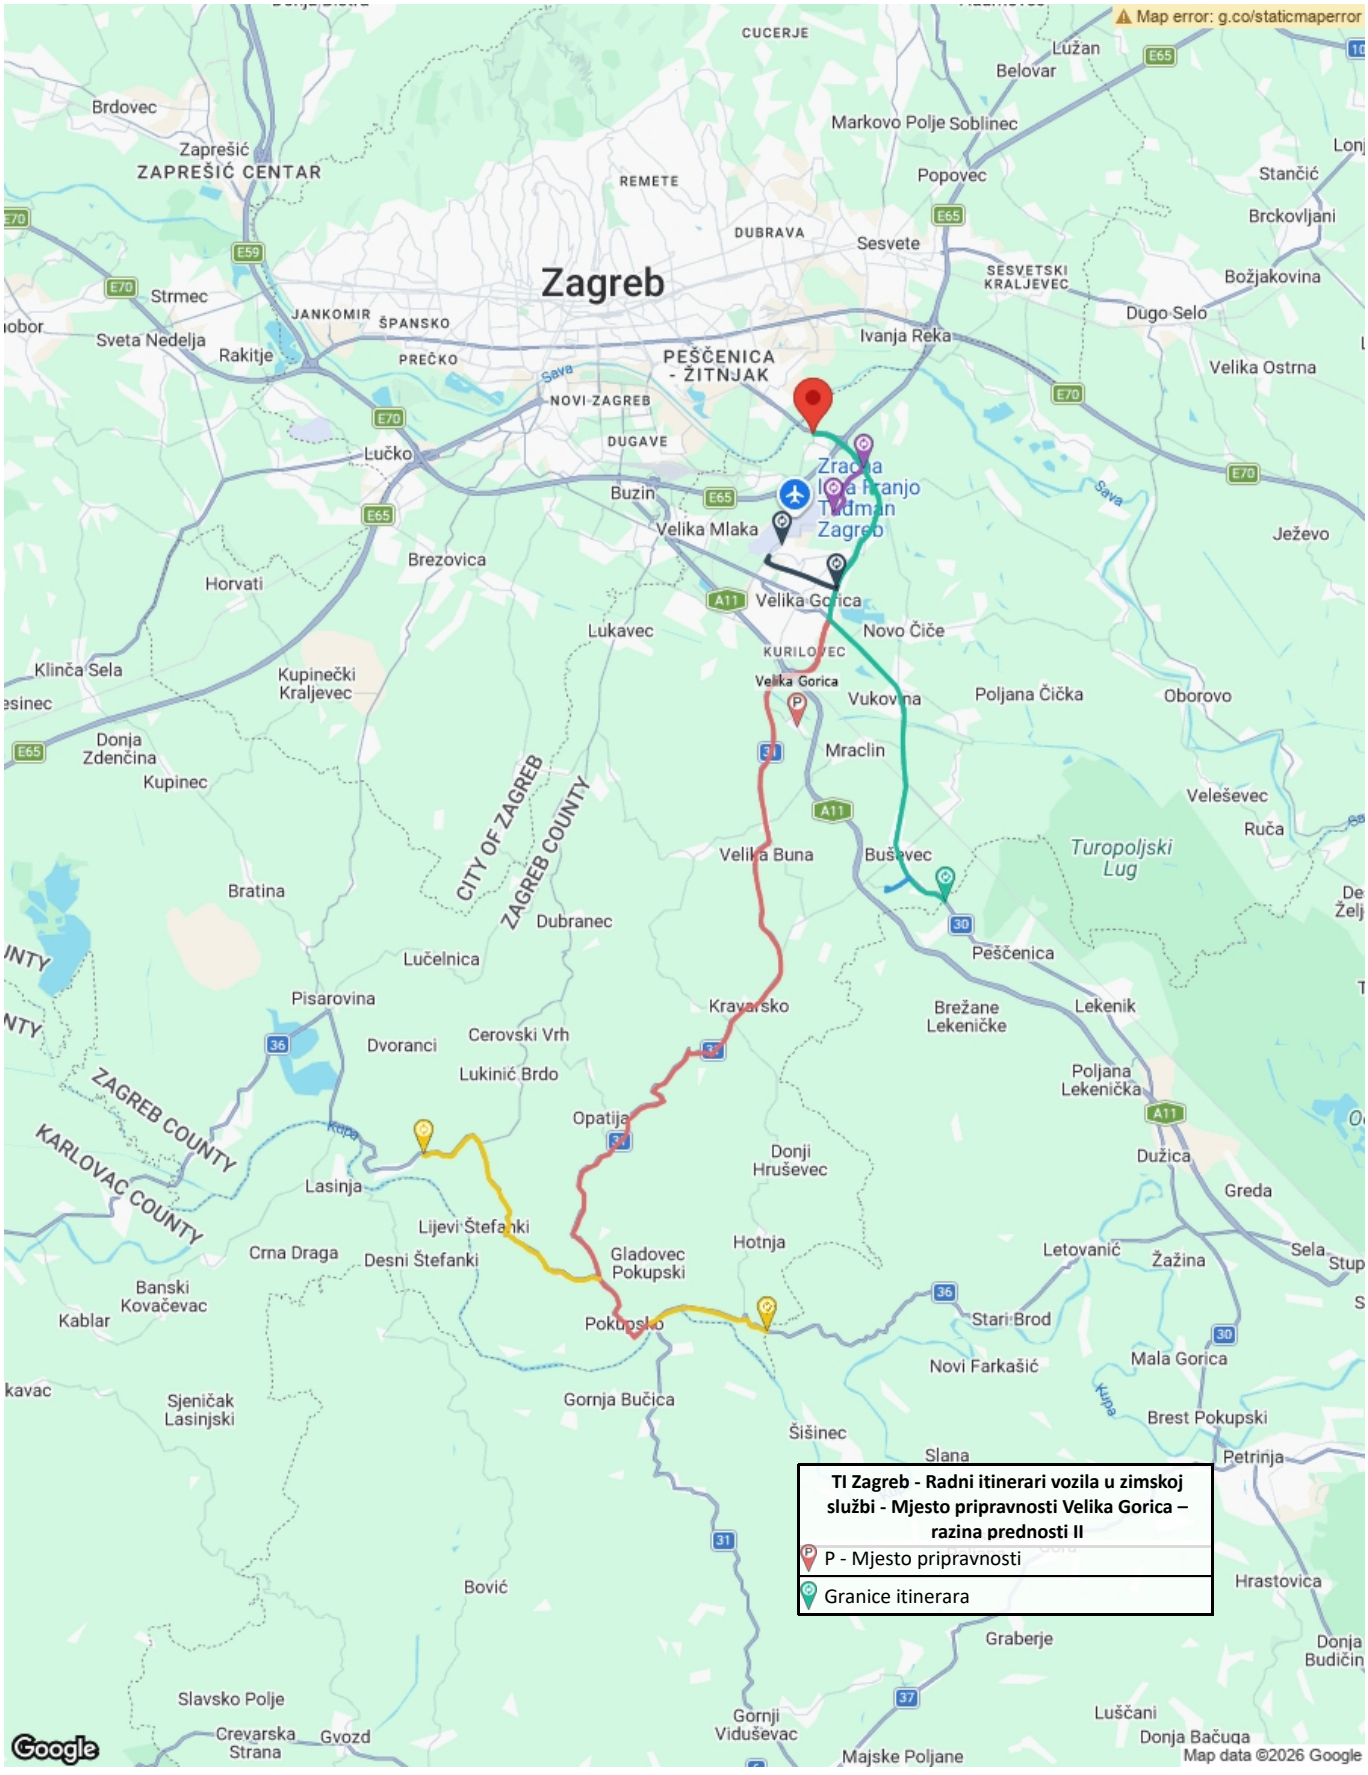


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG5931DI, ZG2003IB, ZG1946KN	Velika Gorica(DC30)-Pokupsko	DC31	V. Gorica (D30) - Pokupsko (D36)	0001	31,288	62,576
			Gladovec Pokupski (D36) - Slatina Pokupska (gr. SMŽ)	0002, 0202	3,819	7,638
			Velika Gorica (D30)	0101	3,383	6,766
ZG5931DI, ZG6031IV, ZG2986KK	Velika Kosnica-Velika Gorica-Ogulinec (g.ž.)	DC30	Velika Kosnica (NC311670) - Velika Gorica (D31)	0001, P1-0001, P2-0001, P4-0001, P7-0001	9,379	18,758
			Velika Gorica (D31) - Žažina (D36)	0002, P1-0002	11,98	23,96
			Velika Gorica (D31) - Velika Kosnica (nerazvrstana cesta)	0101	8,211	16,422
ZG5931DI, ZG7082HU, ZG2003IB	Čvoriušte Buševac (A11)-Buševac(DC30)	DC536	Čvorište Buševec (A11) - Buševec (D30)	0001, 0101, 0201, P1-0001	1,253	2,506
ZG5931DI, ZG8141IA, ZG5444JI	DC30- Zračna luka dr. Franjo Tuđman	DC430	Kosnica (D30) - Zračna luka Franjo Tuđman	0001, P1-0001	2,358	4,716
			Velika Gorica (Žračna luka Franjo Tuđman) - Selnica Šćitarjevska (D30)	0101	2,105	4,21
ZG6031IV, ZG8141IA, ZG5444JI, ZG2986KK	Zračna luka Zagreb-DC30	DC408	Velika Gorica: Zračna luka Zagreb - D30	0001, P1-0001, P2-0001, P3-0001	3,13	6,26
			Velika Gorica (DC30)	0101	2,922	5,844
ZG7082HU, ZG1946KN	Lijevo Sredićko-Pokupsko-Kluka (g.ž.)	DC36	Lijevo Sredićko - Cerje Pokupsko (D31)	0001	10,337	20,674
			Pokupsko - Kluka (g.ž.)	0002	4,848	9,696
Ukupno:					**95,013**	**190,026**

7.2.3. Mjesto pripravnosti: Zaprešić

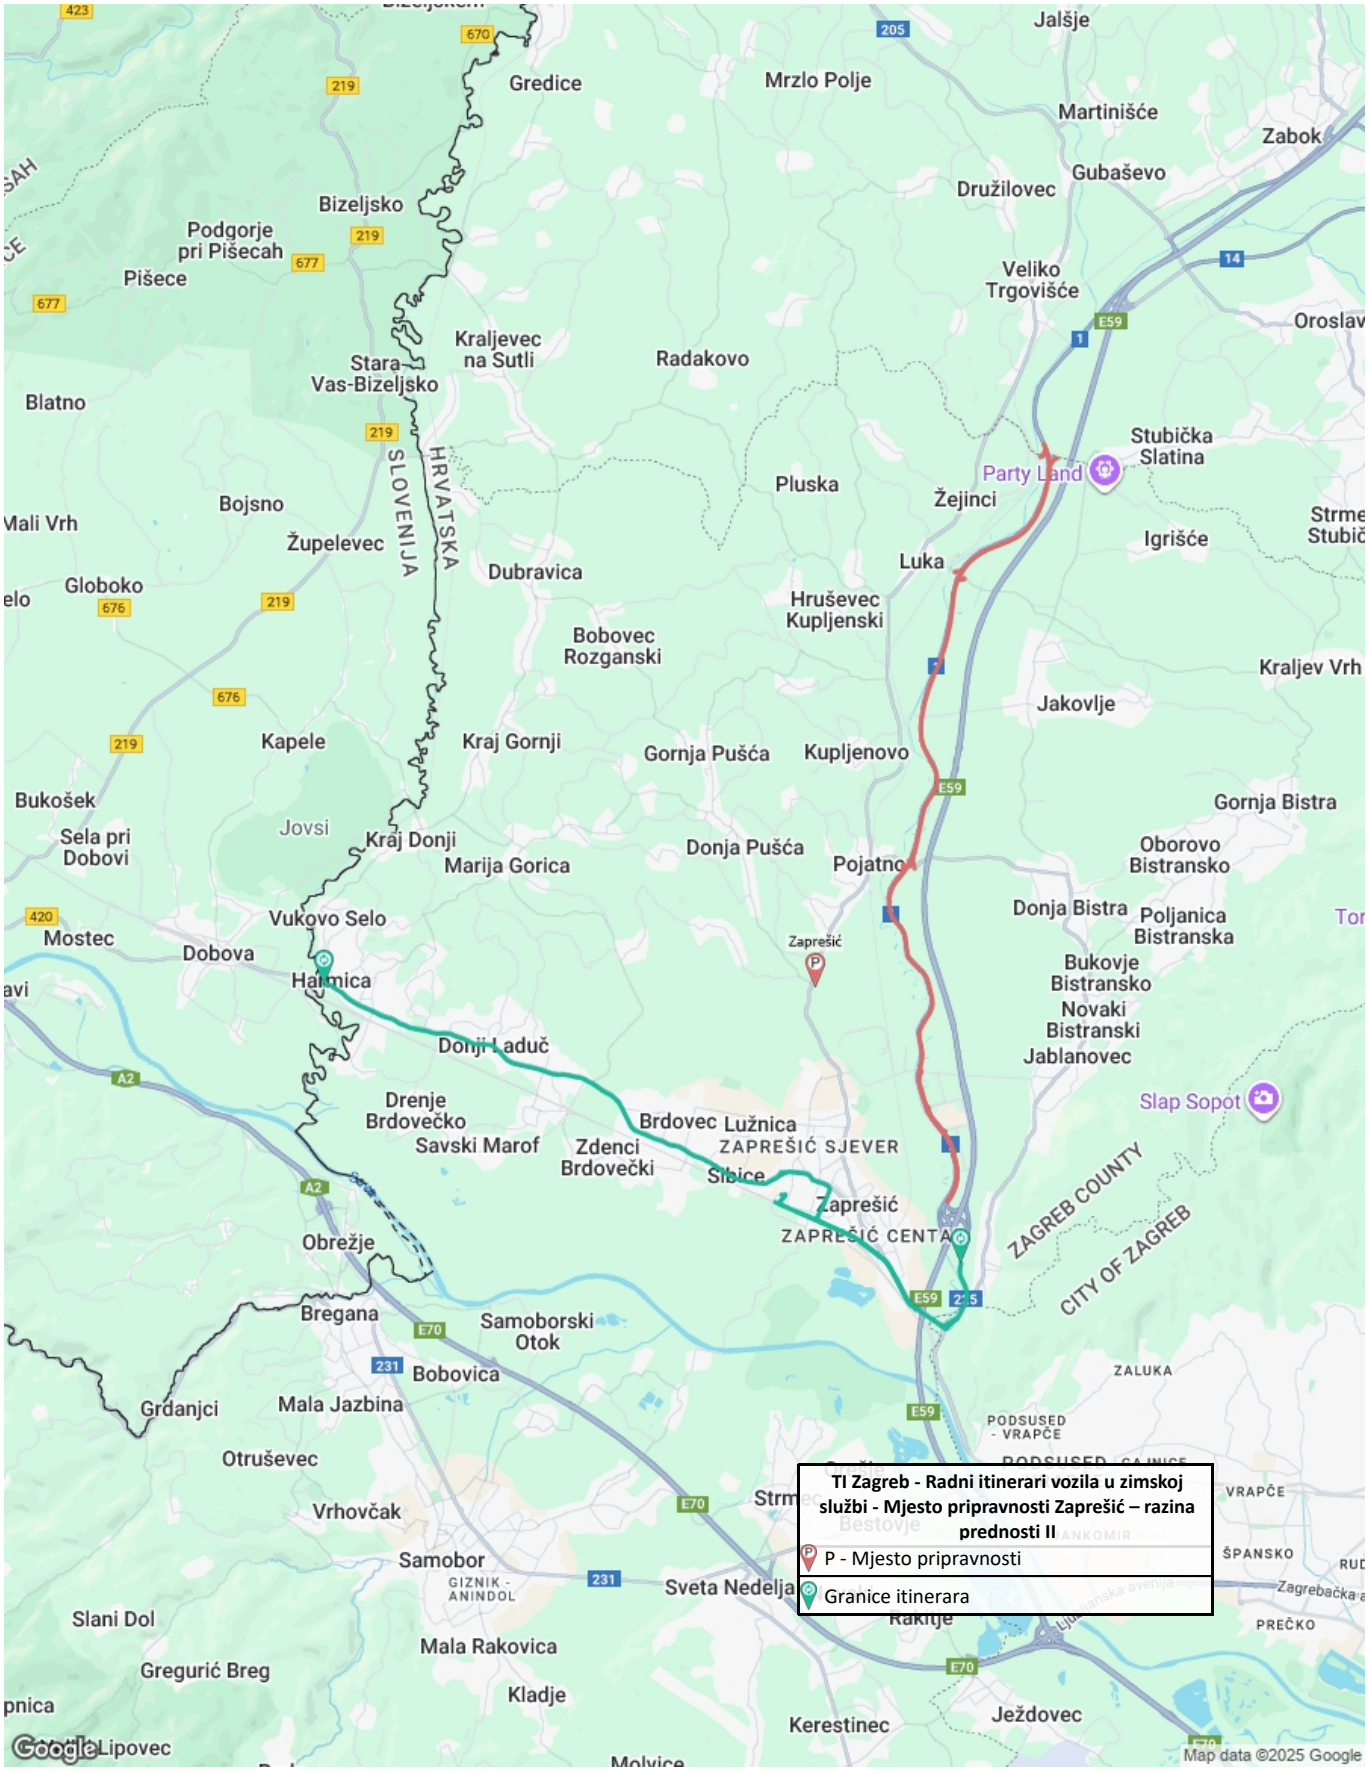


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG3427HA, ZG1947KN	Žeinci (g.ž.)-čvorište Zaprešić	DC1	Čvorište Žeinci (A2) - čvorište Zaprešić (A2)	0007, P4-0007, P6-0007, P7-0007, P9-0007, P10-0007, P11-0007, P12-0007, P15-0007, P16-0007, P17-0007, P18-0007, P19-0007, P20-0007, P21-0007, P22-0007, P23-0007	16,928	33,856
			Ivanec Bistranski (A2) - Novaki Bistranski (Ž2262)	0107	2,567	5,134
ZG4407BO, ZG1947KN	GP Harmica-Zaprešić-čvorište Zaprešić (A2)	DC225	Harmica (GP Harmica (granica RH/Slovenija)) - Brdovec - Ivanec Bistranski (A2)	0001, P11-0001, P1-0001, P12-0001, P13-0001, P14-0001, P15-0001, P16-0001, P17-0001, P18-0001, P2-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001, P9-0001, P10-0001, 0101, 0301, 0501	17,187	34,374
	D225-granica grada Zagreba		granica grada Zagreba - Ivanec Bistranski (A2)	0001	0,632	1,264
	GP Harmica-Zaprešić-čvorište Zaprešić (A2)		Zaprešić	0201	2,518	5,036
Ukupno:					**39,832**	**79,664**

7.2.4. Mjesto pripravnosti: Samobor

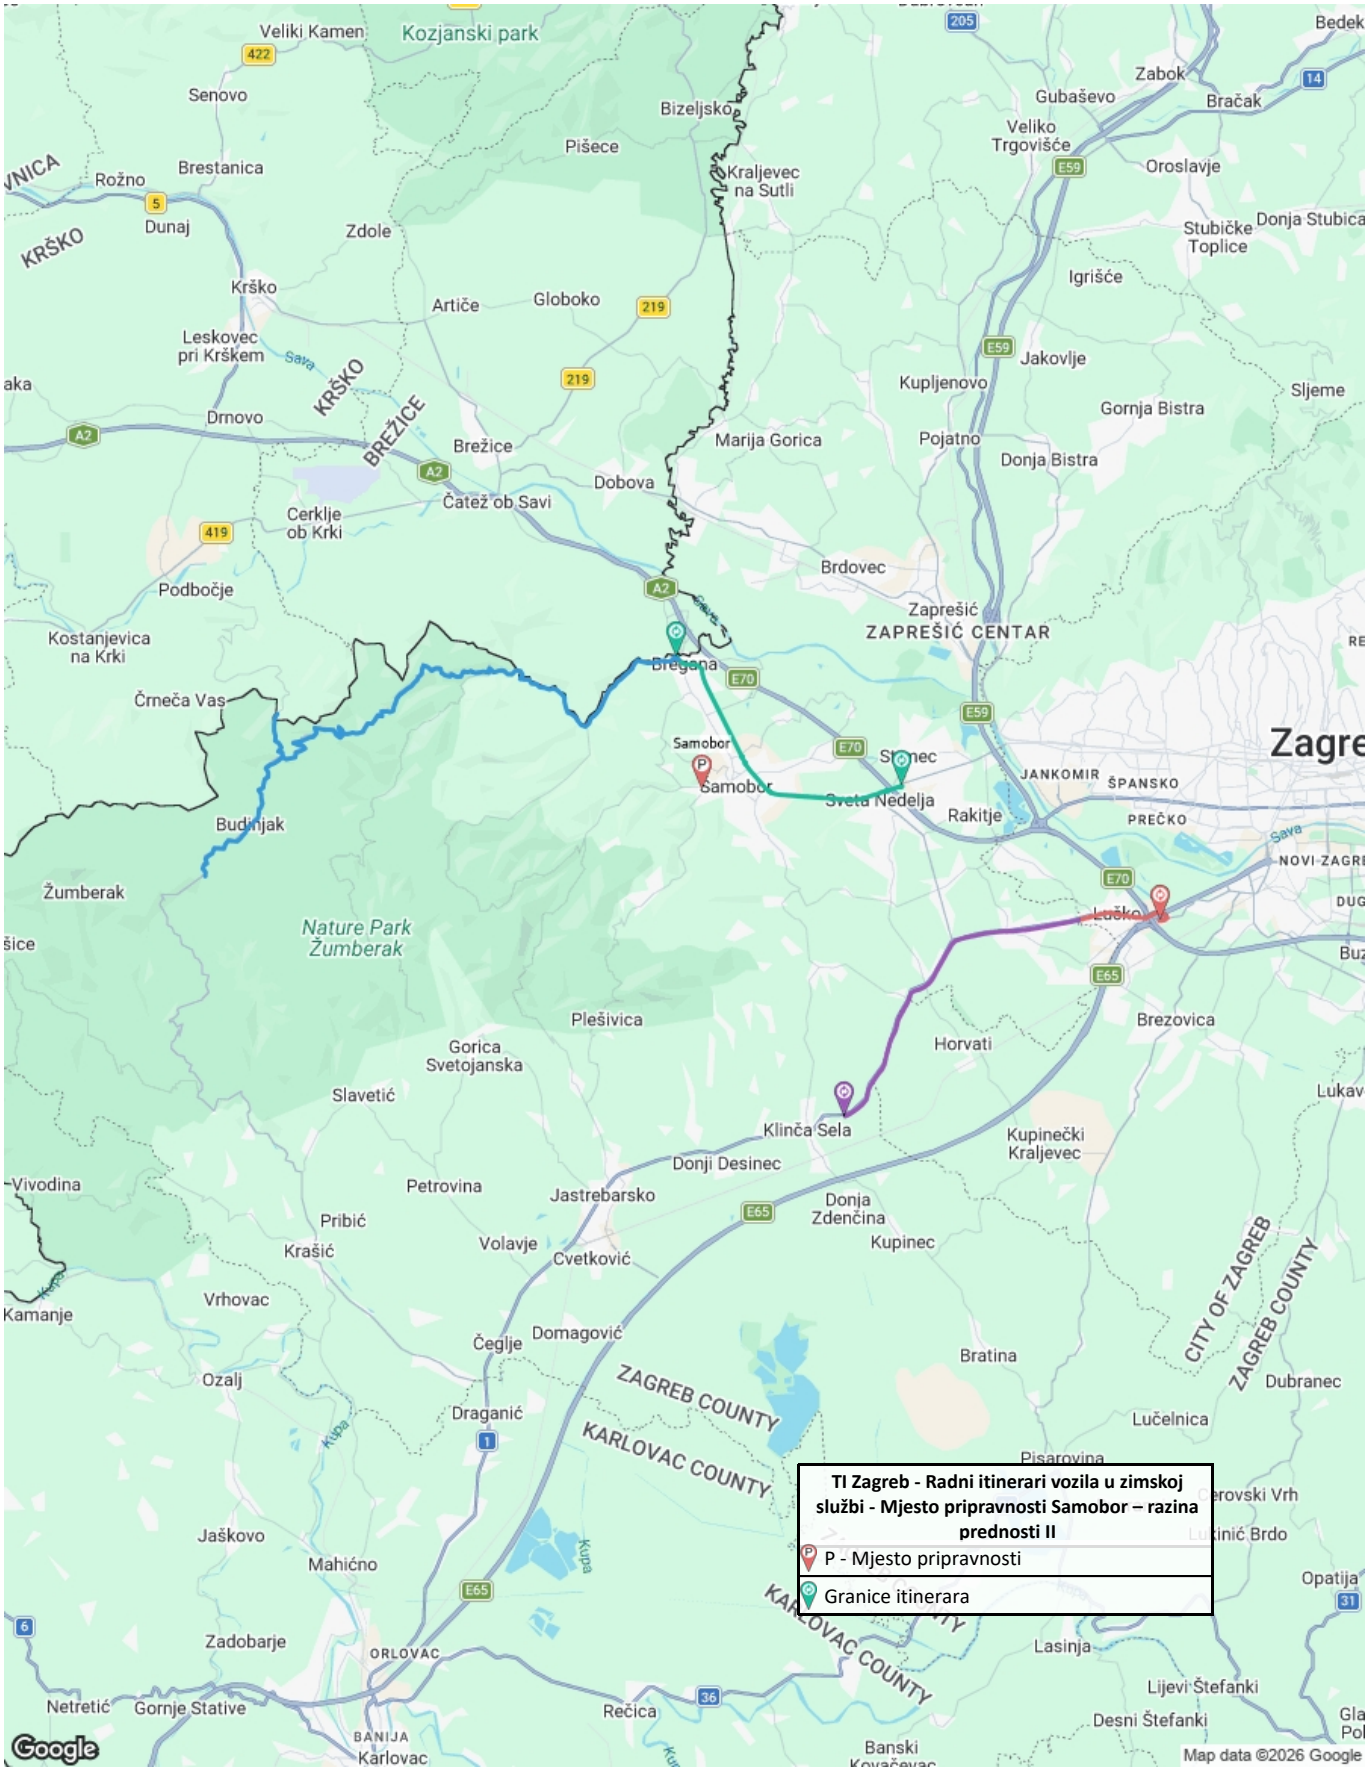


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG2087AB	Čvor Lučko - Stupnik (gr. Grada Zagreba)	DC1	Zagreb (A1) - Stupnik (gr. Grada Zagreba)	0008	3,67	7,34
ZG2087AB, ZG3906IP	GP Bregana Naselje-Samobor-čvorište Sveta Nedjelja (A3)	DC231	G.P. Bregana Naselje (gr. R. Slovenije) - Samobor - čvor Sv. Nedelja (A3)	0001, 0101, 0201, 0301, 0401, 0501, 0601, 0701, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001, P9-0001, P10-0001, P11-0001	11,922	23,844
ZG2611JK, ZG2034JA, ZG1377JL	Bregana-Gornja Vas	DC546	Novo Selo Žumberačko - gr. rep. Slovenije	P1-0002	1,987	3,974
			Bregana (DC231) - Novo Selo Žumberačko	0001	22,838	45,676
			Novo Selo Žumberačko - Gornaj Vas (gr. NC Jastrebarsko)	0002	6,83	13,66
ZG9967FE	Stupnik (gr. Grada Zagreba)-Pavučnjak	DC1	Stupnik (gr. Grada Zagreba) - Pavučnjak	0008	12,059	24,118
Ukupno:					**59,306**	**118,612**

7.2.5. Mjesto pripravnosti: Vrbovec

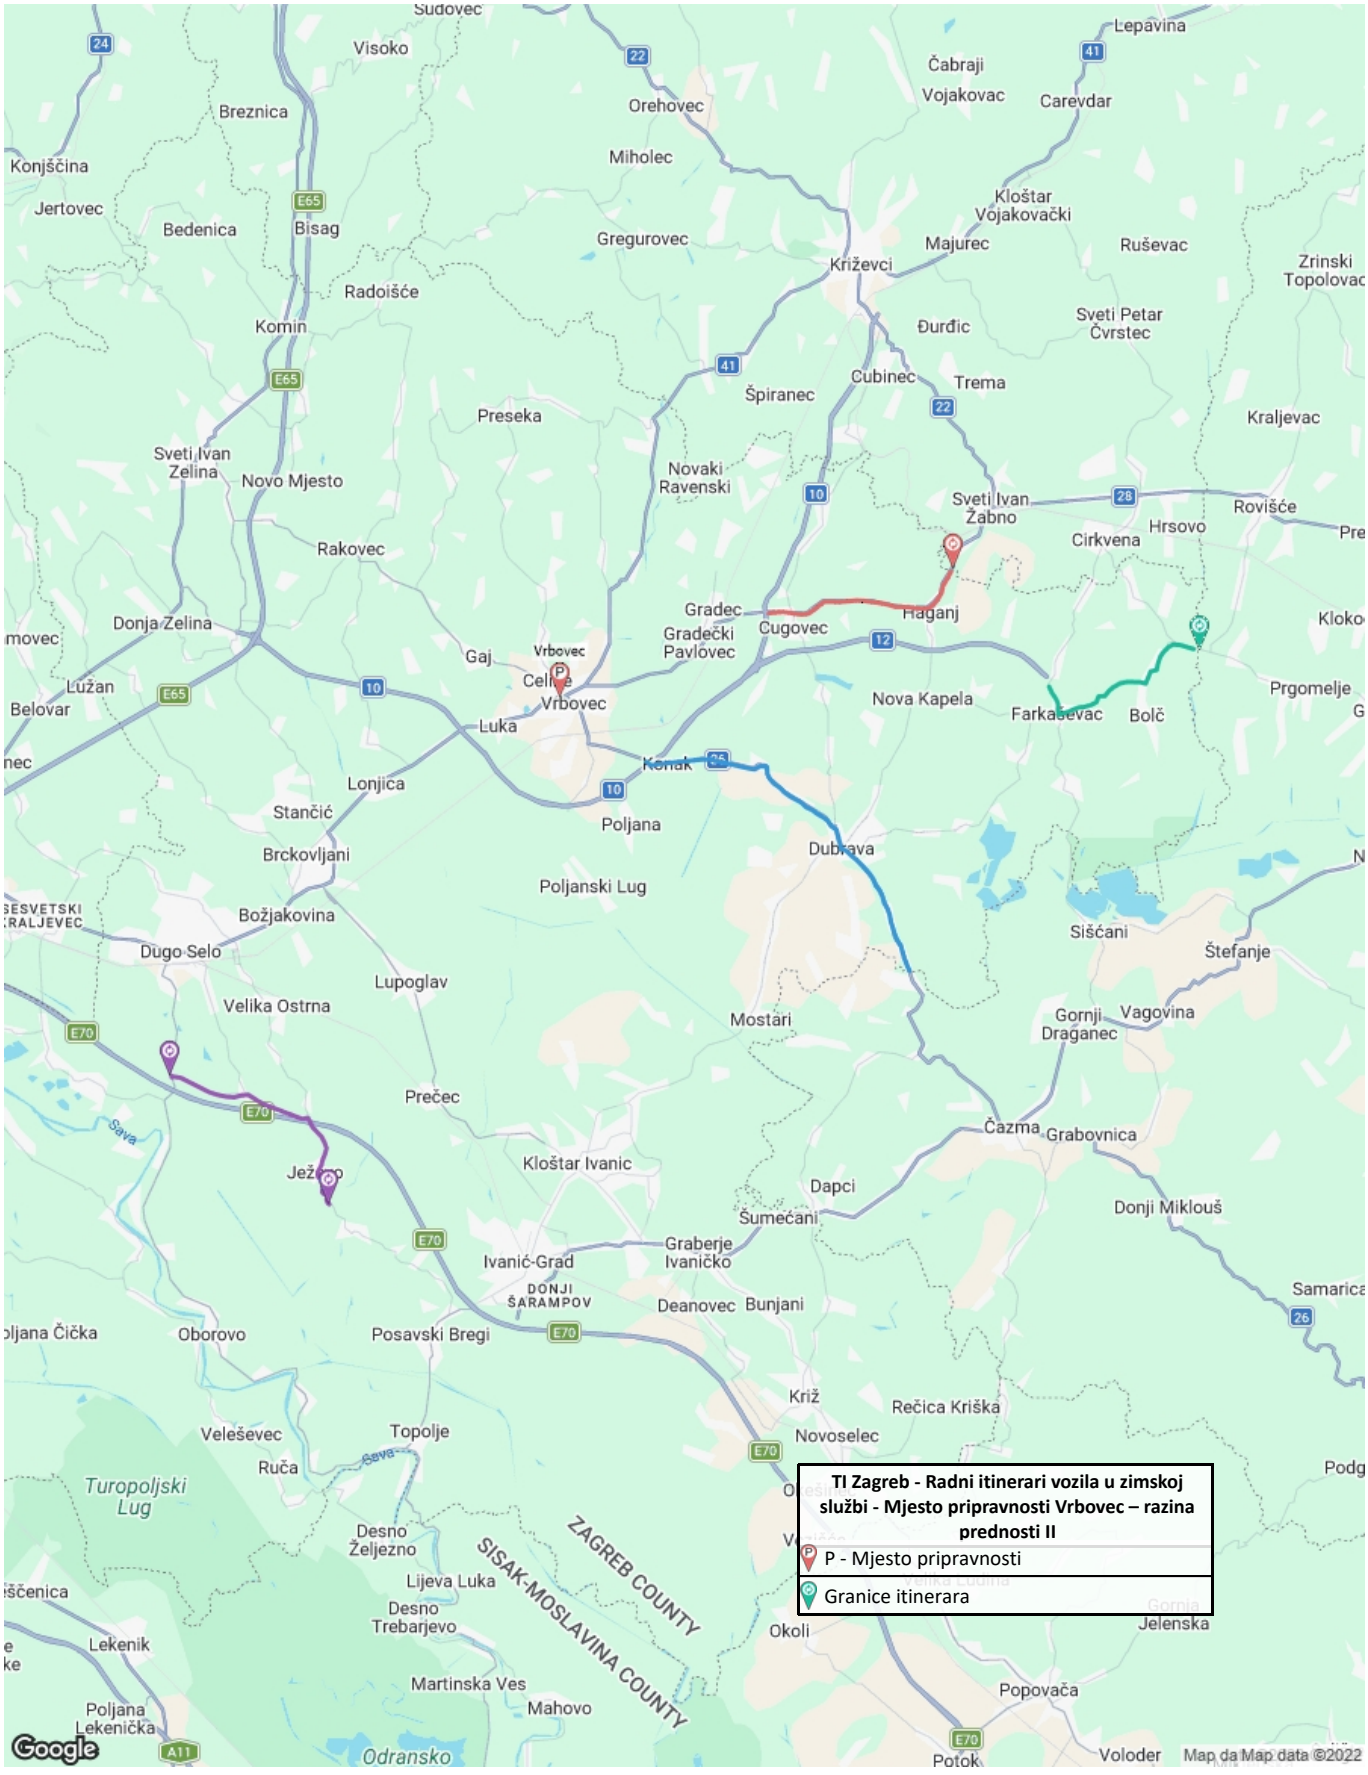


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG4405BO, ZG9148KU	Čvorište Gradec (D10) - Sveti Ivan Žabno (D22)	DC28	Čvorište Gradec (D10) - Haganj (granica NC Križevci)	0001	7,358	14,716
ZG6357AZ, ZG5345EE, ZG5962JN	Čvorište Farkaševac (D12) - Haganj (g.ž.)	DC544	Čvorište Farkaševac (D12) - Bolč	0001, 0101	7,389	14,778
ZG6532GG, ZG5201GB	Čvorište Dubrava (DC10)-Donji Dragičecvci (g.ž.)	DC26	Naselje Stjepana Radića: Čvorište Dubrava (D10/Z3288) - Čazma (D43)	0001, 0201	13,81	27,62
ZG7473HU, ZG5962JN	Trebovec-čvorište Rugvica	DC43	Trebovec - čvorište Rugvica (A3)	0004, 0104	9,025	18,05
Ukupno:					**37,582**	**75,164**

7.2.6. Mjesto pripravnosti: NC Ivanić Grad

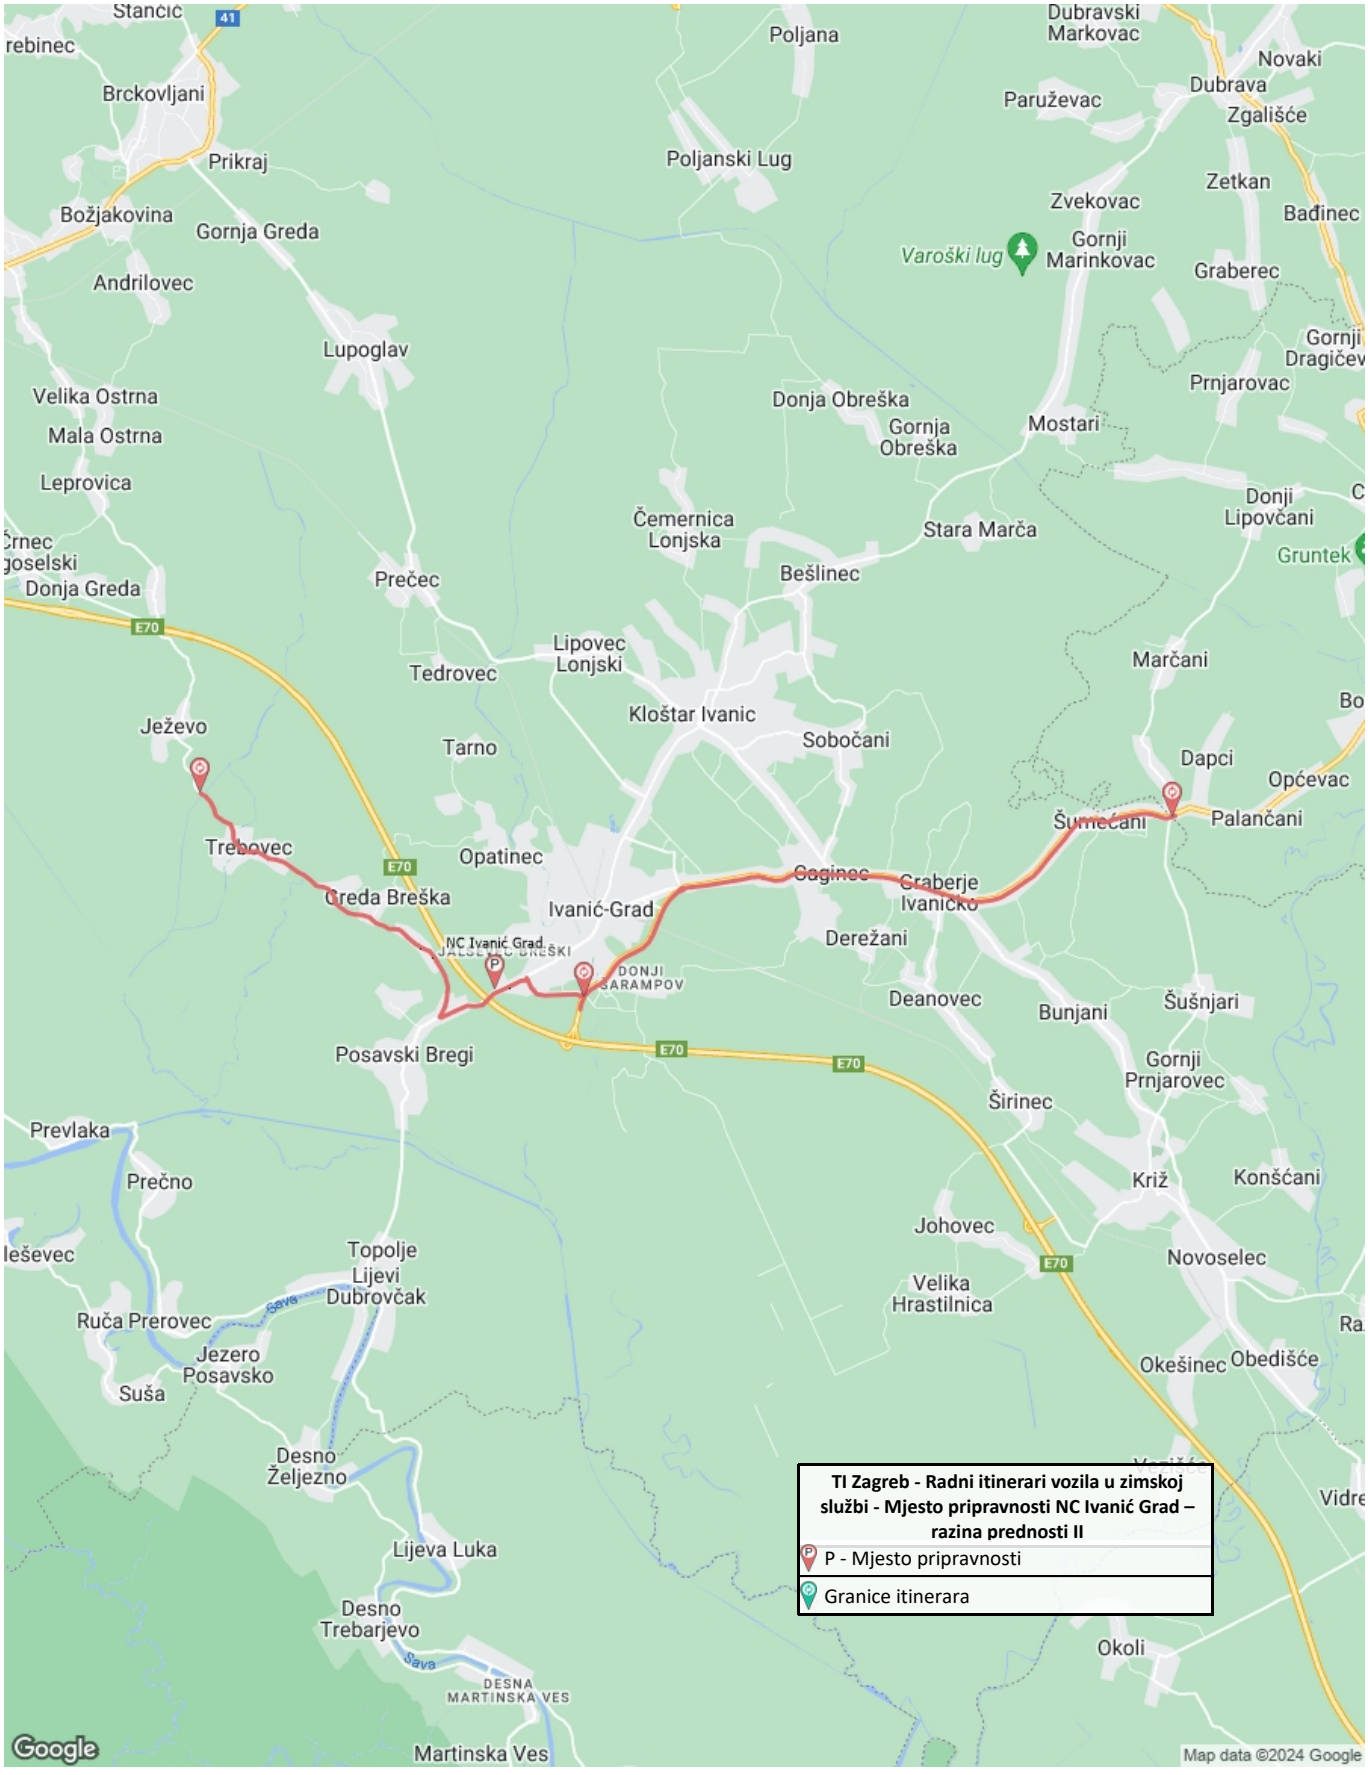


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG4540BK, ZG6893AP	Šumečani (g.ž.)-Ivanić Grad-čvorište Ivanić Grad (A3)	DC43	Šumečani (g.ž.) - Ivanić Grad: Čvor Ivanić Grad (A3)	0003, P3-0003, P4-0003, P5-0003, 0103	12,413	24,826
	Čvorište Ivanić Grad-Trebovec		Čvorište Ivanić Grad (A3) - Trebovec	0004, P1-0004, 0204, 0304	10,053	20,106
Ukupno:					**22,466**	**44,932**

7.2.7. Mjesto pripravnosti: Jastrebarsko

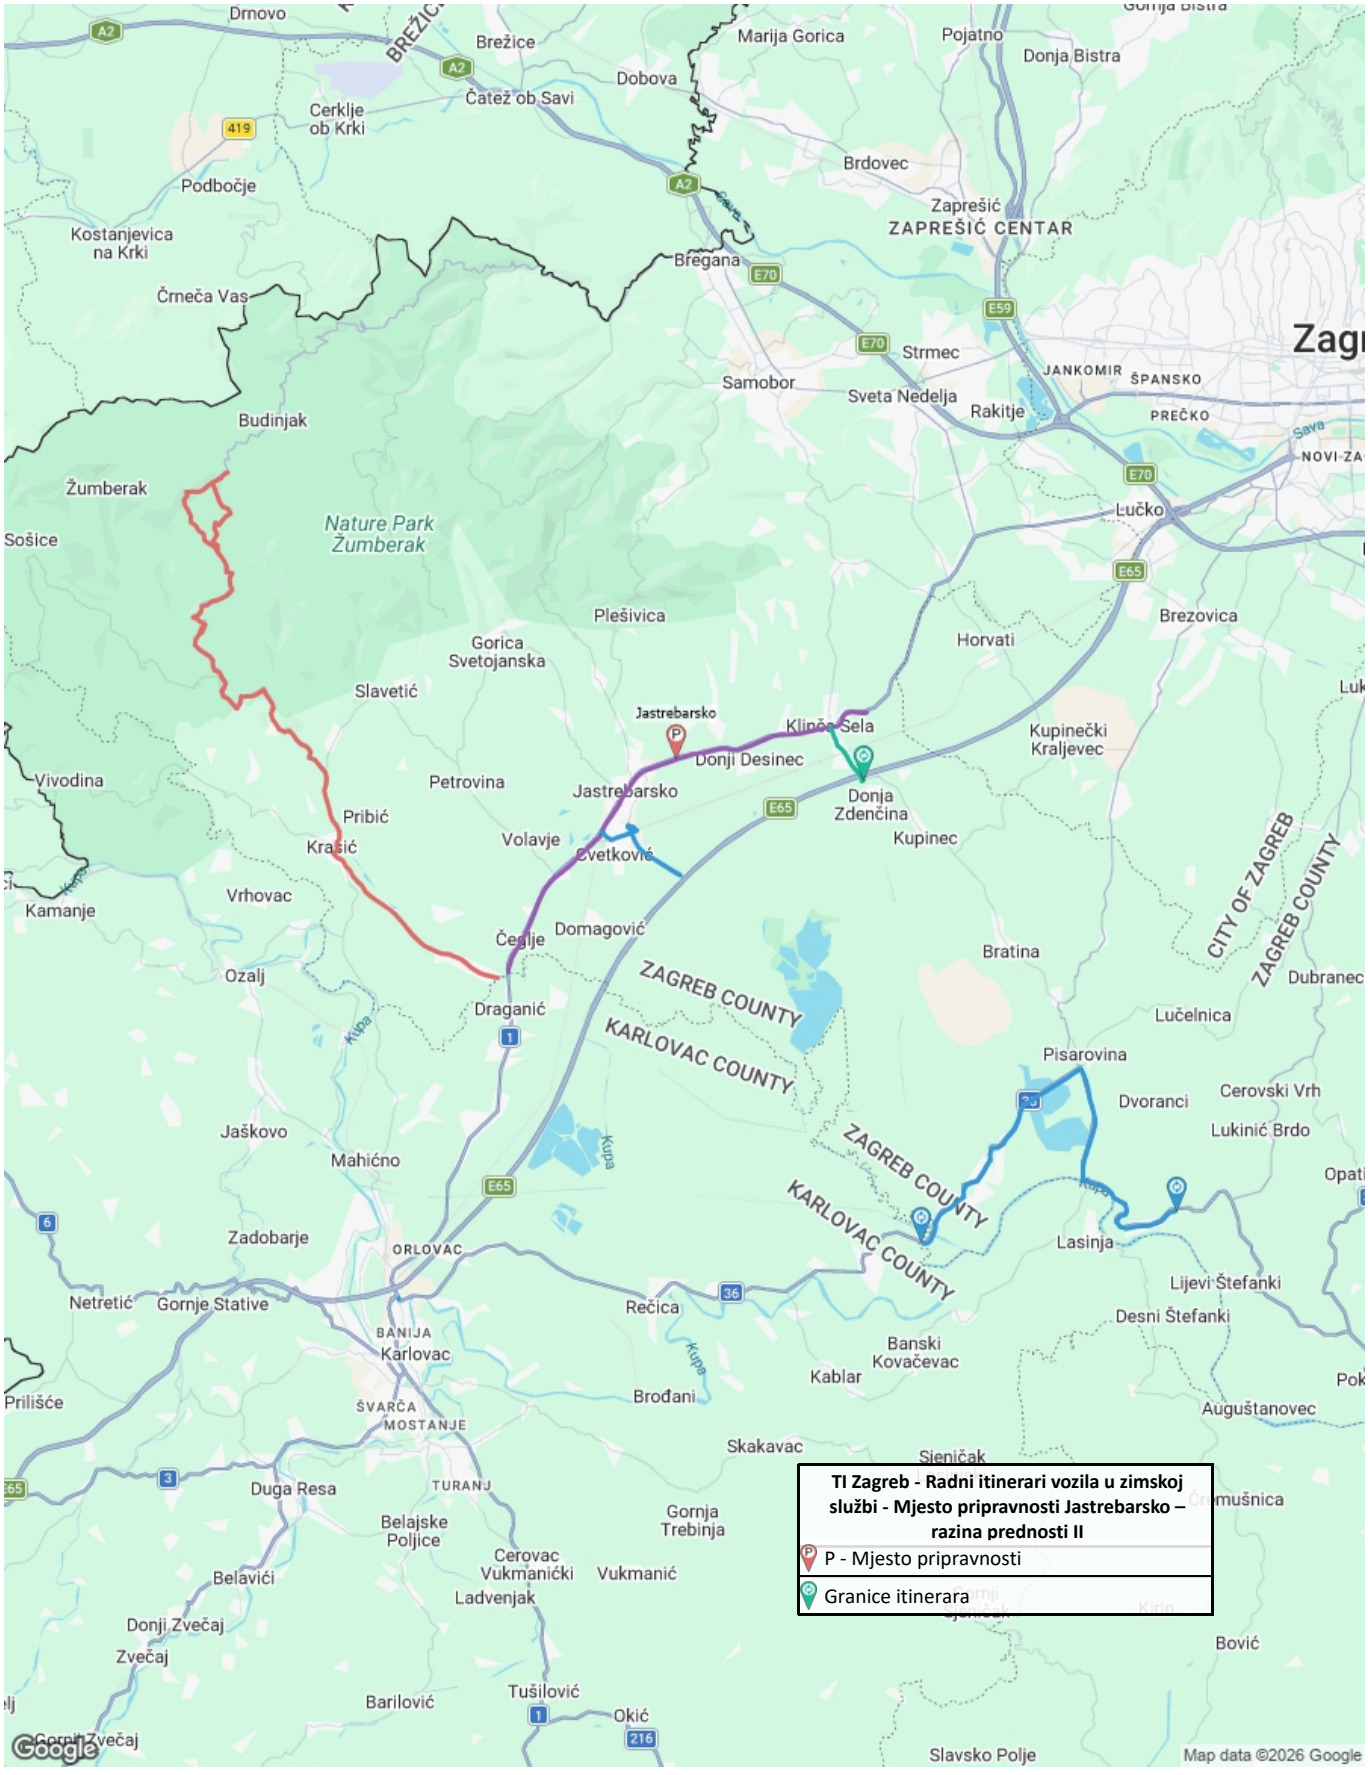


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
KA542JT, KA873LB	Gornja Vas-Draganić	DC546	Gornja Vas (gr. NC Samobor) - Kostanjevac (ŽC3273)	0002	13,075	26,15
			Kostanjevac (ŽC3273) - Krašić - Draganić (gr. TI Karlovac)	0003	17,494	34,988
		DC683	Kalje (DC546 - DC546)	0001	3,845	7,69
KA552JN, KA873LB	Klinča Sela (D1) – čvorište Donja Zdenčina (A1)	DC543	Klinča Sela (D1) – čvorište Donja Zdenčina (A1)	0001, 0101	2,383	4,766
ZG4187BK	Donja Kupćina(g.ž.)-Lijevo Središčko	DC36	Donja Kupćina(g.ž.)-Lijevo Središčko	0001, P2-0001, 0101	18,441	36,882
	Jastrebarsko (DC1)-Čvorište Jastrebarsko (A1)	DC310	Jastrebarsko (D1) - Čabdin: čvorište Jastrebarsko (A1)	0001, 0101, 0201, P2-0001, 0301	4,786	9,572
ZG4187BK, KA542JT, KA552JN	Pavučnjak-Guci Draganički (g.ž)	DC1	Pavučnjak - Jastrebarsko (D310)	0008	11,008	22,016
			Jastrebarsko (D310) - Karlovac (D36)	0009	6,203	12,406
Ukupno:					**77,235**	**154,47**

7.2.8. Mjesto pripravnosti: Podgora Krapinska (Krapina)

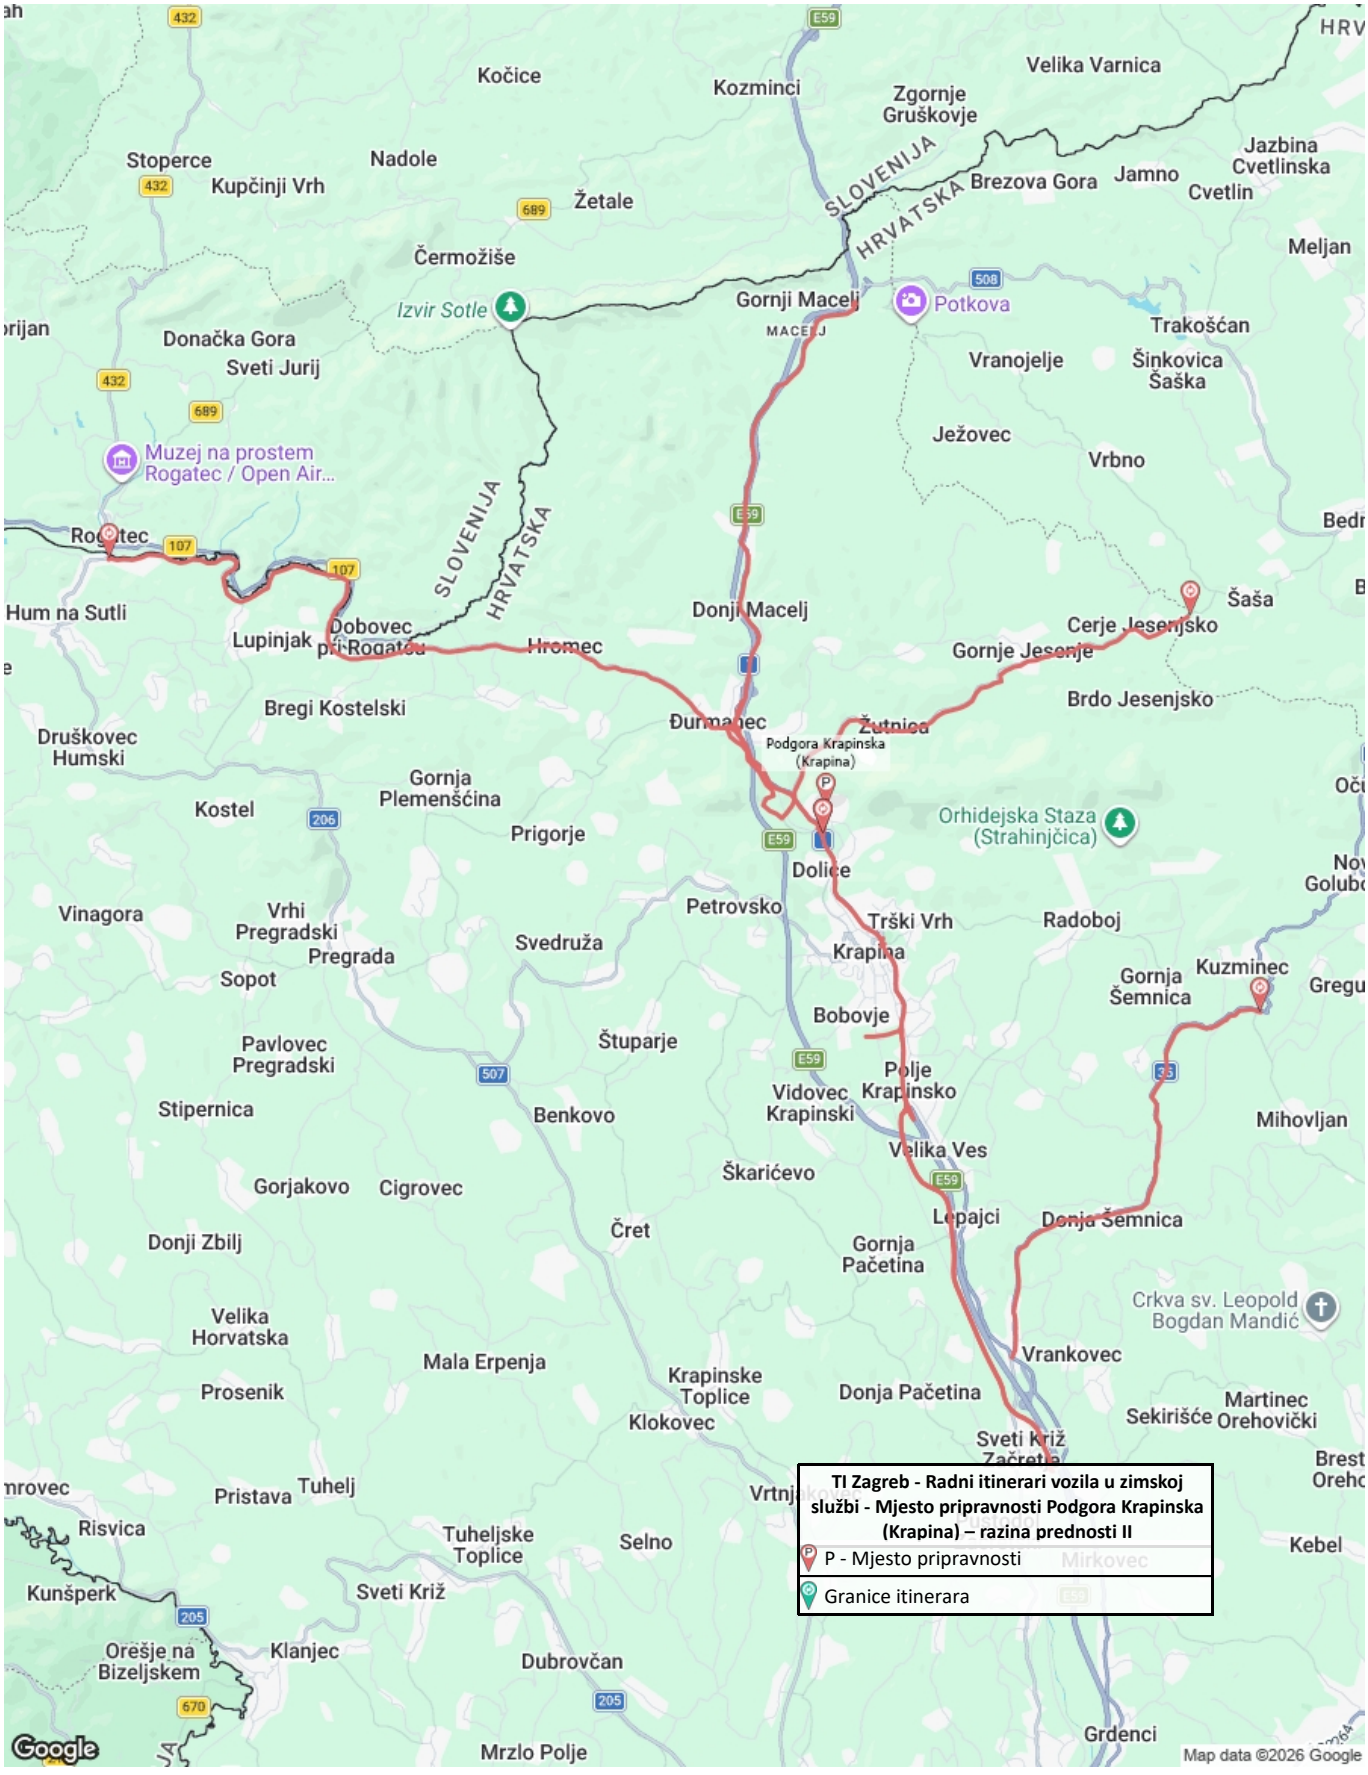


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG1894DL, KR190KI, KR857JR	Podgora Krapinska (DC1) -Macelj (DC1)	DC1	Gornji Macelj (A2/ŽC2258) - Đurmanec (DC207)	0001, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, 0101	8,916	17,832
			Đurmanec (DC207) - Krapina (DC206)	0002, P1-0002, P11-0002, P14-0002, P2-0002, P3-0002, P4-0002, P6-0002, P7-0002, P8-0002, P9-0002	7,388	14,776
			Krapina (DC206) - Velika Ves (A2)	0003, 0103, P1-0003, P2-0003	3,117	6,234
	Podgora Krapinska (DC1) - Švaljkovec - Kuzminec		Krapina (DC 206)-Velika Ves (A2)	0003	0,107	0,214
			Velika Ves (A2)-Sveti Križ Začretje(DC35)	0004, P1-0004, P2-0004, P3-0004, P4-0004, 0104	8,054	16,108
	Podgora Krapinska (DC1) -Macelj (DC1)		Velika Ves (A2) - Sveti Križ Začretje (DC35)	0004, P1-0004, P2-0004, P3-0004, P4-0004, 0104	8,054	16,108
	Podgora Krapinska (DC1) - Švaljkovec - Kuzminec	DC35	Kuzminec - Švaljkovec (D1)	0002, 0102	9,398	18,796
	Podgora Krapinska (DC1) - G. Jesenje - Šaša	DC74	Đurmanec (D207) - Šaša	0001	11,385	22,77
	Podgora Krapinska (DC1) - Đurmanec - Hum na Sutli	DC207	Hum na Sutli (D206) - Đurmanec (D1)	0001, P1-0001, P2-0001, P3-0001, 0101	14,891	29,782
	Mihaljekov Jarek (DC1)-Bobovje-Mihaljekov Jarek (DC1)	DC434	Bobovje - Mihaljekov Jarek (D1)	0001, 0101	0,655	1,31
Ukupno:					**71,965**	**143,93**

7.2.9. Mjesto pripravnosti: Pregrada

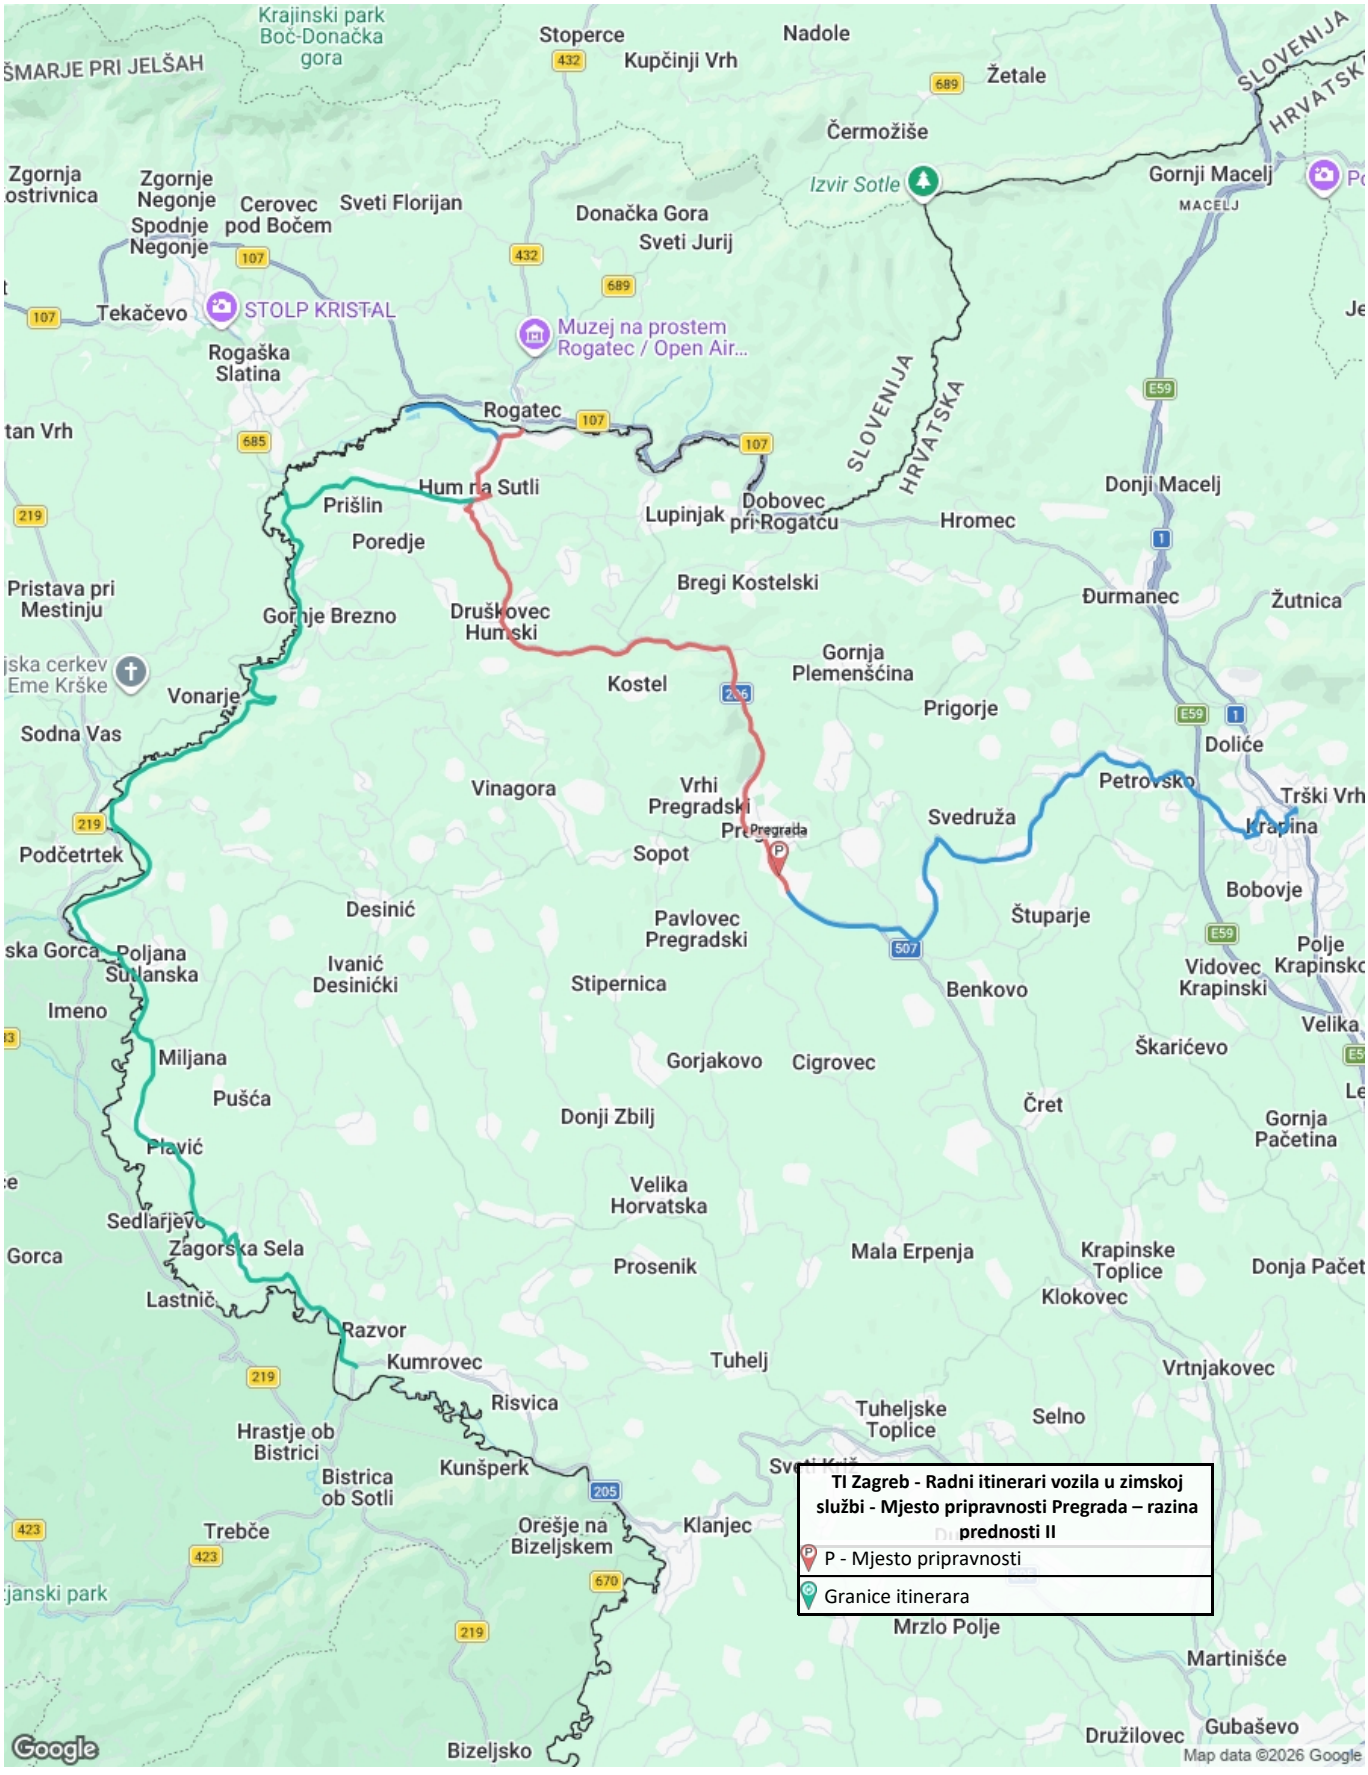


Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
KR128IU, KR593MT, KR614MT, ZG5963JN	Pregrada - Hum na Sutli	DC206	GP Hum na Sutli (gr. R. Slov.) -MP Pregrada	0001, P1-0001, 0101	14,366	28,732
KR886DZ, KR128IU, KR614MT, ZG5963JN	Hum na Sutli - Kumrovec	DC229	Hum Na Sutli (D206) - Mali Tabor - Luke Poljanske - Miljana - Razvor (D205)	0001, P1-0001, P2-0001, P3-0001	27,197	54,394
KR886DZ, KR614MT, ZG5963JN	Pregrada-Krapina	DC206	Pregrada - Valentinovo (D507)	0001	1,771	3,542
			Valentinovo (D507) - Krapina (D1)	0002, P1-0002, P2-0002, P3-0002, 0102, 0202	12,907	25,814
	Hum na Sutli (DC206) - Mali Tabor (DC229)	DC233	Mali Tabor - Hum na Sutli (D206)	0002	1,923	3,846
Ukupno:					**58,164**	**116,328**

7.2.10. Mjesto pripravnosti: Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)

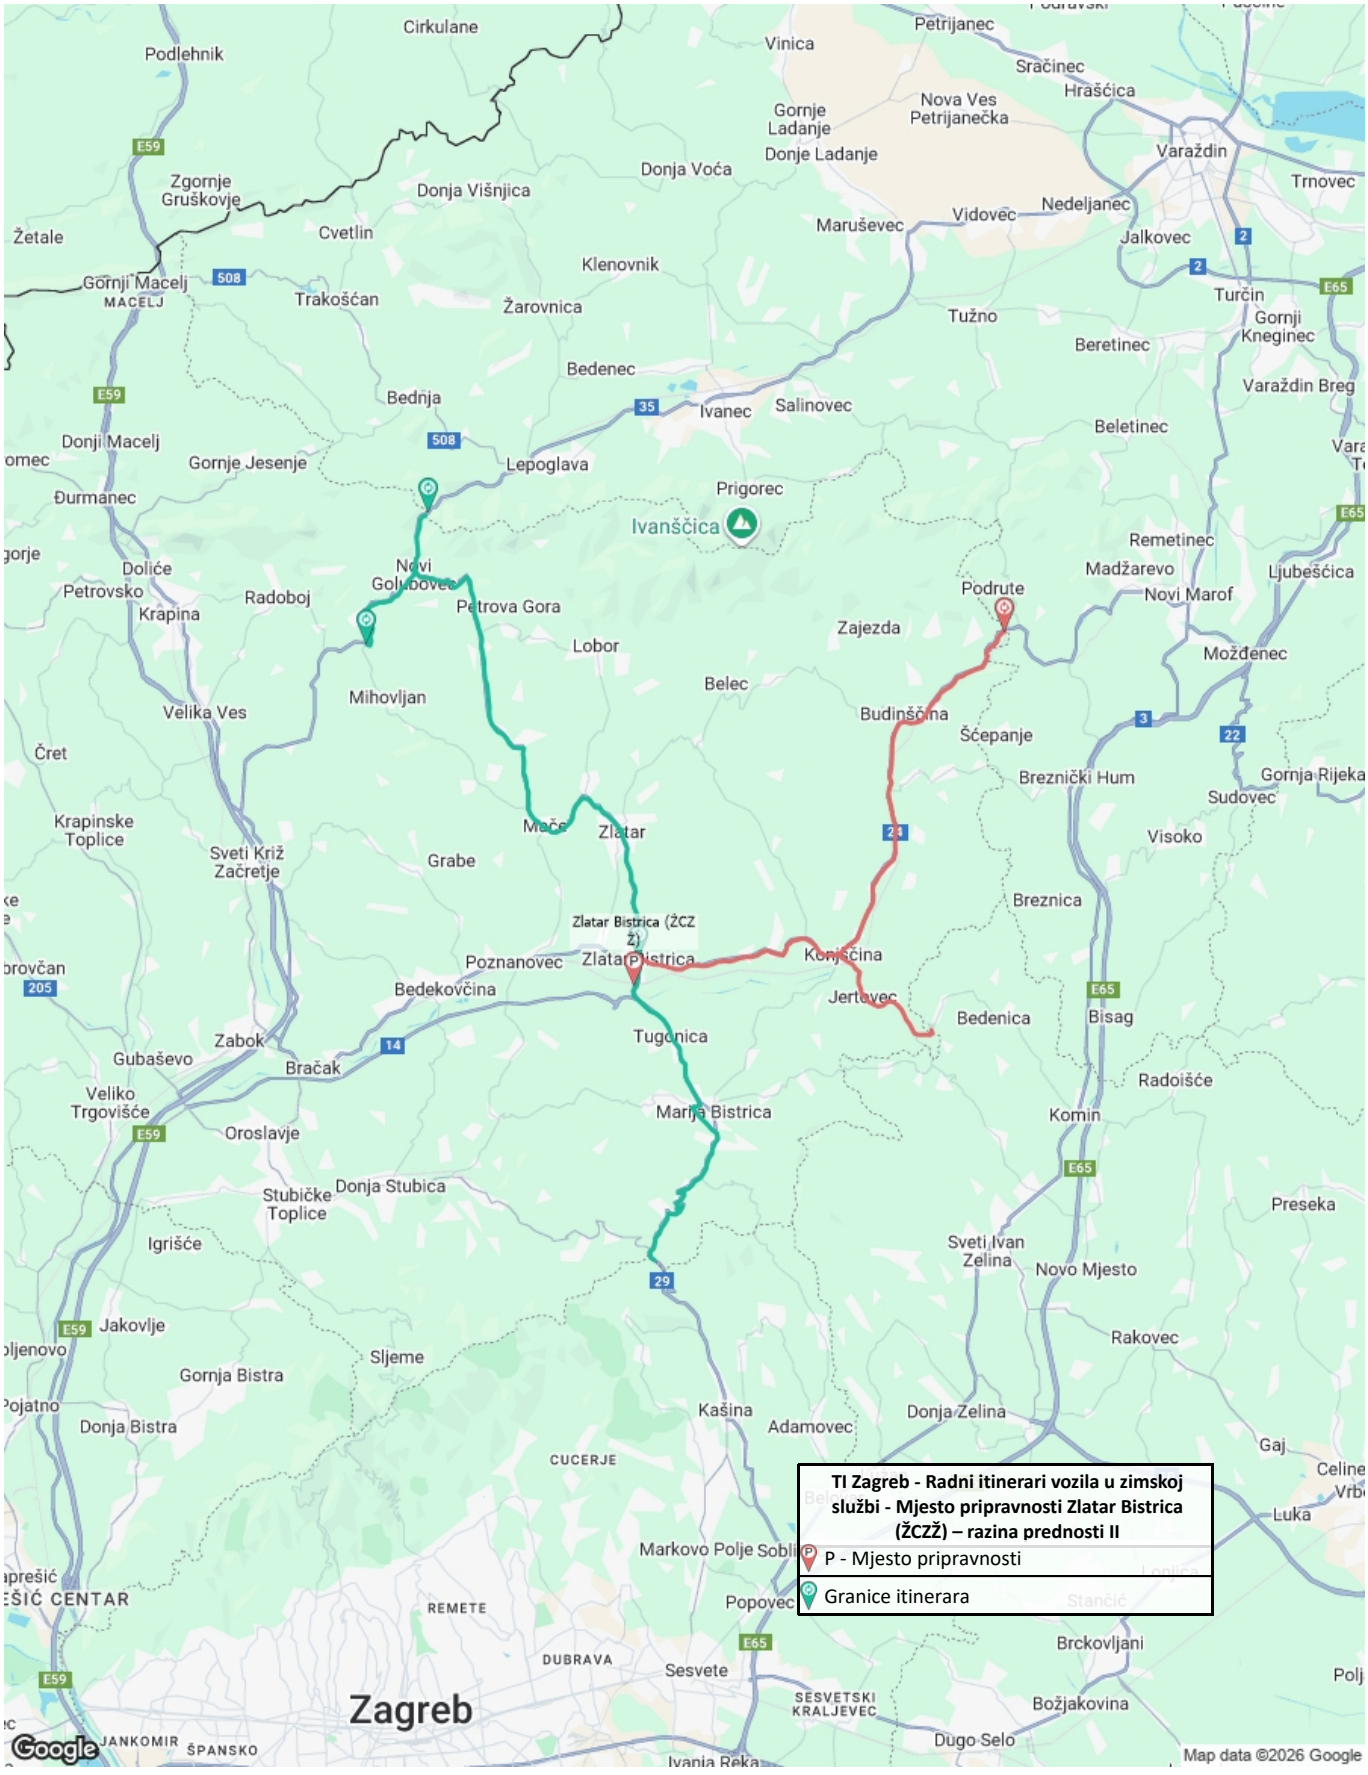

Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
KR469GD, KR233KI	Zlatar Bistrica (DC29) - Konjščina (D24) - Beloslavec (DC540) - Pece	DC24	Zlatar Bistrica (D29) - Pece (DC24)	0001	22,399	44,798
		DC29	Zlatar Bistrica (DC29)- Zlatar Bistrica (DC24)	0001	0,991	1,982
		DC540	Konjščina (DC24) - Beloslavec	0001, P1-0001	5,565	11,13
KR497FL, KR469GD, KR233KI	Zlatar Bistrica - Kuzminec - Očura	DC29	Novi Golubovec (D35) - Zlatar Bistrica	0001, 0101, 0201, 0301, 0401, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001	36,491	72,982
		DC35	Očura-Kuzminec	0002	6,416	12,832
Ukupno:					**71,862**	**143,724**


7.2.11. Mjesto pripravnosti: Zabok

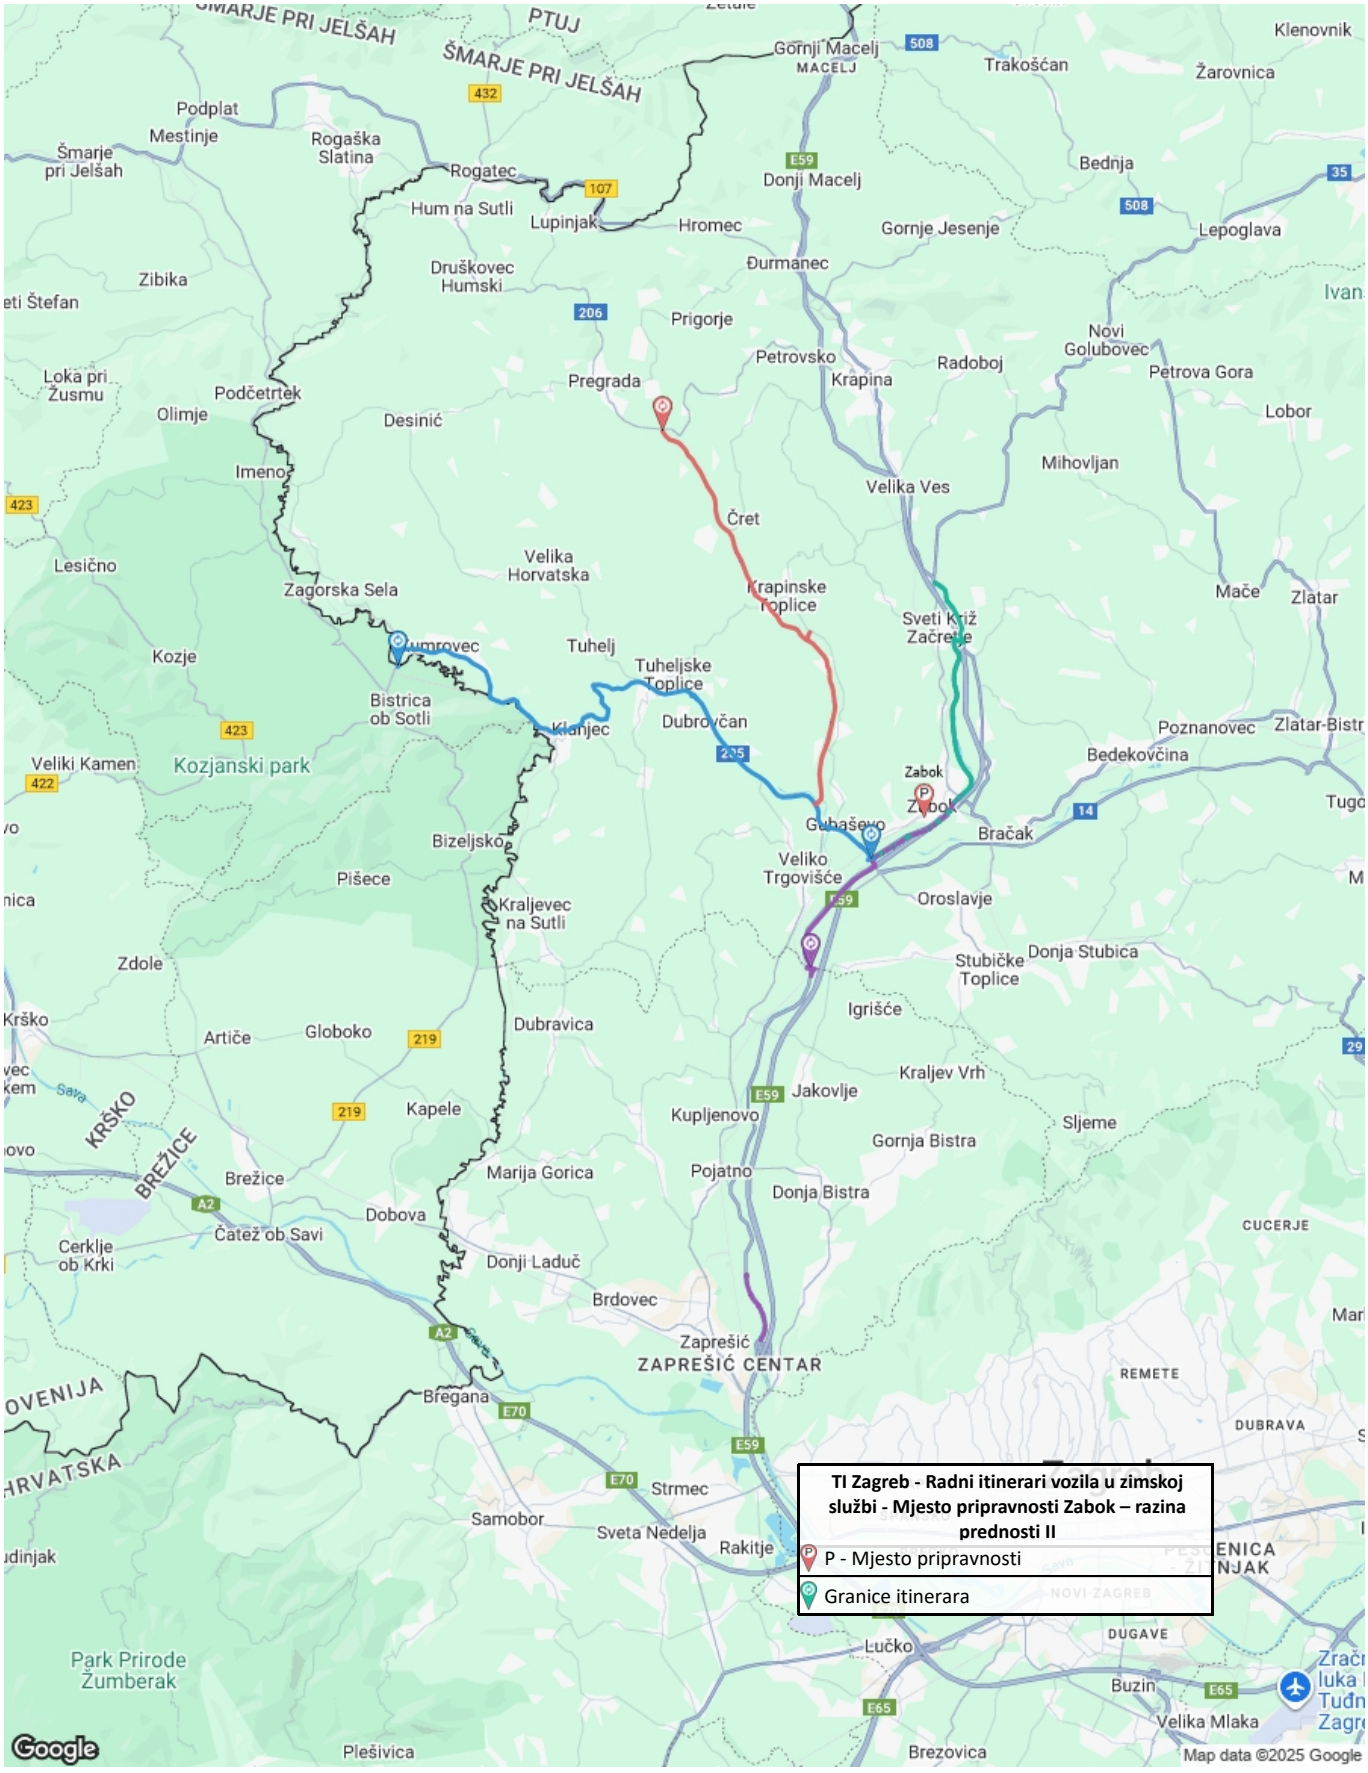

Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
KR250HK, ZG8024AZ	Gubaševo - Valentinovo	DC507	Bušin (D206) - Klokovec - Jezero Klanječko (D205)	0001, 0101, P1-0001, P2-0001, P3-0001	16,145	32,29
ZG1894DL, ZG4426JS	Mokrice - Sveti Križ Začretje	DC1	Sveti Križ Začretje (A2) - Zabok (Ž2195)	0005, P1-0005, P2-0005, 0105	6,538	13,076
			Zabok (Ž2195) - Gubaševo (D205)	0006, P10-0006, P1-0006, P11-0006, P12-0006, P13-0006, P2-0006, P3-0006, P4-0006, P5-0006, P6-0006, P7-0006, P8-0006, P9-0006, 0106, 0206, 0306, 0406, 0506	4,464	8,928
		DC35	Švaljkovec (ŽC2160) - Sveti Križ Začretje (DC1)	0002	2,954	5,908
ZG6443JF, KR642LM	Zabok - Kumrovec	DC205	GP Razvor (granica RH/R Slovenija) - Gubaševo (D1)	0001, 0101, 0201, P1-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001, P8-0001, P2-0001	25,52	51,04
ZG8024AZ, ZG1894DL	Gubaševo - Žeinci	DC1	Sveti Križ Začretje (DC35) - Zabok (ŽC2264)	0005, 0105, P1-0005, P2-0005	6,538	13,076
			Zabok (ŽC2264) - Pavlovec Zabočki (DC205/ŽC2267)	0006, 0106, 0206, 0306, 0406, 0506, P1-0006, P2-0006, P3-0006, P4-0006, P5-0006, P6-0006, P7-0006, P8-0006, P9-0006, P10-0006, P11-0006, P12-0006, P13-0006	4,464	8,928

Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG8024AZ, ZG1894DL	Gubaševo - Žeinci	DC1	Gubaševo (D205) - čvorište Žeinci (A2)	0007, P1-0007, P18-0007, P19-0007, P20-0007, P2-0007, P21-0007, P22-0007, P23-0007, P3-0007, P4-0007, P5-0007, P6-0007, P7-0007, P8-0007, P9-0007, 0207, 0307	6,617	13,234
			Ivanec Bistranski (A2) - Novaki Bistranski (ŽC2262)	0107	2,567	5,134
Ukupno:					**75,807**	**151,614**

7.2.12. Mjesto pripravnosti: Donja Stubica

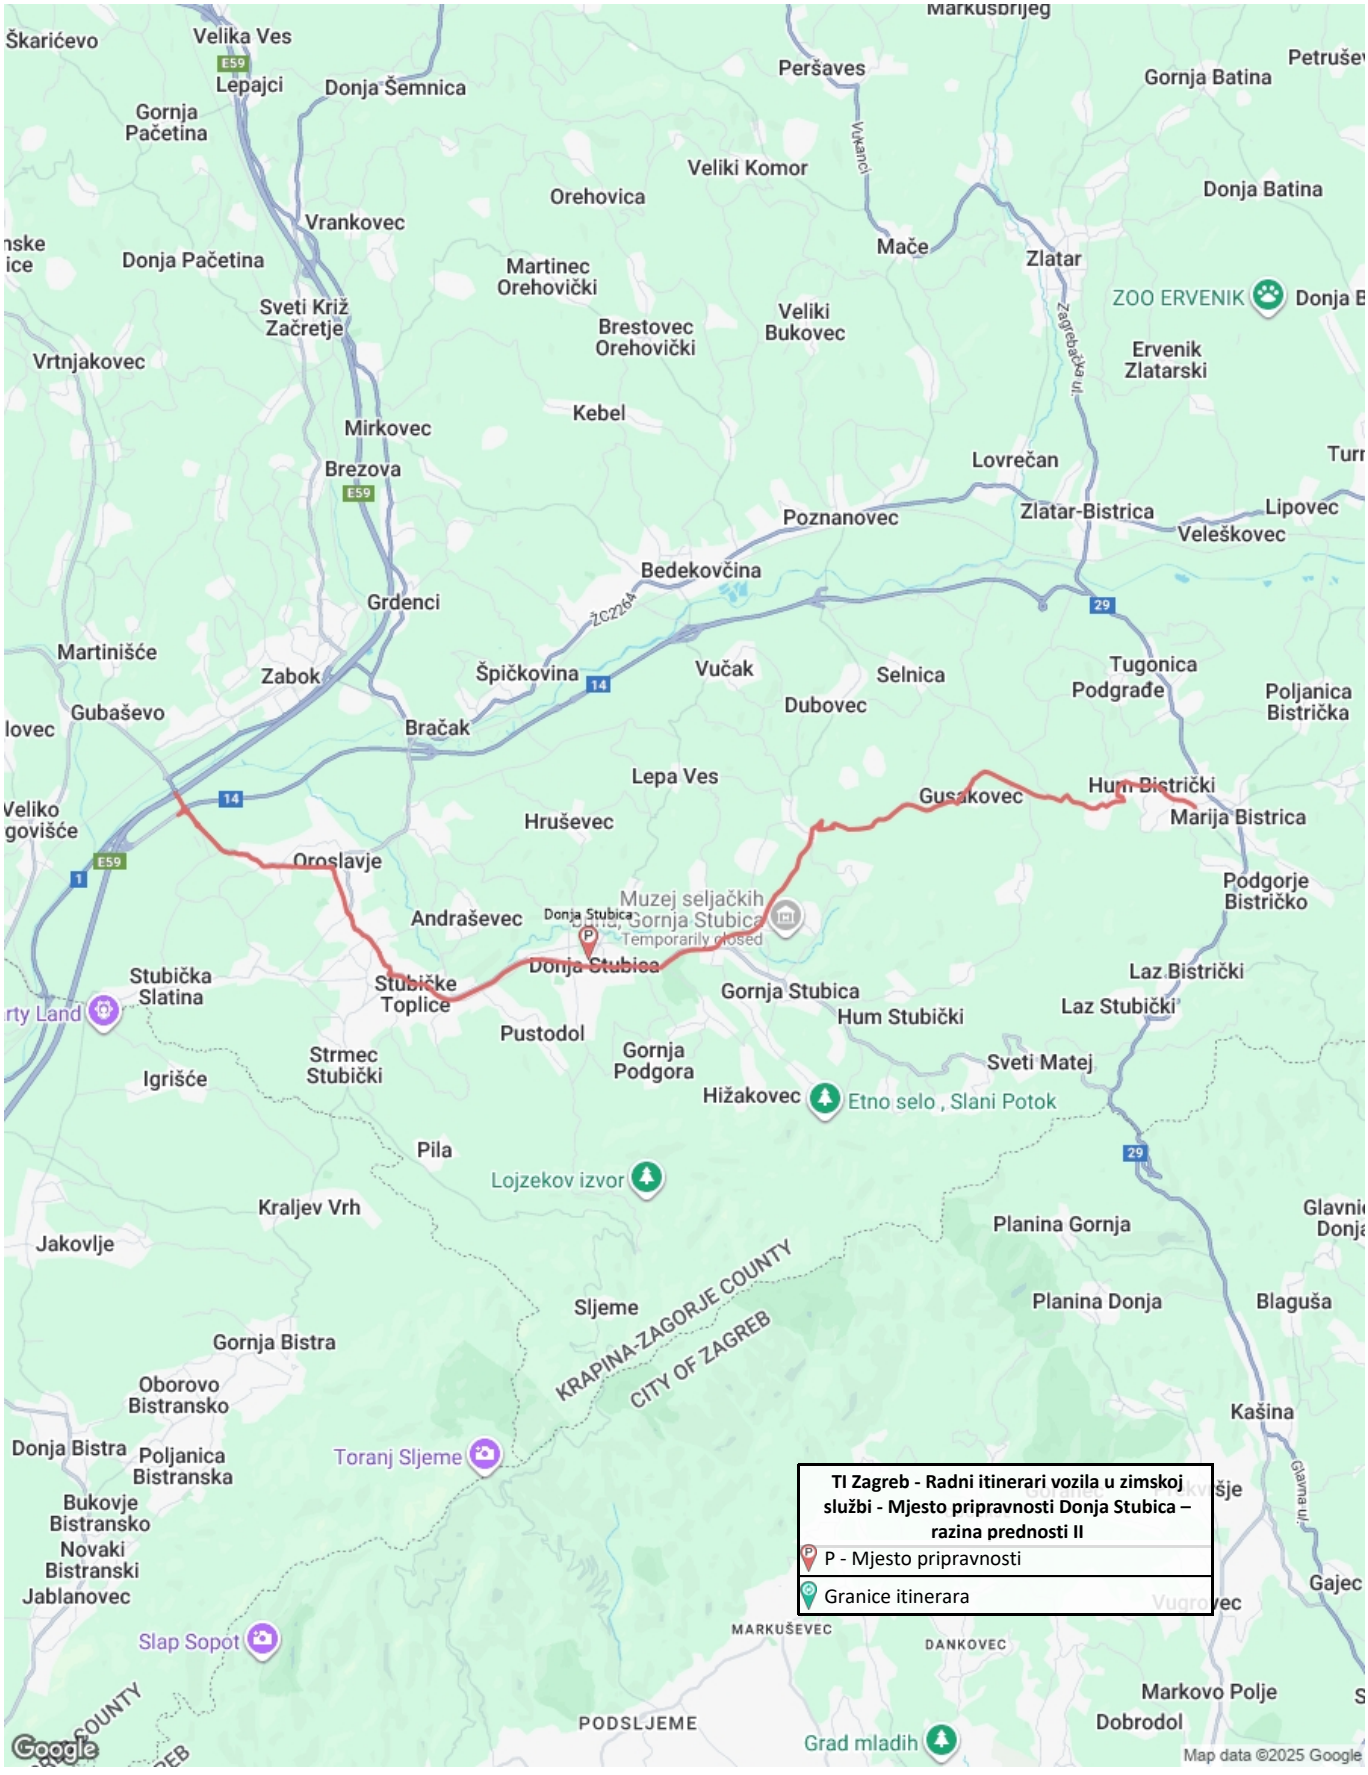

Vozila	Naziv radne dionice	Oznaka ceste	Naziv glavne dionice	Adresne dionice	Duljina radne dionice (km)	Radni itinerar (km)
ZG6956DN, ZG3428HA	Gubaševo - Marija Bistrica	DC307	Gubaševo (D1) – Oroslavje – D. Stubica - Marija Bistrica (D29)	0001, 0101, 0201, 0301, 0401, P1-0001, P2-0001, P3-0001, P4-0001, P5-0001, P6-0001, P7-0001	24,515	49,03
Ukupno:					**24,515**	**49,03**

8. RASPORED POTREBNE MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE TE RADNE SNAGE

Kamioni predviđeni za rad u zimskom održavanju opremljeni su posipačima soli (silosnim) kao i ralicama za snijeg. Osim kamiona angažirani su i specijalizirani strojevi "Unimog", opremljeni potrebnim priključcima.
Za rad na uklanjanju snijega s kolnika, osim kamiona opremljenih ralicama za snijeg, po potrebi se uključuju u rad grejderi i utovarivači za čišćenje i proširenje očišćenog kolnika ceste.
Za rad na utovaru posipala angažiraju se utovarni strojevi: utovarivači ili rovokopači-bageri.
Uz mehanizaciju će se angažirati potreban broj cestara. Uz svaki kamion ili Unimog za radove na posipavanju (zbog pomoći pri utovaru i pretovaru soli) i pluženju predviđen je po jedan cestar.

8.1. Raspored potrebne mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage po mjestima pripravnosti

Potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala po mjestima pripravnosti daje se u sljedećoj tablici.

Redni broj	Županija	Mjesto pripravnosti	Opis	Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti
1.	Zagrebačka	Goričica	Ljudstvo	1	2	2
			Kamion s plugom i posipačem	1	2	2
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	650		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	187		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
2.		Velika Gorica	Ljudstvo	2	3	6
			Kamion s plugom i posipačem	1	3	5
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	1	1	1
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	1150		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	350		

Redni broj	Županija	Mjesto pripravnosti	Opis	Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti
2.	Zagrebačka	Velika Gorica	Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
3.		Zaprešić	Ljudstvo	2	2	2
			Kamion s plugom i posipačem	1	2	2
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	500		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	77		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
4.		Samobor	Ljudstvo	2	3	3
			Kamion s plugom i posipačem	1	2	2
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	900		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	375		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0

Redni broj	Županija	Mjesto pripravnosti	Opis	Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti
4.	Zagrebačka	Samobor	Traktor s posipačem	0	0	0
5.		Vrbovec	Ljudstvo	1	3	6
			Kamion s plugom i posipačem	1	3	6
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	1400		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	191		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
6.		NC Ivanić Grad	Ljudstvo	1	2	2
			Kamion s plugom i posipačem	1	2	2
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	350		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	0		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
7.		Jastrebarsko	Ljudstvo	1	2	3
			Kamion s plugom i posipačem	1	2	3
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0

Redni broj	Županija	Mjesto pripravnosti	Opis	Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti
7.	Zagrebačka	Jastrebarsko	Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	750		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	323		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
8.	Krapinsko-zagorska	Podgora Krapinska (Krapina)	Ljudstvo	1	3	4
			Kamion s plugom i posipačem	1	3	4
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	1	1	1
			Rovokopač	0	0	0
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	650		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	136		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
9.		Pregrada	Ljudstvo	1	2	2
			Kamion s plugom i posipačem	1	2	2
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	500		

Redni broj	Županija	Mjesto pripravnosti	Opis	Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti
9.	Krapinsko-zagorska	Pregrada	Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	150		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
10.		Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	Ljudstvo	1	2	3
			Kamion s plugom i posipačem	1	2	3
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	450		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	400		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
11.		Zabok	Ljudstvo	1	3	5
			Kamion s plugom i posipačem	1	3	5
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	1	1	1
			Utovarno sredstvo	0	0	0
			Rovokopač	1	1	1
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	1000		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	180		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0

Redni broj	Županija	Mjesto pripravnosti	Opis	Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti
11.	Krapinsko-zagorska	Zabok	Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
12.		Donja Stubica	Ljudstvo	1	1	1
			Kamion s plugom i posipačem	1	1	1
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	0	0	0
			Utovarno sredstvo	1	1	1
			Rovokopač	0	0	0
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	300		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	0		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0
Ukupno TI Zagreb			Ljudstvo	15	28	39
			Kamion s plugom i posipačem	12	27	37
			Odbacivač snijega	0	0	0
			Samohodna snježna freza	0	0	0
			Specijalno vozilo (Unimog)	2	2	2
			Utovarno sredstvo	2	2	2
			Rovokopač	10	10	10
			Grejder	0	0	0
			Postrojenje za pripremu otopine CaCl	0	0	0
			Ostala mehanizacija	0	0	0
			Natrijev klorid (t)	8600		
			Kalcijev klorid (t)	0		
			Kamena sitnež (m3)	2369		
			Lopate	0	0	0
			Štapovi za snijeg	0	0	0
			Traktor	0	0	0
			Radni stroj	0	0	0
			Kombinirka	0	0	0
			Multicar s posipačem i ralicom	0	0	0
			Traktor s posipačem	0	0	0

8.2. Planirane količine posipala

Mjesto stalne pripravnosti	Sol za skladišta		Sol za silose		Ukupno sol		Kamena sitnež		Kalcijev klorid	
	Planirano	Zaliha	Planirano	Zaliha	Planirano	Zaliha	Planirano	Zaliha	Planirano	Zaliha
	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(t)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)
Goričica	500	308,7	150	0	650	308,7	187	0	0	0
Velika Gorica	1150	208,41	0	0	1150	208,41	350	70	0	0
Zaprešić	500	97,53	0	0	500	97,53	77	10	0	0
Samobor	900	34,34	0	0	900	34,34	700	55	0	0
Vrbovec	1100	247,63	300	0	1400	247,63	191	120	0	0
NC Ivanić Grad	500	125,89	150	0,06	650	125,95	70	0	0	0
Jastrebarsko	750	74,33	0	0	750	74,33	500	25	0	0
Podgora Krapinska (Krapina)	800	55,82	0	0	800	55,82	180	20	0	0
Pregrada	200	28,6	300	0	500	28,6	350	15	0	0
Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	450	66,41	0	0	450	66,41	400	30	0	0
Zabok	1000	135,38	0	0	1000	135,38	200	30	0	0
Donja Stubica	300	127,81	0	0	300	127,81	300	50	0	0
Ukupno:	**8150**	**1510,85**	**900**	**0,06**	**9050**	**1510,91**	**3505**	**425**	**0**	**0**

8.3. Planirane količine ostalog materijala

Mjesto stalne pripravnosti	Prometni znakovi	Grambit	Snjegobrani	Štapovi za snijeg
	(kom)	(t)	(m)	(kom)
Goričica	15	2	0	30
Velika Gorica	10	3	0	20
Zaprešić	10	2	0	20
Samobor	10	2	0	20
Vrbovec	20	5	0	40
NC Ivanić Grad	8	5	0	15
Jastrebarsko	12	2	0	25
Podgora Krapinska (Krapina)	10	20	0	80
Pregrada	10	5	0	20
Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	24	5	0	45
Zabok	15	20	0	100
Donja Stubica	10	5	0	20
Ukupno:	**154**	**76**	**0**	**435**

8.4. Popis vozila i strojeva koje će izvoditelj koristiti u obavljanju zimske službe

Mjesto pripravnosti	Itinerar	Registarska oznaka	Vozilo	Vrsta vozila	Posipač	Ralica	UKV Radio (ID)	GPS	Kooperant
Goričica	DC29/0001, DC3/0008, DC3/0009, DC3/0010	ZG1591IC	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - Solid X 4000 silosni	Rasco - Winter 3,4 Winter 3,4	Nema	GV200 N-122	Ne
	DC29/0001, DC3/0008, DC3/0009, DC3/0010, DC540/0001	ZG5201GB	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Rasco - Rasco Solid 6.0. Solid 6.0	Rasco - Rasco Kalnik 3.2 Kalnik 3.2	Nema	FMB12 5-035	Ne
	DC29/0001, DC3/0008, DC3/0009, DC3/0010, DC540/0001	ZG5202GB	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Kupperwisser - Kupperweisser ims 5 silosni	Rasco Kalnik - Kalnik 3,2 Kalnik 3,2	Nema	FMC13 0-070	Ne
	DC540/0001	ZG5961JN		Unimog	Schmidt - rotacijski silosni	Rasco - SPTT 3.0	Nema	FMB12 5-179	Ne
Velika Gorica	DC30/0001, DC30/0002, DC30/0101, DC31/0001, DC31/0002, DC31/0101, DC430/0001, DC430/0101, DC536/0001	ZG5931DI	Mercedes-Benz	Ostalo	Rasco - Solid 5.0. silosni	Schmidt - MS 32.2 Schmidt Tarron MS 32.2	Motorola DM4601e (ID10325)	FOX-161	Ne
	DC36/0001, DC36/0002, DC536/0001	ZG7082HU	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Rasco - Solid 6,0 Silosni	Rasco - Kalnik 3,2	Motorola DM4601e (ID10324)	FOXEN-CH-177	Ne
	DC30/0001, DC30/0002, DC30/0101, DC408/0001, DC408/0101	ZG6031IV	Unimog	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - RSP 2.0 silosni	Schmidt - SPTT 3.0 SPTT 3.0	Nema	FMB12 5-039	Ne
	DC31/0001, DC31/0002, DC31/0101, DC536/0001	ZG2003IB	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Kupperweisser - Kupperweisser Kupperweisser	Kahlbacher - Kahlbacher Kahlbacher	Nema	FMB12 5-051	Da

Mjesto pripravnosti	Itinerar	Registarska oznaka	Vozilo	Vrsta vozila	Posipač	Ralica	UKV Radio (ID)	GPS	Kooperant
Velika Gorica	DC408/0001, DC408/0101, DC430/0001, DC430/0101	ZG8141IA	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Schmidt - Stratos B 30 silosni	Riko - SPG 321 SPG 321	Nema	FMB12 5-053	Da
	DC408/0001, DC408/0101, DC430/0001, DC430/0101	ZG5444JI	Unimog	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Schmidt - Schmidt 4.0 Schmidt 4.0	Kahlbacher - Kahlbacher Kahlbacher	Nema	FMB12 5-157	Ne
	DC30/0001, DC30/0002, DC30/0101, DC408/0001, DC408/0101	ZG2986KK		Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Riko - EPOKE AST SH 3800 silosni	Rico - PLUG br.19	Motorola DM4601e (ID10357)	FMB12 5-464	Ne
	DC31/0001, DC31/0002, DC31/0101, DC36/0001, DC36/0002	ZG1946KN		Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Nema	Nema	Nema	FMB12 5-492	Ne
Zaprešić	DC225/0001, DC225/0201	ZG4407BO	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Schmidt - B 60 Stratos B 60	Schmidt - Tarron MS 32.1 Tarron MS 32.1	Motorola DM4601e (ID10336)	FMB12 0-081	Ne
	DC1/0007, DC1/0107	ZG3427HA	Mercedes	Ostalo	Hydrac - Hydrac Certis 5 M2 Certis 5 M2	Hydrac - Hydrac U-III-400 U-III -400	Motorola DM4601e (ID10355)	GV200 N-102	Ne
	DC1/0007, DC1/0107, DC225/0001, DC225/0201	ZG1947KN		Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Epoke - Fortus S3401 6 m3 Silosni	Rasco - Velebit 3.4	Nema	FMB12 5-495	Ne
Samobor	DC1/0008, DC231/0001	ZG2087AB	Mercedes-Benz	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - RSP 4,5 VH silosni	Rasco - SPNK - 3,2 H	Motorola DM4601e (ID10313)	FMC13 0-097	Ne
	DC1/0008	ZG9967FE	Mercedes-Benz	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - Solid 5,0 Silosni	Rasco - KALNIK 3.2,	Motorola DM4601e (ID10318)	FMB12 5-412	Ne

Mjesto pripravnosti	Itinerar	Registarska oznaka	Vozilo	Vrsta vozila	Posipač	Ralica	UKV Radio (ID)	GPS	Koope rant
Samobor	DC231/0001	ZG3906IP	Mercedes Benz	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Aconelis - Aconelis 5,0 silosni	Schmit - MS-3,0 Schmit MS	Nema	GV200 N-128	Ne
	DC546/0001 , DC546/0002	ZG2611JK	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Gmeiner - 6,0 silosni	Schmidt - MS-36 silosni	Nema	Nema	Ne
	DC546/0001 , DC546/0002	ZG2034JA	Unimog	Unimog	RASCO - VITER 3,2 Silosni	RASCO - SOLID X 3500	Nema	FMB12 5-050	Da
	DC546/0001 , DC546/0002	ZG1377JL	Unimog	Unimog	Springer - 3,0 silosni	Kahlbacher - DS-260	Nema	FMB12 5-162	Ne
Vrbovec	DC28/0001	ZG4405BO	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Schmidt - Stratos B 50 Stratos B 50	Schmidt - Tarron 32.1 Tarron MS 32.1	Nema	FOX-034	Ne
	DC10/0001, DC10/0002, DC10/0003, DC10/0004, DC10/0101, DC10/0102, DC10/0103	ZG9355EN		Ostalo	Nema	Nema	Nema	FOX-036	Ne
	DC10/0001, DC10/0002, DC10/0003, DC10/0004, DC10/0101, DC10/0102, DC10/0103, DC12/0001, DC12/0101, DC544/0001	ZG6357AZ	Mercedes-Benz	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - Solid 5,0 Silosni	SCHMIDT MS - MS 32,1 TARON	Motorola DM4601e (ID10330)	FOX-163	Ne
	DC28/0001	ZG9148KU	Mercedes-Benz	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Scmidt - Schmidt Ecos B 40 Ecos B 40	Schmidt - Schmidt Vector MS 33 Vector MS 33	Motorola DM4601e (ID10342)	FMC130-145	Ne
	DC10/0001, DC10/0002, DC10/0003, DC10/0004, DC10/0101, DC10/0102, DC10/0103, DC12/0001, DC12/0101, DC544/0001	ZG5345EE	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Rasco - Solid 8,0 Silosni	SCHMIDT - MS 32,1 TARON	Motorola DM4601e (ID10323)	FOX-237	Ne

Mjesto pripravnosti	Itinerar	Registarska oznaka	Vozilo	Vrsta vozila	Posipač	Ralica	UKV Radio (ID)	GPS	Koope rant
Vrbovec	DC12/0001, DC12/0101, DC26/0001	ZG6532GG	Man	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	SCHMIDT - STRATOS B-80-42 VCLN U 90 Silosni	Rasco - RPS/1	Motorola DM4601e (ID10332)	FMC130-088	Ne
	DC12/0001, DC12/0101, DC43/0004	ZG7473HU	Man	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	SCHMIDT - STRATOS B - 50 - 36 Silosni	SCHMIDT - MS 36,1 Taron	Motorola DM4601e (ID10331)	FOXCH-033	Ne
	DC10/0001, DC10/0002, DC10/0003, DC10/0004, DC10/0101, DC10/0102, DC10/0103, DC26/0001	ZG5201GB	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Rasco - Rasco Solid 6.0. Solid 6.0	Rasco - Rasco Kalnik 3.2 Kalnik 3.2	Nema	FMB125-035	Ne
	DC10/0001, DC10/0002, DC10/0003, DC10/0004, DC10/0101, DC10/0102, DC10/0103, DC12/0001, DC12/0101	ZG6032IV	Unimog	Unimog	Schmidt - Schmidt 2.5 silosni	Schmidt - Schmidt MS 3.0 MS 3.0	Nema	FMB125-041	Ne
	DC43/0004, DC544/0001	ZG5962JN		Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Nema	Nema	Nema	FMB125-178	Ne
NC Ivanić Grad	DC43/0003, DC43/0004	ZG4540BK	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Schmidt - Schmidt Stratos B 50 silosni	Riko - Riko SPA 321 RIKO SPA 321	Nema	FOX-038	Ne
	DC43/0003, DC43/0004	ZG6893AP	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	SCHMIDT - ECOS B - 60 - 36 VATN Silosni	Rasco - SPNK - 3,2	Motorola DM4601e (ID10339)	FMB120-082	Ne
Jastrebarsko	DC1/0008, DC1/0009, DC310/0001, DC36/0001	ZG4187BK	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - Solid 5.0 silosni	Kahlbacher - Kahlbacher Kahlbacher	Motorola DM 4601 (ID47301)	FMB125-174	Da

Mjesto pripravnosti	Itinerar	Registarska oznaka	Vozilo	Vrsta vozila	Posipač	Ralica	UKV Radio (ID)	GPS	Kooperant
Jastrebarsko	DC1/0008, DC1/0009, DC546/0002, DC546/0003, DC683/0001	KA542JT	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - Rasco Solid x 3.0 silosni	Rasco - Rasco Mosor PK 3.2 Mosor PK 3.2	Nema	FMB125-111	Da
	DC1/0008, DC1/0009, DC543/0001	KA552JN	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Rasco - Rasco RSP silosni	Schmidt - Schmidt Tarron MS 34.1 Tarron MS 34.1	Motorola DM 4601 (ID47309)	FMB120-084	Ne
	DC543/0001, DC546/0002, DC546/0003, DC683/0001	KA873LB	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	RIKO - RIKO TK-12 vučni	SCHMIDT - Schmidt Tarron MS 32.1 Taron MS 32.1	Nema	FMC130-102	Ne
Podgora Krapinska (Krapina)	DC1/0001, DC1/0002, DC1/0003, DC1/0004, DC207/0001, DC35/0002, DC434/0001, DC74/0001	ZG1894DL	Mercedes-Benz	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	SCHMIDT - ECOS B - 60 - 36 VATN Silosni	SCHMIDT - MS - 36	Motorola DM4601e (ID10307)	FOX-167	Ne
	DC1/0001, DC1/0002, DC1/0003, DC1/0004, DC207/0001, DC35/0002, DC434/0001, DC74/0001	KR190KI	Man	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 3,5 t	-	Nema	Nema	FMB125-151	Ne
	DC1/0001, DC1/0002, DC1/0003, DC1/0004, DC207/0001, DC35/0002, DC434/0001, DC74/0001	KR857JR	DAF	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Kupperweisser - Kupperweisser silosni	Kahlbachere - Kahlbacher Kahlbacher	Nema	FMB120-076	Da
Pregrada	DC206/0001, DC206/0002, DC229/0001, DC233/0002	KR886DZ	Mercedes	Ostalo	Rasco - RSP 6,0 VH Silosni	Kahlbacher - MS 3,3 MS 3,30	Nema	FOXCH-010	Da

Mjesto pripravnosti	Itinerar	Registarska oznaka	Vozilo	Vrsta vozila	Posipač	Ralica	UKV Radio (ID)	GPS	Kooperant
Pregrada	DC206/0001, DC229/0001	KR128IU	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Schmidt - Schmidt B 50 silosni	Schmidt - MS 32 silosni	Nema	FMB125-017	Da
	DC206/0001	KR593MT	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - Solid 5,0 silosni	Kahlbacher - MS 3,2 silosni	Nema	FMB125-164	Ne
	DC206/0001, DC206/0002, DC229/0001, DC233/0002	KR614MT	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Schmid - Schmidt SST SST	Rasco - SPNK 3,2 silosni	Nema	FMB125-166	Ne
	DC206/0001, DC206/0002, DC229/0001, DC233/0002	ZG5963JN		Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Nema	Nema	Nema	FMB125-177	Ne
Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	DC29/0001, DC35/0002	KR497FL	Unimog	Unimog	Schmidt - Schmidt Miros silosni	Beilhack - Beilhack Beilhack	Motorola DM4601e (ID10349)	FMB125-052	Da
	DC24/0001, DC29/0001, DC35/0002, DC540/0001	KR469GD	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Schmidt - Stratos B 40 silosni	Beilhack - Beilhack Voraus	Motorola DM4601e (ID10348)	QUE-200-201	Da
	DC24/0001, DC29/0001, DC35/0002, DC540/0001	KR233KI	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Kupperweisser - Kupperweisser termat silosni	Beilhack - Beilhack Beilhack	Nema	GV200N-239	Da
Zabok	DC507/0001	KR250HK	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Kupperweisser - Kupperweisser silosni	Schmidt - Schmidt MS 32.2 MS 32.2	Nema	QUE-200-097	Da
	DC14/0001, DC14/0002, DC14/0101, DC14/0201, DC14/0202, DC14/0302, DC14/0402, DC205/0001	ZG6443JF	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	SCHMIDT - ECOS B - 60 - 36 VATN Silosni	Rasco - SPNK - 3,2 H	Motorola DM4601e (ID10322)	FOX-162	Ne

Mjesto pripravnosti	Itinerar	Registarska oznaka	Vozilo	Vrsta vozila	Posipač	Ralica	UKV Radio (ID)	GPS	Kooperant
Zabok	DC1/0005, DC1/0006, DC1/0007, DC1/0107, DC507/0001	ZG8024AZ	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Nema	Nema	Motorola DM4601e (ID10337)	FMC130-096	Ne
	DC1/0005, DC1/0006, DC1/0007, DC1/0107, DC35/0002	ZG1894DL	Mercedes-Benz	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	SCHMIDT - ECOS B - 60 - 36 VATN Silosni	SCHMIDT - MS - 36	Motorola DM4601e (ID10307)	FOX-167	Ne
	DC1/0005, DC1/0006, DC35/0002	ZG4426JS	Mercedes-Benz	Ostalo	Nema	Nema	Motorola DM4601e (ID10311)	FMB120-066	Ne
	DC14/0001, DC14/0002, DC14/0101, DC14/0201, DC14/0202, DC14/0302, DC14/0402	ZG7150DO	MAN	Teretni automobil dopuštene nosivosti preko 12,0 t	Rasco - Solid 8,0 Silosni	Rasco - KALNIK 3.2,	Motorola DM4601e (ID10310)	FOX-238	Ne
Donja Stubica	DC307/0001	ZG6956DN	Unimog	Unimog	Schmidt Stratos B 30 - Stratos B 30 silosni	Schmidt Tarron MS 30.1 - Tarron MS 30.1 silosni	Nema	FOXEN-CH-086	Ne
	DC307/0001	ZG3428HA	Mercedes	Teretni automobil dopuštene nosivosti do 12,0 t	Rasco - Rasco Solid 5.0 silosni	Rasco - Rasco Kalnik 3.4 Kalnik 3.4	Nema	QUE-200-177	Ne

9. RASPORED DEŽURSTAVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI TE RASPORED RADNIH SKUPINA

Raspored dežurstva, obvezne prisutnosti i raspored radnih skupina isključiva je nadležnost izvoditelja.
Izvoditelj planira raspored radova svakodnevno, sukladno zaprimljenoj prognozi vremena Državnog hidrometeorološkog zavoda u dva navrata (jutarnja i dnevna prognoza) te stvarnom stanju kolnika pojedinih državnih cesta. Kao podloga za planiranje služe polutjedne i mjesečne prognoze vremena.

Prognoze vremena sadrže izglede vremena sa svim za zimsku službu potrebnim elementima, kao što su:

- najviše i najniže temperature,
- mogućnost i intenzitet padalina,
- mogućnost nastanka zapuha,
- prognozu vjetra i
- mogućnost nastanka poledice.

Meteorološke pojave koje mogu uvelike smanjiti sigurnost cestovnog prometa, kao što su velike količine snijega, jake snježne vijavice, mećave koje stvaraju zapuhe, poledica zbog padanja kiše koja se ledi na cesti, olujni udari vjetra, jake i dugotrajne magle, najavljuju se u vidu upozorenja na opasne vremenske pojave.

Prognoze vremena upisuju se u dnevnik dežurstva izvoditelja radova u Operativnom stožeru i putem sustava veza prosljeđuju mjestima stalne pripravnosti koje ih upisuju u Dnevnik zimske službe.
Ukoliko nastupi promjena meteoroloških prilika i uzrokuje uvjete na cesti drugačije od predviđenih, utvrđuje se promjena stupnja pripravnosti te se upisuje u Dnevnik zimske službe.
Nakon svake zaprimljene prognoze, Operativni stožer izvođača radova zimske službe određuje stupanj pripravnosti i o tome obavještava odgovornu osobu i nadzornog inženjera Hrvatskih cesta d.o.o..

Stupnjevi pripravnosti

Planirano vrijeme trajanja zimske službe predviđa se u razdoblju od 15.11.2026. do 15.04.2027., dok se stvarno vrijeme trajanja utvrđuje prema stvarnim meteorološkim prilikama, što određuje Operativni stožer izvoditelja u suradnji s Centrom zimske službe, ustrojenim na razini Tehničke ispostave Zagreb.

I. stupanj pripravnosti

Uvodi se početkom rada zimske službe.

Uvodi se dežurstvo u mjestima stalne pripravnosti, uspostavlja se stalna veza u skladu s programom rada te se osigurava potrebna količina mehanizacije, opreme i radne snage radi intervencije u slučaju potrebe.
Dežurne osobe u I. stupnju pripravnosti osposobljene su za hitnu intervenciju odnosno za hitno djelovanje angažmanom mehanizacije i radnika.
Dežurni u Operativnom stožeru izvoditelja, odgovorne osobe izvoditelja u mjestima stalne pripravnosti i ophodari dužni su za vrijeme svoga rada pratiti meteorološke prilike i oscilacije temperature zraka te pravovremeno organizirati obilazak cesta i njihovih kritičnih mjesta kao što su mostovi, nadvožnjaci, opasni zavoji, usponi te dionice cesta u usjecima i šumovitim predjelima.
Ukoliko dođe do promjene stanja kolnika i početka stvaranja poledice, izvoditelj je obvezan intervenirati odmah na licu mjesta ili organizirati obavljanje potrebnih radnji u najkraćem vremenskom roku.

II. stupanj pripravnosti

Uvodi se kad temperatura zraka oscilira oko 0° C, uz najavu slabih oborina (kiše, susnježice ili snijega) te se, s obzirom na stupanj pothlađenosti kolnika, može pojaviti poledica.
Obavljaju se preventivni radovi na sprječavanju poledice, a u slučaju oborina, po potrebi s obavlja i uklanjanje

snijega s kolnika.

III. stupanj pripravnosti

Uvodi se kad se prognoziraju dugotrajnije oborine koje zahtijevaju posebne i obimnije radove uklanjanja snijega s kolnika.
Po određenom redoslijedu obavljaju se radovi na posipavanju kolnika i čišćenju snijega, za što se aktivira sva planirana mehanizacija i radnici.

IV. stupanj pripravnosti

Uvodi se kad snježne oborine, uz jak vjetar imaju karakter elementarne nepogode i kad raspoloživi broj ljudi i mehanizacije nisu dovoljni za uklanjanje snijega.
U tim uvjetima, u pravilu se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu.
U IV. stupnju pripravnosti mobilizirat će se sva raspoloživa specijalizirana mehanizacija drugih poduzeća na području Tehničke ispostave Zagreb, a zbog što bržeg normaliziranja stanja, tj. postupa se kao u slučaju drugih elementarnih nepogoda (poplave, potres i sl.).
Ovaj stupanj pripravnosti nije obuhvaćen procijenjenim troškovima zimske službe.

Za potrebe Izvedbenog programa, a na temelju iskustva i višegodišnjih meteoroloških promatranja, stupnjevi pripravnosti vremenski se određuju na sljedeći način:

Redni broj	Županija	Šifra	Mjesto stalne pripravnosti	Datum početka	Datum završetka	Broj dana			
						Prvi stupanj pripravnosti	Drugi stupanj pripravnosti	Treći stupanj pripravnosti	Ukupno
1.	Zagrebačka	0101	Goričica	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
2.		0107	Jastrebarsko	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
3.		0106	NC Ivanić Grad	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
4.		0104	Samobor	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
5.		0102	Velika Gorica	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
6.		0105	Vrbovec	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
7.		0103	Zaprešić	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
8.	Krapinsko-zagorska	0212	Donja Stubica	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
9.		0201	Podgora Krapinska (Krapina)	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
10.		0202	Pregrada	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
11.		0211	Zabok	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145
12.		0203	Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	15.11.2024.	15.04.2025.	40	65	40	145

10. KRITIČNE DIONICE I MJERE OGRANIČENJA PROMETA

Kritične dionice cesta ili mjesta su lokacije ili dionice na kojima se mogu očekivati uvjeti koji zahtijevaju ograničenje i/ili zabranu prometa određena su na temelju dosadašnjeg iskustva.

10.1. Kritične dionice

Redni broj	Cesta	Dionica	Opis	Stacionaža	Ograničenje		Očekivani problem	Pretpostavljene mjere
					Rampe	Znakovi		

10.2. Rampe i prometni znakovi u privremenom svojstvu i snjegobrani

Popis lokacija na kojima se postavljaju rampe za ograničenje prometa:

Redni broj	Županija	Oznaka ceste	Oznaka dionice	Opis dionice	Stacionaža
1.					

Popis lokacija na kojima se postavljaju prometni znakovi u privremenom svojstvu:

Županija Zagrebačka

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
1.	Goričica	DC3	0009	3+150		X	A11				
2.		DC3	0009	3+200		X	B39				
3.		DC3	0009	4+108	X		B39				
4.		DC3	0009	4+437		X	B39				
5.		DC3	0009	7+027	X		A11				
6.		DC3	0009	7+027	X		B39				
7.		DC3	0009	9+700		X	A11				
8.		DC3	0010	10+198	X		A11				
9.		DC540	0101	0+040	X		A11				
10.		DC540	0101	5+260		X	A11				
11.		DC540	0101	5+280	X		A11				
12.		DC540	0101	6+100	X		B39				
13.	Velika Gorica	DC30	0001	0+930	X		A11				
14.		DC30	0001	0+930		X	A11				
15.		DC30	0001	1+780	X		A11				
16.		DC30	0001	1+780		X	A11				
17.		DC30	0001	3+415	X		A11				
18.		DC30	0001	3+415		X	A11				
19.		DC30	0001	4+950	X		A11				
20.		DC30	0001	4+950		X	A11				
21.		DC30	0002	4+320		X	A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
22.	Velika Gorica	DC30	0002	5+005	X		A11				
23.		DC30	0002	6+564		X	A11				
24.		DC30	0002	7+285	X		A11				
25.		DC30	0002	11+011		X	A11				
26.		DC30	0002	11+280	X		A11				
27.		DC30	0101	2+955	X		A11				
28.		DC30	0101	2+955		X	A11				
29.		DC30	0101	4+460	X		A11				
30.		DC30	0101	4+460		X	A11				
31.		DC30	0101	6+110	X		A11				
32.		DC30	0101	6+110		X	A11				
33.		DC30	0101	6+900	X		A11				
34.		DC30	0101	6+900		X	A11				
35.		DC31	0001	2+010	X		A11				
36.		DC31	0001	2+010		X	A11				
37.		DC31	0001	2+520		X	A11				
38.		DC31	0001	3+000		X	A11				
39.		DC31	0001	3+350		X	A11				
40.		DC31	0001	9+057		X	A11				
41.		DC31	0001	9+057		X	B39				
42.		DC31	0001	9+560	X		A11				
43.		DC31	0001	9+560	X		B39				
44.		DC31	0001	13+920		X	A11				
45.		DC31	0001	13+920		X	B39				
46.		DC31	0001	15+720		X	A11				
47.		DC31	0001	15+720		X	B39				
48.		DC31	0001	15+777		X	A11				
49.		DC31	0001	15+777		X	B39				
50.		DC31	0001	17+114	X		A11				
51.		DC31	0001	17+114	X		B39				
52.		DC31	0001	17+161		X	A11				
53.		DC31	0001	17+161		X	B39				
54.		DC31	0001	19+920	X		A11				
55.		DC31	0001	19+920	X		B39				
56.		DC31	0001	20+107		X	A11				
57.		DC31	0001	20+107		X	B39				
58.		DC31	0001	22+681	X		A11				
59.		DC31	0001	22+681	X		B39				
60.		DC31	0001	28+559		X	A11				
61.		DC31	0001	28+559		X	B39				
62.		DC31	0001	29+680	X		A11				
63.		DC31	0001	29+680	X		B39				
64.		DC31	0001	30+226		X	A11				
65.		DC31	0001	30+226		X	B39				
66.		DC31	0001	31+254	X		A11				
67.		DC31	0001	31+254	X		B39				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
68.	Velika Gorica	DC31	0001	31+284		X	A11				
69.		DC31	0001	31+284		X	B39				
70.		DC31	0002	2+695	X		A11				
71.		DC31	0002	2+695	X		B39				
72.		DC31	0002	3+623		X	A11				
73.		DC31	0002	50+560	X		B39				
74.		DC31	0002	50+600	X		A11				
75.		DC31	0101	0+580	X		A11				
76.		DC31	0101	0+580		X	A11				
77.		DC31	0101	0+958		X	A11				
78.		DC31	0101	0+985	X		A11				
79.		DC36	0002	2+554		X	A11				
80.		DC36	0002	2+554		X	B39				
81.		DC36	0002	3+682	X		A11				
82.		DC36	0002	3+682	X		B39				
83.		DC536	0001	0+709		X	A11				
84.		DC536	0001	0+791	X		A11				
85.	Zaprešić	DC1	0007	4+932		X	A11				
86.		DC1	0007	7+592		X	A11				
87.		DC1	0007	7+664	X		A11				
88.		DC1	0007	9+150		X	A11				
89.		DC1	0007	9+350	X		A11				
90.		DC1	0007	10+359		X	A11				
91.		DC1	0007	12+300		X	A11				
92.		DC1	0007	12+646	X		A11				
93.		DC1	0007	13+295		X	A11				
94.		DC1	0007	15+353		X	A11				
95.		DC1	0007	16+608	X		A11				
96.		DC1	0007	17+031		X	A11				
97.		DC1	0007	17+709		X	A11				
98.		DC1	0007	18+223		X	A11				
99.		DC1	0107	0+000		X	A11				
100.		DC1	0107	1+293		X	A11				
101.		DC1	0107	1+807		X	A11				
102.		DC1	0107	2+485		X	A11				
103.		DC225	0001	0+000		X	A11				
104.		DC225	0001	12+800	X		A11				
105.		DC225	0001	13+539		X	A11	E13-1			
106.		DC225	0001	13+927		X	A11				
107.		DC225	0001	15+010	X		A11				
108.		DC225	0201	1+690		X	A11				
109.	Samobor	DC1	0008	0+353		X	A11				
110.		DC1	0008	0+824	X		A11				
111.		DC1	0008	1+268		X	A11				
112.		DC1	0008	3+068	X		A11				
113.		DC1	0008	7+345		X	A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
114.	Samobor	DC1	0008	8+052	X		A11				
115.		DC1	0008	8+230		X	A11				
116.		DC1	0008	9+880	X		A11				
117.		DC1	0008	10+000		X	A11				
118.		DC1	0008	10+738	X		A11				
119.		DC1	0008	10+954		X	A11				
120.		DC1	0008	12+071	X		A11				
121.		DC1	0008	12+175		X	A11				
122.		DC1	0008	15+105	X		A11				
123.		DC1	0008	15+373		X	A11				
124.		DC1	0008	15+903	X		A11				
125.		DC231	0001	0+532		X	A11				
126.		DC231	0001	0+931	X		A11				
127.		DC231	0001	1+223		X	A11				
128.		DC231	0001	2+609	X		A11				
129.		DC231	0001	2+807		X	A11				
130.		DC231	0001	4+056	X		A11				
131.		DC231	0001	4+135		X	A11				
132.		DC231	0001	4+441	X		A11				
133.		DC231	0001	7+007		X	A11				
134.		DC231	0001	8+776	X		A11				
135.		DC231	0001	10+397		X	A11				
136.		DC231	0001	10+880	X		A11				
137.		DC546	0001	0+020		X	A11				
138.		DC546	0001	1+800		X	A11				
139.		DC546	0001	1+810		X	A11				
140.		DC546	0001	4+820	X		A11				
141.		DC546	0001	4+930		X	A11				

Županija Krapinsko-zagorska

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
1.	Podgora Krapinska (Krapina)	DC1	0001	0+095		X	A11				
2.		DC1	0001	0+095		X	B39				
3.		DC1	0001	1+010	X		A11				
4.		DC1	0001	1+010	X		B39				
5.		DC1	0001	1+250		X	A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
6.	Podgora Krapinska (Krapina)	DC1	0001	1+250		X	B39				
7.		DC1	0001	5+180		X	A11				
8.		DC1	0001	5+180		X	B39				
9.		DC1	0001	5+450	X		A11				
10.		DC1	0001	5+450	X		B39				
11.		DC1	0001	6+150	X		A11				
12.		DC1	0001	6+150	X		B39				
13.		DC1	0002	2+310	X		B39				
14.		DC1	0002	2+310	X		A11				
15.		DC1	0003	0+620		X	A11				
16.		DC1	0003	0+620		X	B39				
17.		DC1	0003	2+710	X		A11				
18.		DC1	0003	2+710	X		B39				
19.		DC1	0003	2+880		X	A11				
20.		DC1	0003	2+880		X	B39				
21.		DC1	0003	5+230	X		A11				
22.		DC1	0003	5+230	X		B39				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
23.	Podgora Krapinska (Krapina)	DC1	0003	5+580		X	A11				
24.		DC1	0003	5+580		X	B39				
25.		DC1	0003	6+850	X		A11				
26.		DC1	0003	6+850	X		B39				
27.		DC1	0003	9+000		X	A11				
28.		DC1	0003	10+250	X		A11				
29.		DC1	0004	0+167		X	A11				
30.		DC1	0004	2+240	X		A11				
31.		DC1	0004	2+564		X	A11				
32.		DC1	0004	4+287	X		A11				
33.		DC1	0004	4+363		X	A11				
34.		DC1	0004	4+932	X		A11				
35.		DC1	0004	4+995		X	A11				
36.		DC1	0004	5+569	X		A11				
37.		DC1	0004	5+630		X	A11				
38.		DC1	0004	5+993	X		A11				
39.		DC1	0004	6+091		X	A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
40.	Podgora Krapinska (Krapina)	DC1	0004	6+841	X		A11				
41.		DC1	0004	6+896		X	A11				
42.		DC1	0004	7+280	X		A11				
43.		DC35	0002	11+568		X	B39				
44.		DC35	0002	11+568		X	A11				
45.		DC35	0002	12+344	X		B39				
46.		DC35	0002	12+344	X		A11				
47.		DC35	0002	12+430		X	B39				
48.		DC35	0002	12+430		X	A11				
49.		DC35	0002	17+386	X		B39				
50.		DC35	0002	17+386	X		A11				
51.		DC35	0002	17+611		X	A11				
52.		DC35	0002	19+590	X		A11				
53.		DC74	0001	0+300		X	A10	E13-1			
54.		DC74	0001	2+100	X		A10	E13-1			
55.		DC74	0001	2+250		X	A11				
56.		DC74	0001	2+250		X	B39				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
57.	Podgora Krapinska (Krapina)	DC74	0001	11+350	X		A11				
58.		DC74	0001	11+350	X		B39				
59.		DC207	0001	0+208		X	A11				
60.		DC207	0001	1+823		X	B39				
61.		DC207	0001	1+823		X	A11				
62.		DC207	0001	3+289	X		B39				
63.		DC207	0001	3+289	X		A11				
64.		DC207	0001	3+499		X	B39				
65.		DC207	0001	3+499		X	A11				
66.		DC207	0001	8+357	X		B39				
67.		DC207	0001	8+357	X		A11				
68.		DC207	0001	8+570		X	B39				
69.		DC207	0001	8+570		X	A11				
70.		DC207	0001	11+214	X		B39				
71.		DC207	0001	11+214	X		A11				
72.		DC207	0001	13+663	X		B39				
73.		DC207	0001	13+663	X		A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
74.	Podgora Krapinska (Krapina)	DC207	0001	13+774		X	A11				
75.		DC207	0001	14+330	X		A11				
76.	Pregrada	DC206	0001	0+525		X	B39				
77.		DC206	0001	0+525		X	A10	E13-1			
78.		DC206	0001	2+150	X		B39				
79.		DC206	0001	2+150	X		A10	E13-1			
80.		DC206	0001	2+225		X	B39				
81.		DC206	0001	2+225		X	A10	E13-1			
82.		DC206	0001	4+725	X		B39				
83.		DC206	0001	4+725	X		A10	E13-1			
84.		DC206	0001	4+825		X	A10	E13-1			
85.		DC206	0001	7+367	X		A11				
86.		DC206	0001	7+367	X		B39				
87.		DC206	0001	7+470		X	A10	E13-1			
88.		DC206	0001	11+050	X		A10	E13-1			
89.		DC206	0001	14+592	X		A10	E13-1			
90.		DC206	0001	14+692		X	A10	E13-1			
91.		DC206	0001	15+800	X		A11				
92.		DC206	0002	0+100		X	A11				
93.		DC206	0002	0+321	X		A11				
94.		DC206	0002	0+370		X	A11				
95.		DC206	0002	0+700	X		A11				
96.		DC206	0002	0+830		X	B39				
97.		DC206	0002	0+830		X	A11				
98.		DC206	0002	3+500	X		B39				
99.		DC206	0002	3+500	X		A11				
100.		DC206	0002	3+600		X	B39				
101.		DC206	0002	3+600		X	A11				
102.		DC206	0002	4+300		X	A10	E13-1			
103.		DC206	0002	4+450	X		A10	E13-1			
104.		DC206	0002	10+080	X		B39				
105.		DC206	0002	10+080	X		A11				
106.		DC206	0002	10+280		X	B39				
107.		DC206	0002	10+280		X	A11				
108.		DC206	0002	11+600	X		B39				
109.		DC206	0002	11+600	X		A11				
110.		DC229	0001	0+060		X	A11				
111.		DC229	0001	0+060		X	B39				
112.		DC229	0001	1+120	X		A11				
113.		DC229	0001	1+200		X	A11				
114.		DC229	0001	1+200		X	B39				
115.		DC229	0001	3+530	X		A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
116.	Pregrada	DC229	0001	3+530	X		B39				
117.		DC229	0001	3+560		X	A11				
118.		DC229	0001	7+100	X		A11				
119.		DC229	0001	7+200		X	A11				
120.		DC229	0001	13+600	X		A11				
121.		DC229	0001	13+650		X	A11				
122.		DC229	0001	16+410	X		A11				
123.		DC229	0001	16+510		X	A11				
124.		DC229	0001	17+520	X		A11				
125.		DC233	0002	1+100		X	A11				
126.		DC233	0002	1+300	X		A11				
127.	Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	DC24	0001	0+010		X	A11				
128.		DC24	0001	6+480	X		A11				
129.		DC24	0001	6+520		X	A11				
130.		DC24	0001	7+805	X		A11				
131.		DC24	0001	7+965		X	A11				
132.		DC24	0001	14+435	X		A11				
133.		DC24	0001	14+488		X	A11				
134.		DC24	0001	16+928	X		A11				
135.		DC24	0001	17+006		X	A11				
136.		DC24	0001	22+407	X		A11				
137.		DC29	0001	0+009		X	A11				
138.		DC29	0001	1+439		X	B39				
139.		DC29	0001	1+557	X		A11				
140.		DC29	0001	3+812	X		B39				
141.		DC29	0001	4+593		X	A11				
142.		DC29	0001	11+507	X		A11				
143.		DC29	0001	11+562		X	A11				
144.		DC29	0001	12+351	X		A11				
145.		DC29	0001	12+776		X	A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
146.	Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	DC29	0001	14+516	X		A11				
147.		DC29	0001	14+838		X	A11				
148.		DC29	0001	15+974	X		A11				
149.		DC29	0001	17+095		X	A11				
150.		DC29	0001	21+127	X		A11				
151.		DC29	0001	22+235		X	A11				
152.		DC29	0001	25+729	X		A11				
153.		DC35	0002	4+260		X	A11				
154.		DC35	0002	6+309	X		A11				
155.		DC35	0002	6+480		X	A11				
156.		DC35	0002	6+480		X	B39				
157.		DC35	0002	10+612	X		A11				
158.		DC35	0002	10+612	X		B39				
159.		DC35	0002	10+812		X	A11				
160.		DC35	0002	10+812		X	B39				
161.		DC35	0002	11+430	X		A11				
162.		DC35	0002	11+430	X		B39				
163.		DC540	0001	0+030		X	A11				
164.		DC540	0001	4+562	X		A11				
165.		DC540	0001	4+721		X	A11				
166.		DC540	0001	4+721		X	B39				
167.		DC540	0001	5+128	X		A11				
168.		DC540	0001	5+128	X		B39				
169.	Zabok	DC1	0004	2+900		X	A11				
170.		DC1	0004	5+100	X		A11				
171.		DC1	0004	5+250		X	A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
172.	Zabok	DC1	0004	5+400	X		A11				
173.		DC1	0005	0+000		X	A11				
174.		DC1	0005	2+100	X		A11				
175.		DC1	0005	2+200		X	A11				
176.		DC1	0005	2+500		X	A11				
177.		DC1	0005	4+500		X	A11				
178.		DC1	0005	4+600	X		A11				
179.		DC1	0005	5+400		X	A11				
180.		DC1	0005	5+500	X		A11				
181.		DC1	0005	5+950	X		A11				
182.		DC1	0006	0+050		X	A11				
183.		DC1	0006	1+300		X	A11				
184.		DC1	0006	1+600	X		A11				
185.		DC1	0006	2+500	X		A11				
186.		DC1	0006	2+600		X	A11				
187.		DC1	0006	3+400	X		A11				
188.		DC1	0006	3+500		X	A11				
189.		DC1	0006	4+700	X		A11				
190.		DC1	0007	0+020		X	A11				
191.		DC1	0007	0+120	X		A11				
192.		DC1	0007	0+150		X	A11				
193.		DC1	0007	2+750	X		A11				
194.		DC1	0007	2+850		X	A11				
195.		DC1	0007	4+750	X		A11				
196.		DC14	0001	0+050	X		A11				
197.		DC14	0001	9+800		X	A11				
198.		DC14	0001	10+100		X	A11				
199.		DC14	0001	10+300	X		A11				
200.		DC14	0001	10+500		X	A11				
201.		DC14	0001	11+250	X		A11				
202.		DC507	0001	0+020		X	A11				
203.		DC507	0001	1+250	X		A11				
204.		DC507	0001	1+300		X	A11				
205.		DC507	0001	4+300	X		A11				
206.		DC507	0001	4+400		X	A11				
207.		DC507	0001	5+300	X		A11				
208.		DC507	0001	5+350		X	A11				
209.		DC507	0001	6+500	X		A11				
210.		DC507	0001	6+650		X	A11				
211.		DC507	0001	7+600	X		A11				
212.		DC507	0001	7+800		X	A11				
213.		DC507	0001	9+500	X		A11				
214.	Donja Stubica	DC29	0001	26+100		X	A11				
215.		DC29	0001	27+050	X		A11				
216.		DC29	0001	27+300		X	A11				
217.		DC29	0001	28+900	X		A11				

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
218.	Donja Stubica	DC29	0001	29+000		X	A11				
219.		DC29	0001	29+000		X	B39				
220.		DC29	0001	30+450	X		A11				
221.		DC29	0001	30+450	X		B39				
222.		DC29	0001	30+500		X	A11				
223.		DC29	0001	30+500		X	B39				
224.		DC29	0001	35+900	X		A11				
225.		DC29	0001	35+900	X		B39				
226.		DC29	0001	36+200		X	A11				
227.		DC29	0001	36+200		X	B39				
228.		DC307	0001	0+500		X	A11				
229.		DC307	0001	1+150		X	B39				
230.		DC307	0001	1+150		X	A11				
231.		DC307	0001	1+600	X		A11				
232.		DC307	0001	2+900		X	B39				
233.		DC307	0001	2+900		X	A11				
234.		DC307	0001	3+100	X		B39				
235.		DC307	0001	3+100	X		A11				
236.		DC307	0001	3+900		X	A11				
237.		DC307	0001	4+400	X		A11				
238.		DC307	0001	5+300		X	B39				
239.		DC307	0001	5+300		X	A11				
240.		DC307	0001	6+100	X		B39				
241.		DC307	0001	6+100	X		A11				
242.		DC307	0001	6+800		X	A11				
243.		DC307	0001	7+300	X		A11				
244.		DC307	0001	10+100		X	A11				
245.		DC307	0001	12+100	X		A11				
246.		DC307	0001	13+000		X	B39				
247.		DC307	0001	13+000		X	A11				
248.		DC307	0001	14+900		X	B39				
249.		DC307	0001	14+900		X	A11				
250.		DC307	0001	15+500		X	A11				
251.		DC307	0001	15+900	X		B39				
252.		DC307	0001	15+900	X		A11				
253.		DC307	0001	17+450		X	B39				
254.		DC307	0001	17+450		X	A11				
255.		DC307	0001	17+550		X	B39				
256.		DC307	0001	17+550		X	A11				
257.		DC307	0001	19+500	X		B39				
258.		DC307	0001	19+500	X		A11				
259.		DC307	0001	22+500	X		B39				
260.		DC307	0001	22+500	X		A11				

Županija Grad Zagreb

Redni broj	Mjesto pripravnosti	Državna cesta		Stacionaža znaka	Strana ceste		Oznaka znaka	Dopunska ploča			Napomena
		Broj	Dionica		L	D		Oznaka	Oznaka	Sadržaj	
1.	Goričica	DC29	0001	35+755		X	A11				
2.		DC29	0001	35+755		X	B39				
3.		DC29	0001	40+577	X		B39				
4.		DC29	0001	49+710	X		A11				
5.	Zaprešić	DC225	0101	0+329		X	A11				

Popis lokacija na kojima se postavljaju snjegobrani:

10.3. Popis opasnih mjesta na kojima se vrše obvezni preventivni radovi za sprječavanje nastanka poledice u II stupnju pripravnosti

Mjesto pripravnosti	Oznaka ceste	Stacionaža	Dionica	Napomena
Goričica	DC3	3+100 - 7+000	0009	Uzdužni nagib veći od 4%
	DC29	28+000 - 41+000	0001	Uzdužni nagib veći od 4%
Velika Gorica	DC30	4+660 - 4+665	0001	Nadvožnjak
	DC30	4+800 - 4+805	0002	Nadvožnjak
	DC30	6+800 - 6+805	0002	Nadvožnjak
	DC31	2+300 - 2+305	0001	Nadvožnjak
	DC31	3+300 - 3+500	0001	Most
	DC31	9+200 - 31+000	0001	Uzdužni nagib veći od 4%
	DC31	0+000 - 3+500	0002	Uzdužni nagib veći od 4%
	DC36	40+185 - 41+350	0001	Uzdužni nagib veći od 4%
	DC36	0+000 - 5+600	0002	Uzdužni nagib veći od 4%
Zaprešić	DC1	14+000 - 17+000	0007	Krivina polumjera manjeg od 300m
	DC225	3+500 - 5+000	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m
	DC225	11+500 - 11+505	0001	Pružni prijelaz
	DC225	13+000 - 13+005	0001	Most
Samobor	DC1	14+000 - 15+100	0008	Uzdužni nagib veći od 4%
	DC1	10+000 - 12+500	0008	Usjek, Uzdužni nagib veći od 4%
Vrbovec	DC10	0+580 - 0+690	0001	Propust
	DC10	1+120 - 1+250	0001	Propust
	DC10	1+745 - 1+750	0001	Most
	DC10	3+800 - 3+805	0001	Propust
	DC10	0+400 - 0+405	0002	Most
	DC10	2+050 - 2+055	0002	Most
	DC26	0+130 - 0+135	0001	Nadvožnjak
	DC26	0+720 - 0+725	0001	Most
	DC26	1+790 - 1+795	0001	Most
	DC26	2+230 - 2+300	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most
	DC26	2+880 - 2+885	0001	Most
	DC26	3+880 - 4+450	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m
	DC26	4+780 - 5+180	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most

Mjesto pripravnosti	Oznaka ceste	Stacionaža	Dionica	Napomena
Vrbovec	DC26	6+500 - 6+730	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most
	DC26	7+370 - 8+100	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m
	DC26	8+650 - 8+655	0001	Raskrižje
	DC10	0+830 - 0+920	0003	Most
	DC10	3+870 - 3+980	0003	Most
	DC10	0+760 - 0+780	0003	Propust
	DC10	0+120 - 0+150	0003	Most
	DC10	1+640 - 1+660	0003	Most
	DC10	6+450 - 6+770	0003	Most, Propust
Jastrebarsko	DC1	15+722 - 17+350	0008	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most, Raskrižje, Uzdužni nagib veći od 4%
	DC1	18+600 - 18+800	0008	Most, Prilaz benzinskoj postaji
	DC1	19+300 - 19+800	0008	Uzdužni nagib veći od 4%
	DC1	20+800 - 21+500	0008	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most, Uzdužni nagib veći od 4%
	DC1	22+800 - 24+000	0008	Uzdužni nagib veći od 4%
	DC1	25+000 - 25+500	0008	Raskrižje, Uzdužni nagib veći od 4%
	DC1	0+100 - 0+300	0008	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most
	DC1	5+100 - 6+000	0008	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most, Prilaz benzinskoj postaji
	DC310	0+300 - 0+450	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m
	DC310	1+100 - 1+200	0001	Pružni prijelaz
	DC310	2+100 - 2+300	0001	Prilaz benzinskoj postaji
	DC310	3+000 - 3+653	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most, Raskrižje
	DC36	22+300 - 22+600	0001	Nadvožnjak
	DC36	23+850 - 24+000	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most
	DC36	25+200 - 25+300	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m
	DC36	25+700 - 26+000	0001	Prilaz benzinskoj postaji
	DC36	26+800 - 27+100	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most
	DC36	28+450 - 28+750	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most
	DC36	30+100 - 30+150	0001	Most
	DC36	30+900 - 31+050	0001	Kružni tok
	DC36	34+800 - 35+150	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m
	DC36	35+800 - 36+800	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Most
	DC36	39+000 - 40+000	0001	Krivina polumjera manjeg od 300m, Uzdužni nagib veći od 4%
	DC36	40+800 - 40+850	0001	Most
Krapina	DC1	0+122 - 0+500	0001	Most, Raskrižje
	DC1	0+690 - 1+400	0001	Most, Raskrižje, Ulaz i izlaz tunela
	DC1	2+050 - 2+080	0001	Most

Mjesto pripravnosti	Oznaka ceste	Stacionaža	Dionica	Napomena
Krapina	DC1	2+320 - 2+715	0001	Most, Ulaz i izlaz tunela
	DC1	4+700 - 5+500	0001	Nadvožnjak, Raskrižje, Zasjek
	DC1	0+460 - 0+510	0002	Most
	DC1	0+720 - 1+230	0002	Most, Ulaz i izlaz tunela
	DC1	0+420 - 0+450	0003	Most
	DC1	0+760 - 0+830	0003	Most
	DC1	1+620 - 2+022	0003	Most
	DC1	2+520 - 2+840	0003	Most, Raskrižje
	DC1	0+000 - 2+965	0003	Most
	DC1	0+000 - 2+965	0003	Nadvožnjak, Ulaz i izlaz tunela
	DC1	0+000 - 2+965	0003	Nadvožnjak, Prilaz benzinskoj postaji, Raskrižje
	DC1	0+000 - 2+965	0003	Kružni tok, Most
	DC1	0+000 - 2+965	0003	Most
	DC1	0+000 - 2+965	0003	Kružni tok, Most
	DC1	0+800 - 1+020	0004	Most, Raskrižje, Zavoj
	DC1	5+100 - 5+394	0004	Kružni tok, Prilaz benzinskoj postaji, Raskrižje
	DC35	19+480 - 19+590	0002	Zavoj
	DC35	17+990 - 18+200	0002	Most, Šuma, Zavoj
	DC35	10+680 - 12+380	0002	Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC207	2+000 - 2+700	0001	Šuma, Usjek, Zavoj
	DC207	4+000 - 5+800	0001	Šuma, Usjek, Zavoj
	DC207	8+360 - 9+900	0001	Prilaz benzinskoj postaji, Raskrižje, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC207	11+500 - 12+030	0001	Šuma, Zavoj
	DC207	13+100 - 14+515	0001	Kružni tok, Nadvožnjak, Zavoj
	DC74	0+000 - 0+085	0001	Kružni tok, Pružni prijelaz
	DC74	0+580 - 1+780	0001	Šuma, Zavoj
	DC74	2+330 - 2+360	0001	Pružni prijelaz
	DC74	2+630 - 4+200	0001	Šuma, Zavoj
	DC74	4+890 - 11+000	0001	Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC206	1+000 - 4+200	0001	Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC206	5+800 - 6+200	0001	Most, Zavoj
	DC206	7+500 - 8+500	0001	Zavoj
	DC206	10+000 - 11+500	0001	Šuma, Zavoj
	DC206	0+000 - 0+760	0002	Raskrižje, Zavoj
	DC206	6+000 - 11+500	0002	Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zasjek, Zavoj
	DC206	11+500 - 12+715	0002	Kružni tok, Most, Pružni prijelaz, Raskrižje, Zavoj
	DC229	0+250 - 1+400	0001	Raskrižje, Zavoj
	DC229	9+700 - 12+300	0001	Šuma, Zavoj
	DC229	13+950 - 14+450	0001	Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%
	DC229	23+650 - 23+800	0001	Uzdužni nagib veći od 4%
Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	DC29	1+200 - 3+500	0001	Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj

Mjesto pripravnosti	Oznaka ceste	Stacionaža	Dionica	Napomena
Zlatar Bistrica (ŽCZŽ)	DC29	4+450 - 4+460	0001	Propust
	DC29	11+150 - 12+100	0001	Zavoj
	DC29	9+260 - 9+600	0001	Most, Zavoj
	DC29	14+480 - 15+330	0001	Prilaz benzinskoj postaji, Raskrižje, Zavoj
	DC29	17+190 - 17+300	0001	Prilaz benzinskoj postaji
	DC29	21+150 - 21+250	0001	Raskrižje
	DC29	22+070 - 22+500	0001	Most, Pružni prijelaz, Raskrižje, Zavoj
	DC29	23+270 - 23+450	0001	Most, Zavoj
	DC29	26+160 - 26+170	0001	Propust
	DC29	27+330 - 27+630	0001	Most, Raskrižje
	DC29	28+030 - 28+100	0001	Prilaz benzinskoj postaji
	DC29	29+310 - 29+330	0001	Most
	DC29	29+920 - 29+930	0001	Propust
	DC29	31+400 - 34+600	0001	Propust, Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC29	35+700 - 36+488	0001	Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC35	7+000 - 10+670	0002	Krivina polumjera manjeg od 300m, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC35	6+350 - 6+380	0002	Pružni prijelaz
	DC540	0+530 - 0+560	0001	Pružni prijelaz
	DC540	0+810 - 0+840	0001	Most
	DC540	1+000 - 1+100	0001	Zavoj
	DC540	2+640 - 2+740	0001	Zavoj
	DC540	4+640 - 5+300	0001	Raskrižje, Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
Zabok	DC14	0+000 - 0+600	0001	Kružni tok
	DC14	8+880 - 8+973	0001	Kružni tok, Most, Nadvožnjak, Raskrižje, Zavoj
	DC1	0+500 - 1+000	0005	Kružni tok
	DC1	1+870 - 2+030	0005	Zavoj
	DC1	2+250 - 3+380	0005	Most, Nadvožnjak, Raskrižje
	DC1	8+620 - 8+725	0005	Kružni tok
	DC1	0+160 - 0+630	0006	Nadvožnjak, Raskrižje
	DC1	0+000 - 3+454	0006	Kružni tok
	DC1	2+810 - 3+000	0006	Most, Prilaz benzinskoj postaji
	DC1	2+070 - 2+100	0006	Most
	DC1	0+000 - 0+650	0007	Kružni tok, Most, Prilaz benzinskoj postaji
	DC1	2+520 - 2+900	0007	Prilaz benzinskoj postaji, Raskrižje
	DC1	4+600 - 4+880	0007	Raskrižje
	DC24	0+970 - 1+050	0001	Raskrižje
	DC24	2+560 - 2+580	0001	Most
	DC24	5+225 - 5+235	0001	Propust
	DC24	5+630 - 5+640	0001	Propust
	DC24	6+030 - 6+050	0001	Most
	DC24	7+510 - 7+530	0001	Most

Mjesto pripravnosti	Oznaka ceste	Stacionaža	Dionica	Napomena
Zabok	DC24	7+880 - 7+890	0001	Most
	DC24	8+015 - 8+025	0001	Propust
	DC24	8+760 - 32+469	0001	Raskrižje
	DC205	0+000 - 0+600	0001	Raskrižje
	DC205	1+000 - 1+250	0001	Zavoj
	DC205	1+790 - 1+800	0001	Propust
	DC205	2+140 - 2+230	0001	Prilaz benzinskoj postaji
	DC205	4+600 - 6+100	0001	Most, Raskrižje, Zavoj
	DC205	7+100 - 9+670	0001	Most, Nadvožnjak, Propust, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC205	11+220 - 11+240	0001	Propust
	DC205	11+630 - 13+420	0001	Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC205	13+420 - 13+500	0001	Most
	DC205	13+660 - 13+940	0001	Prilaz benzinskoj postaji, Raskrižje
	DC205	13+940 - 13+960	0001	Propust
	DC205	14+770 - 15+250	0001	Raskrižje, Zavoj
	DC205	20+715 - 21+750	0001	Raskrižje, Zavoj
	DC205	22+320 - 22+680	0001	Most, Propust, Raskrižje
	DC205	23+700 - 23+830	0001	Kružni tok
	DC205	24+190 - 24+493	0001	Kružni tok, Nadvožnjak
	DC507	0+490 - 0+520	0001	Most
	DC507	0+870 - 0+890	0001	Most
	DC507	1+230 - 1+490	0001	Zavoj
	DC507	4+440 - 4+460	0001	Most
	DC507	7+200 - 7+700	0001	Most, Raskrižje, Zavoj
	DC507	9+240 - 9+370	0001	Raskrižje
	DC507	12+720 - 12+760	0001	Most
	DC507	13+300 - 13+400	0001	Prilaz benzinskoj postaji
	DC507	15+400 - 15+440	0001	Most
	DC507	15+550 - 15+638	0001	Raskrižje
Donja Stubica	DC307	0+000 - 0+440	0001	Kružni tok
	DC307	0+640 - 0+670	0001	Most
	DC307	1+300 - 1+600	0001	Zavoj
	DC307	1+900 - 2+000	0001	Šuma, Zavoj
	DC307	3+040 - 3+350	0001	Uzdužni nagib veći od 4%
	DC307	3+560 - 3+650	0001	Kružni tok
	DC307	4+430 - 4+570	0001	Kružni tok
	DC307	4+930 - 4+940	0001	Propust
	DC307	5+630 - 6+470	0001	Raskrižje, Zavoj
	DC307	6+550 - 6+570	0001	Most
	DC307	7+200 - 7+270	0001	Propust, Pružni prijelaz
	DC307	7+645 - 7+660	0001	Propust
	DC307	8+460 - 8+475	0001	Propust
	DC307	8+580 - 8+630	0001	Pružni prijelaz
	DC307	9+670 - 9+690	0001	Most
	DC307	10+580 - 10+700	0001	Propust, Pružni prijelaz

Mjesto pripravnosti	Oznaka ceste	Stacionaža	Dionica	Napomena
Donja Stubica	DC307	11+890 - 11+910	0001	Propust
	DC307	12+280 - 12+300	0001	Pružni prijelaz
	DC307	12+850 - 12+870	0001	Most
	DC307	14+500 - 15+900	0001	Raskrižje, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC307	16+020 - 16+030	0001	Most
	DC307	16+715 - 16+725	0001	Propust
	DC307	17+240 - 17+330	0001	Propust, Zavoj
	DC307	18+120 - 19+160	0001	Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC307	20+190 - 22+720	0001	Most, Raskrižje, Šuma, Uzdužni nagib veći od 4%, Zavoj
	DC307	23+330 - 23+340	0001	Propust
	DC307	23+580 - 23+794	0001	Raskrižje

11. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIH VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA

11.1. Uvjeti kad se zbog sigurnosti prometa on ograničava ili zabranjuje za sva ili za pojedine vrste vozila

Zbog vremenskih pojava koje bitno utječu na sigurnost odvijanja prometa, kao što je olujni vjetar, ledena kiša, snijeg nošen olujnim vjetrom koji stvara snježne zapuhe, obilna i dugotrajna kiša koja izaziva bujično tečenje vode ili izlijevanja vodotoka iz korita preko kolnika, na temelju članka 5. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste („Narodne novine“ broj 119/07) i u svezi s člankom 60. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 145/24), pravna osoba koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionar ovlašteni su zatvoriti javnu cestu za promet pojedinih kategorija ili svih vozila. O tome je nužno obavijestiti nadležne službe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nadležnu policijsku upravu i javnost. Odluku o ograničenju prometa za pojedine vrste ili za sva vozila može donijeti izvoditelj radova, uz suglasnost odgovorne osobe Hrvatskih cesta d.o.o.

Na pojedinim dionicama državnih cesta, može se donijeti odluka o:

1. zabrani prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu,
2. zabrani prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje,
3. zabrani prometa za pojedine vrste vozila,
4. zabrani prometa za sva vozila.

Preduvjet za ograničavanje ili zabranu prometa, u kontekstu zimske službe, je nastajanje zimskih uvjeta na cesti. Zimski uvjeti, Sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23, 145/24), su takvi uvjeti kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Sukladno članku 3. Pravilnika, pod zatvaranjem javne ceste smatra se uspostava zabrane ili ograničenja prometa svih ili pojedinih vrsta vozila na određenoj javnoj cesti ili dijelu javne ceste za određene dane ili u određenom vremenskom razdoblju.

U zimskim uvjetima na snagu stupa zabrana prometa za vozila na motorni pogon koja nemaju propisanu zimsku opremu i za teretna vozila s priključnim vozilom.

U takvim slučajevima, svaki vozač dužan je isključiti svoje vozilo iz prometa ako mu vozilo nema propisanu opremu ili ako upravlja teretnim automobilom s priključnim vozilom.

Nadzor propisanih mjera uvijek provode službenici nadležne policijske uprave.

Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t, sukladno članku 104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama („Narodne novine“ broj 85/16, 24/17, 70/19, 60/20, 79/23 i 6/25) smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima i s lancima za snijeg ili uređajima namijenjenima za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 t sukladno Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Zimskom opremom autobusa sukladno Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.

Lanci za snijeg i uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće moraju biti tipno odobreni.

Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicima javnih cesta u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 121/20, 143/23 i 36/25) određuje se obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15.11. tekuće godine do 15.4. iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Izvoditelj radova će poduzeti mjere da se, u skladu s utvrđenim prioritetima održavanja cesta i mogućnostima, uklone smetnje i državna cesta, ili pojedina njezina dionica, što brže osposobi za siguran promet.

U slučaju prekida prometa za sve ili pojedine kategorije vozila, privremeno će se osposobiti mjesta za njihovo isključivanje.

U slučaju da se neko vozilo zatekne između predviđenih mjesta za parkiranje, izvoditelj će osposobiti odgovarajuće parkiralište ispred nekog ugostiteljskog objekta ili slično.


11.2. Mjesta za isključivanje vozila

Popis mjesta za isključivanje vozila s kartama daje se u tablici u nastavku.

Popis mjesta za isključivanje vozila na području županije Krapinsko-zagorska:


Redni broj	Broj ceste	Dionica	Naziv mjesta	Broj parkirališnih mjesta za teretna vozila	Broj parkirališnih mjesta za tegljače	Prenoćište, restoran	Ostali prateći sadržaji
				(kom)		(DA/NE)	(DA/NE)
1.	DC1	Krapina (DC206) - Velika Ves (A2)	Motel Krapina, odmaralište	30	0	NE	NE

Karta s pregledom mjesta za isključivanje vozila na području županije Krapinsko-zagorska:

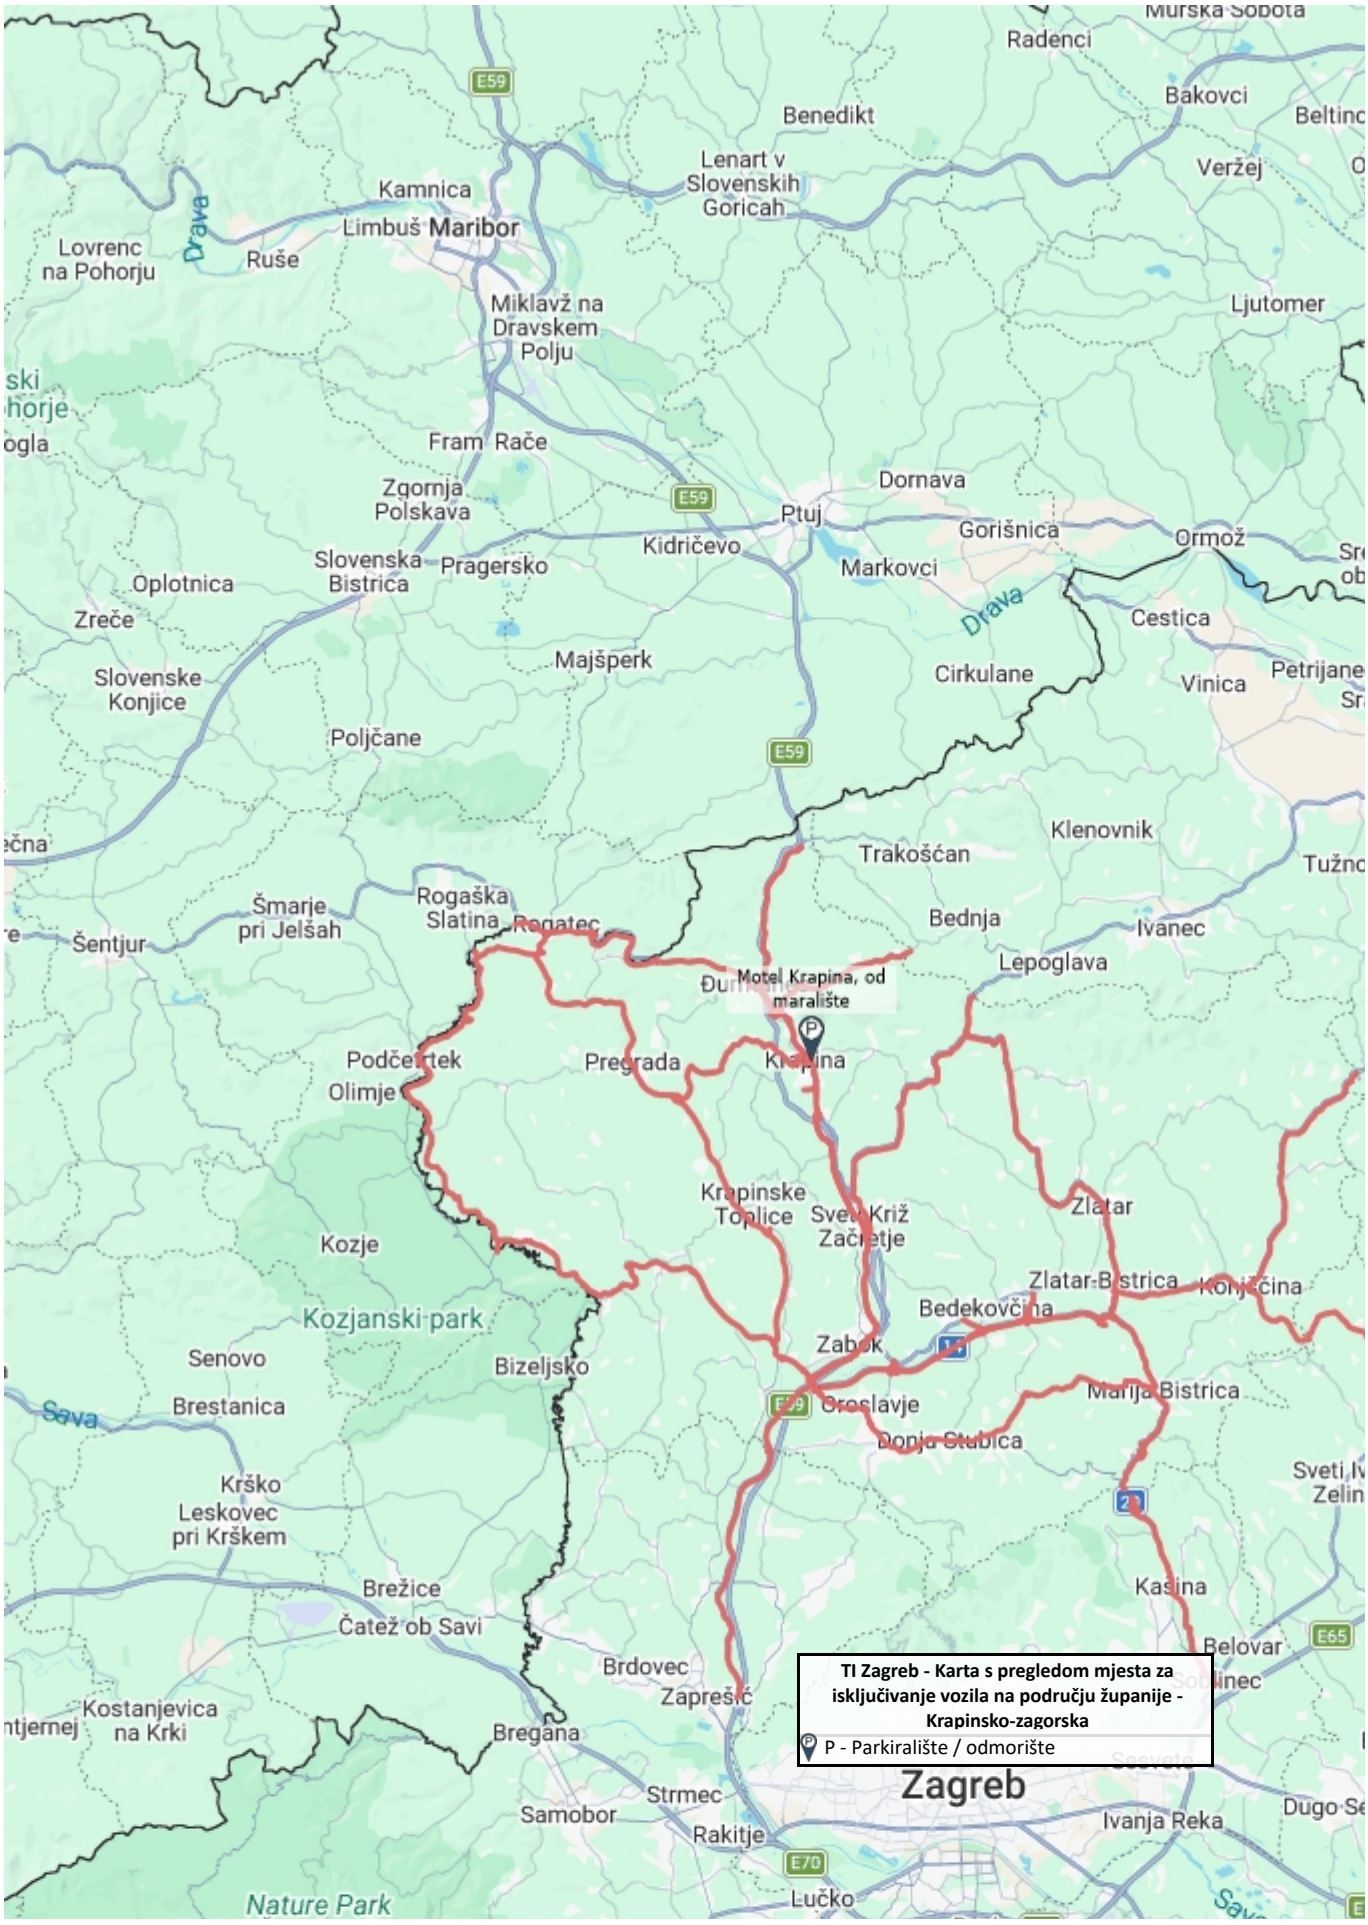
Murska Sobota
Radenci
Bakovci
Benedikt
Lenart v Slovenskih Goricah
Veržej
Kamnica
Limbuš
Maribor
Drava
Lovrenc na Pohorju
Ruše
Miklavž na Dravskem Polju
Ljutomer
Fram
Rače
Zgornja Polskava
Dornava
Ptuj
Gorišnica
Ormož
Kidričevo
Slovenska Bistrica
Pragersko
Markovci
Oplotnica
Zreče
Cestica
Majšperk
Cirkulane
Vinica
Slovenske Konjice
Poljčane
Klenovnik
Trakošćan
Šmarje pri Jelšah
Rogaška Slatina
Rogatec
Šentjur
Bednja
Ivanec
Lepoglava
Motel Krapina, od maralište
Podčetrtek
Pregrada
Olimje
Krapinske Toplice
Sveti Križ Začretje
Zlatar
Kozje
Zlatar-Bistrica
Konjščina
Bedekovčina
Kozjanski park
Zabok
Senovo
Bizeljsko
Oroslavje
Marija Bistrica
Brestanica
Donja Stubica
Krško
Leskovec pri Krškem
Kašina
Brežice
Čatež ob Savi
Belovar
Brdovec
Zaprešić
Kostanjevica na Krki
Bregana
Zagreb
Strmec
Samobor
Rakitje
Ivanja Reka
Lučko
Nature Park
TI Zagreb - Karta s pregledom mjesta za isključivanje vozila na području županije - Krapinsko-zagorska
P - Parkiralište / odmorište

Ostalo bitno u funkciji isključivanja vozila i osiguranja mjesta za njihovo isključivanje:

Na dionicama državnih cesta na kojima su započeti radovi na obnovi ili rekonstrukciji, a nisu dovršeni do početka rada zimske službe, vrijedi režim prometa prema privremenoj regulaciji i uvjetima koje je dužan osigurati izvoditelj tih radova.
Izvoditelj radova na održavanju ceste u zimskim uvjetima, u slučaju da dionica ceste na kojoj se obavljaju radovi nije obilježena i nije osigurano sigurno odvijanje prometa, dužan je otkloniti nedostatke ili zatražiti od izvoditelja da osigura dionicu ceste odgovarajućom prometnom signalizacijom.

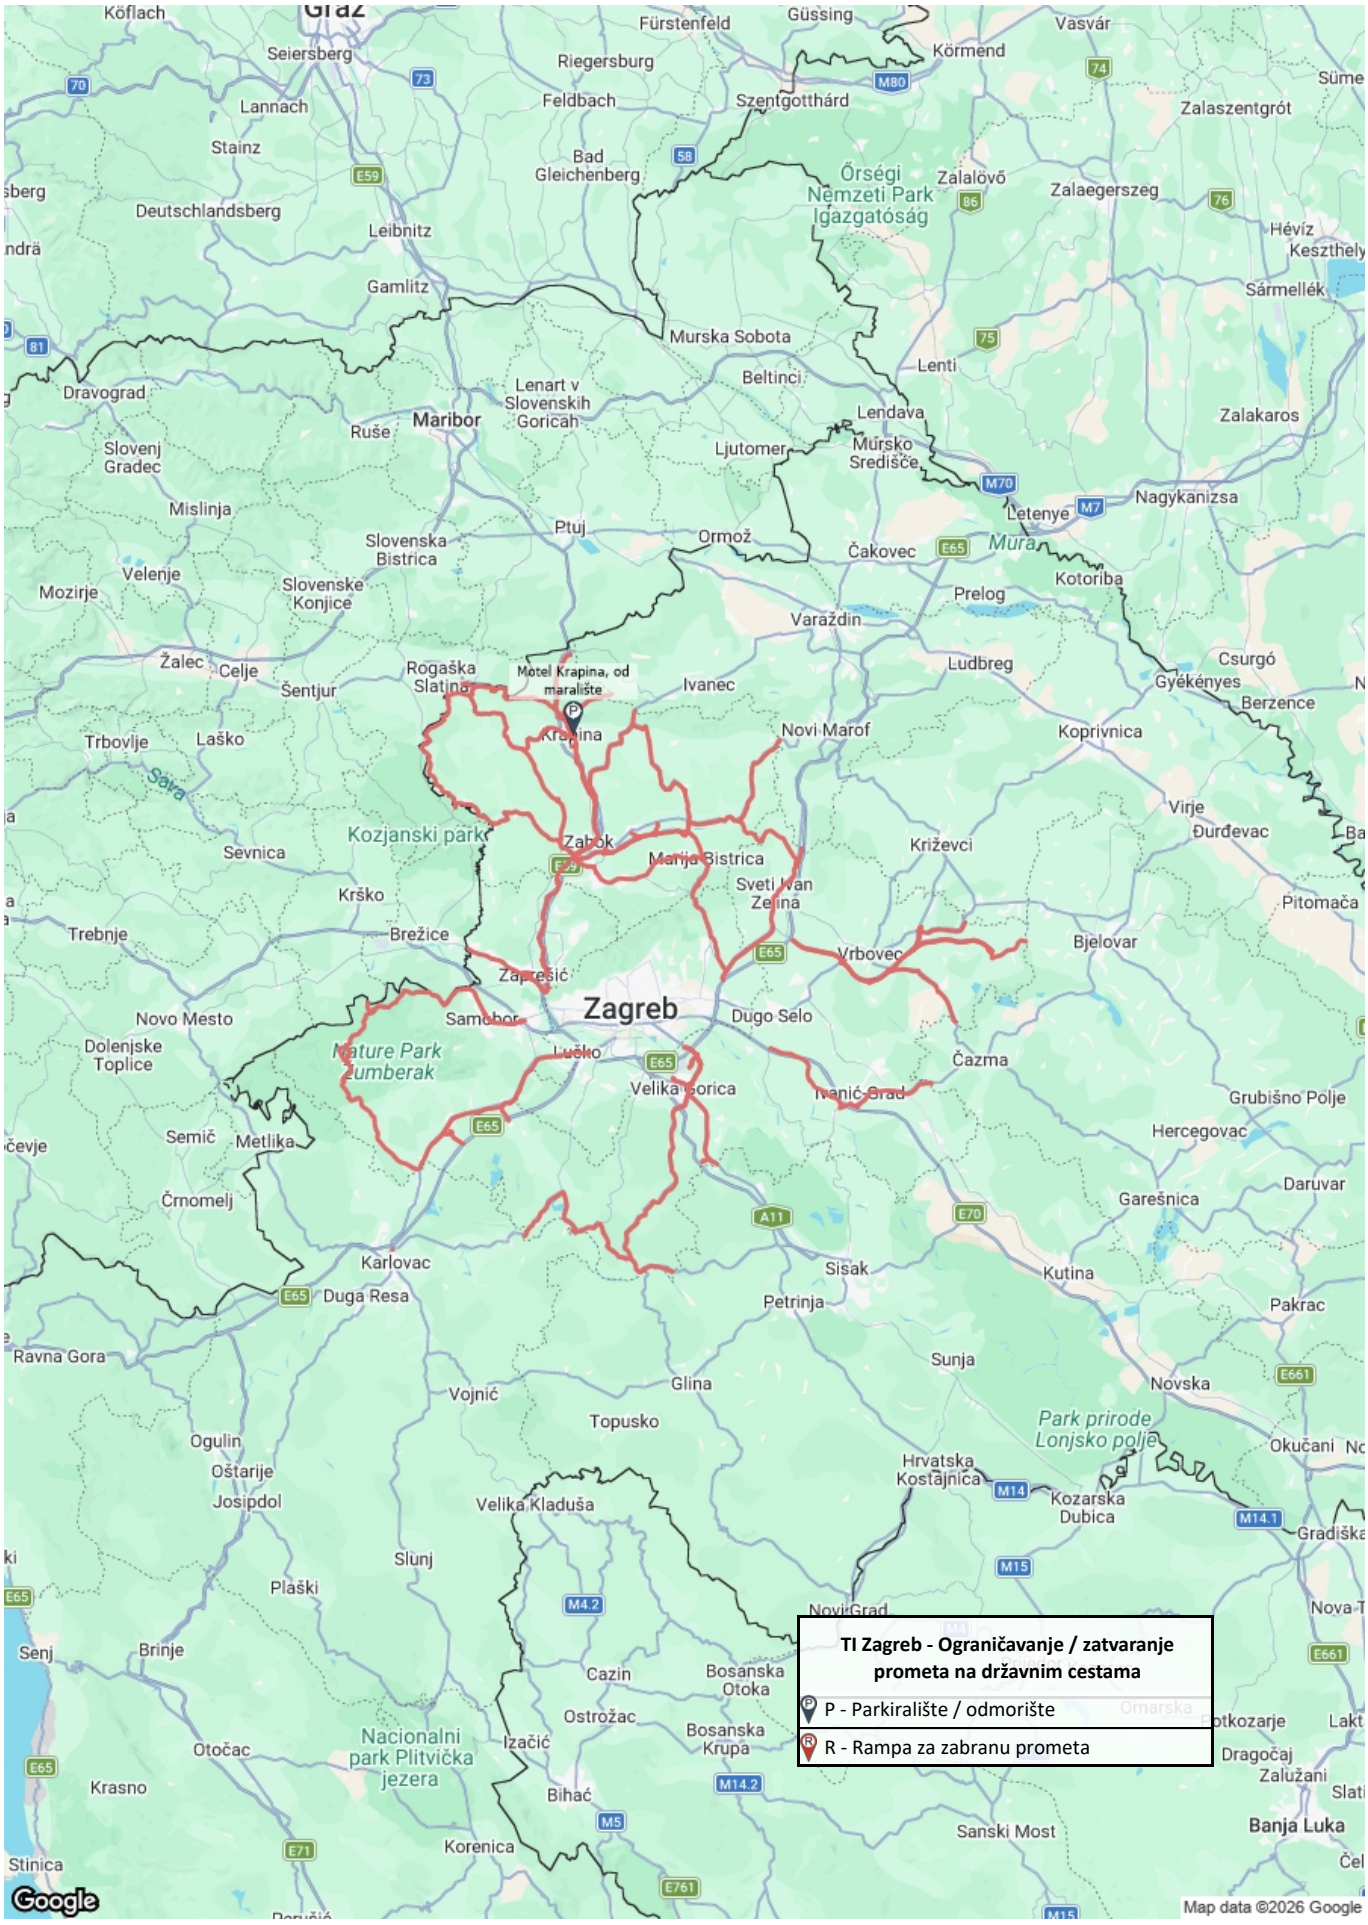
Motel Krapina, od maralište
Zagreb
Maribor
Murska Sobota
Varaždin
Čakovec
Koprivnica
Karlovac
Sisak
Petrinja
Kutina
Bjelovar
Virje
Đurđevac
Križevci
Ivanec
Novi Marof
Ludbreg
Zabok
Marija Bistrica
Sveti Ivan Zelina
Vrbovec
Dugo Selo
Samobor
Velika Gorica
Ivanić-Grad
Čazma
Pitomača
Grubišno Polje
Daruvar
Garešnica
Hercegovac
Novska
Sunja
Glina
Topusko
Vojnić
Velika Kladuša
Cazin
Bihać
Sanski Most
Banja Luka
Kozarska Dubica
Hrvatska Kostajnica
Park prirode Lonjsko polje
Nacionalni park Plitvička jezera
Ogulin
Slunj
Plaški
Senj
Otočac
Krasno
Korenica
Stinica
Ostrožac
Bosanska Otoka
Bosanska Krupa
Novi Grad
Dugo Selo
Ivanec
Ptuj
Ormož
Lenti
Lendava
Mursko Središče
Letenye
Nagykanizsa
Kotoriba
Prelog
Gyékényes
Berzence
Csurgó
Zalakaros
Hévíz
Keszthely
Sármellék
Zalaegerszeg
Zalalövő
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Zalaszentgrót
Szentgotthárd
Körmend
Vasvár
Güssing
Fürstenfeld
Riegersburg
Feldbach
Bad Gleichenberg
Gleisdorf
Graz
Köflach
Seiersberg
Lannach
Stainz
Deutschlandsberg
Leibnitz
Gamlitz
Dravograd
Slovenj Gradec
Ruše
Lenart v Slovenskih Goricah
Beltinci
Ljutomer
Mislinja
Velenje
Mozirje
Slovenske Konjice
Slovenska Bistrica
Žalec
Celje
Šentjur
Rogaška Slatina
Trbovlje
Laško
Sava
Kozjanski park
Sevnica
Krško
Trebnje
Brežice
Zaprešić
Novo Mesto
Dolenjske Toplice
Nature Park Žumberak
Semič
Metlika
Črnomelj
Ravna Gora
Duga Resa
Vojnić
Ogulin
Oštarije
Josipdol
Brinje
Otočac
Krasno
Stinica
Korenica
Plaški
Slunj
Velika Kladuša
Cazin
Ostrožac
Bihać
Bosanska Krupa
Bosanska Otoka
Novi Grad
Sanski Most
Banja Luka
Kozarska Dubica
Hrvatska Kostajnica
Park prirode Lonjsko polje
Okučani
Novska
Pakrac
Gradiška
Nova T
Dragočaj
Zalužani
Slati
Lakt
Omarska
Čel
TI Zagreb - Ograničavanje / zatvaranje prometa na državnim cestama
P - Parkiralište / odmorište
R - Rampa za zabranu prometa
Google
Map data ©2026 Google

12. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I OBAVJEŠĆIVANJA O STANJU I PROHODNOSTI DRŽAVNIH CESTA

Na temelju članka 7. stavak 1. i stavak 2. Pravilnika o održavanju cesta, a svezi s člankom 31. stavak 1. točka 1. Zakona o cestama, Hrvatske ceste d.o.o. dužne su osigurati prikupljanje podataka i pravovremeno obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti državnih cesta, o izvanrednim događajima na njima, kao i o meteorološkim uvjetima koji su od značaja za sigurno odvijanje prometa. Obavješćivanje javnosti treba osigurati uvijek kada se zbog vremenskih uvjeta, izvođenja radova, prometnih nesreća, elementarnih nepogoda ili drugih događaja, bitno promijene uvjeti odvijanja prometa.

U zimskom razdoblju obavješćivanje se provodi kroz sustav redovitih i izvanrednih obavijesti, a u ostalom dijelu godine kroz sustav izvanrednih obavijesti.

Učestalost dojava o stanju i prohodnosti cesta u zimskom razdoblju:

- redovite obavijesti: tri puta dnevno, od 5:00 do 6:00 sati, od 13:00 do 14:00 sati te od 17:00 do 18:00 sati,
- izvanredne obavijesti: odmah po saznanju o nastanku izvanrednog događaja, a i odmah nakon prestanka razloga za uspostavu ograničenja ili zabrane.

12.1. Obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta

Prikupljanje i distribucija podataka provodi se kroz web aplikaciju OSP – Obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta (u daljnjem tekstu: OSP), ili alternativno elektroničkom poštom, faxom, odnosno iznimno telefonom. Programsko rješenje OSP je tzv. „thin-client“ rješenje što znači da se na strani korisnika nalazi samo Internet preglednik a baza podataka je centralizirana i nalazi se na lokaciji unutar Hrvatskih cesta d.o.o.

Podaci o stanju i prohodnosti glavnih državnih cesta te o izvanrednim događajima i meteorološkim uvjetima značajnim za odvijanje prometa na njima prikupljaju se iz mjesta stalnog dežurstva, koja su, sukladno ugovornim odredbama, uspostavili ugovorni izvoditelji radova redovitog održavanja i zaštite državnih cesta. U tim se mjestima prikupljaju podaci s ophodarskih dionica i unose u podsustav OSP.

Uz navedene podatke, u podsustav se, u tehničkim ispostavama, unose podaci o radovima koji su u tijeku na državnim cestama.

Sve primljene obavijesti o stanju i prohodnosti cesta, o izvanrednim događajima na njima, kao i o meteorološkim uvjetima koji su od značaja za sigurno odvijanje prometa, kao i sve druge obavijesti, provjeravaju se u Središnjem centru za nadzor i upravljanje prometom (SCNUP), koje su ustrojile Hrvatske ceste d.o.o. i gdje su u dežurstvu od 00:00 h do 24:00 h radnici Hrvatskih cesta. Obavijesti se, prema potrebi, usklađuju s dežurnim osobljem izvoditelja u mjestima stalnog dežurstva i objedinjavaju u obrascu „Zbirna obavijest o stanju i prohodnosti cesta“ te se dostavljaju primateljima na predefinirane e-mail adrese, prije svega Hrvatskom autoklubu, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu civilne zaštite, Hrvatskom radiju i drugim subjektima.


SCNUP će, prema zaprimljenim informacijama izvoditelja radova redovitog održavanja, kao i trećih strana, obavještavati o stanju i prohodnosti državnih cesta te će sudjelovati u koordinaciji aktivnosti s centrima zimske službe, operativnim stožerima ugovaratelja radova redovitog održavanja i zaštite državnih cesta, drugim upraviteljima javnim cestama i drugim nadležnim subjektima.

U funkciji obavješćivanja o stanju i prohodnosti državnih cesta je i **mobilna aplikacija OSP**, koja na jednostavan način, s mobilnog uređaja omogućuje praćenje stanja i prohodnosti cesta s bilo koje lokacije.

KONTAKT PODACI SREDIŠNJEG CENTRA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM (SCNUP):

HRVATSKE CESTE D.O.O.
SREDIŠNJI CENTAR ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PROMETOM
Karlovac, Banija 160a
Tel.: 047/674-611
E-mail: scnup@hrvatske-ceste.hr

Organizacijska strukture sustava obavješćivanja u zimskom razdoblju prikazana je na sljedećoj slici.

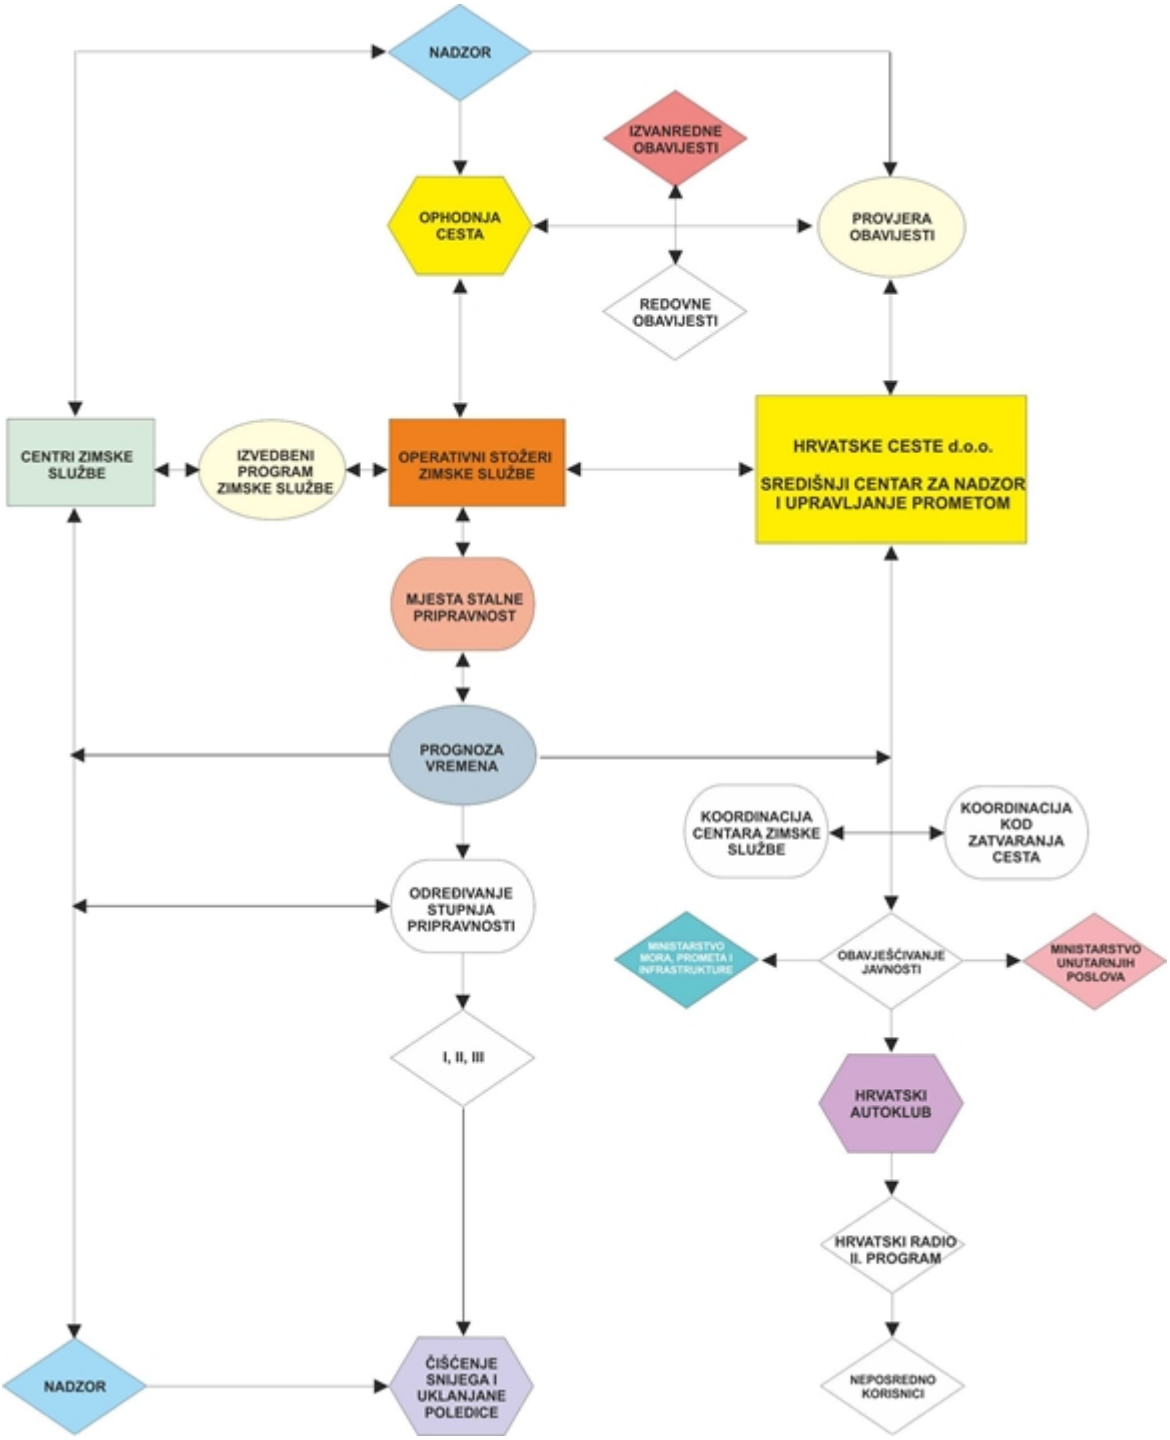

Organizacijska struktura sustava obavješćivanja u zimskom razdoblju

Šifrirani sustav dojave o stanju i prohodnosti, izvanrednim događajima te o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa na glavnim državnim cestama u Republici Hrvatskoj:

Za šifriranje stanja i prohodnosti državnih cesta koristi se sljedeći predložak:

ŠIFRA	OPIS STANJA I PROHODNOSTI
1	Redovno
2	Ograničenje brzine
3.1	Zabrana prometa motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom za vrijeme "zimskih uvjeta" na cestama
3.2	Zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu
3.3	Zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje
3.4	Zabrana prometa za pojedine vrste vozila
3.5	Zabrana prometa za sva vozila
4	Obvezna uporaba lanaca za snijeg

Šifra "1" podrazumijeva uobičajeni intenzitet prometa, uobičajenu razinu služnosti te normalne vremenske uvjete za promatrano godišnje doba.
Upisivanjem šifre "1" u prvi stupac obrasca dojave isključuju se sva ostala stanja.

Šifra "2" podrazumijeva ograničenje brzine kretanja vozila za 50 % ili manje od dopuštene brzine na promatranoj dionici u normalnim uvjetima, zbog obavljanja radova redovitog ili izvanrednog održavanja na duljim dionicama ceste.
Upisivanjem šifre "2" u prvi stupac obrasca dojave upisuje se i vrijednost ograničenja brzine, npr. "40 km/h" te duljina dionice na koju se to ograničenje odnosi.
Primjer upisa: 2/40 km/h/17 km. Razlog ograničenja brzine kretanja moguće je upisati i u stupac II. ili u stupac III.

Šifra "3.1" podrazumijeva zabranu prometa motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom (autobusi i teretni automobili moraju, barem na jednoj pogonskoj osovini, imati lance za snijeg, dok osobni automobili moraju biti opremljeni propisanom zimskom opremom) za vrijeme zimskih uvjeta na cestama.
Upisivanje šifre "3.1" u prvi stupac obrasca dojave uvijek je u paru s upisom šifre "3" ("zimski uvjeti") u trećem stupcu obrasca dojave.
U prvi stupac upisuje se samo šifra "3.1" ili šifra "3.1" u paru sa šiframa "3.2", "3.3", "3.4", "3.5" ili "4" (odvojene zarezom). U slučaju upisa dvije šifre, podrazumijeva se da se šifra "3.1" odnosi na cijelu opisanu cestu, a druga šifra na dio te ceste. U tom slučaju, u stupac "Napomena" upisuje se dio ceste na koji se druga šifra odnosi.
U trećem stupcu moguće je upisati samo 3/S ili 3/L.
Pod "zimskim uvjetima" podrazumijeva se stanje kada je kolnik ceste prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Šifra "3.2" podrazumijeva zabranu prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu. Upisivanjem šifre "3.2" u prvi stupac obrasca dojave uvijek se upisuje i odgovarajuća vrijednost te duljina dionice ili naziv objekta na koju se ona odnosi.
U stupcu "Napomena" upisuju se krajnje ("čvorne") točke takve dionice radi mogućnosti ili potrebe njezina zaobilaska.
Primjer upisa: 3.2/5.5 t /13 km ili 3.2/2 t/"Paški most".

Moguć je upis razloga zabrane i u stupac II. i u stupac III.

Šifra "3.3." podrazumijeva zabranu prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje.
Upisivanjem šifre "3.3" u prvi stupac obrasca dojave upisuje se i odgovarajuća vrijednost te duljina dionice na koju se ona odnosi.
U stupcu "Napomena" upisuju se krajnje ("čvorne") točke takve dionice radi mogućnosti ili potrebe njezina zaobilaska. Primjer upisa: 3.3/8 t/17 km, a u stupcu "Napomena" npr. "Bušetina – Gradina - Virovitica".
Mogućnosti upisa: isto kao i uz šifru "3.2".

Šifra "3.4" podrazumijeva zabranu prometa za pojedinu/e vrstu/e vozila uvjetovanu stanjem ceste, izvanrednim događajem ili meteorološkim uvjetima značajnim za odvijanje prometa. Uz šifru "3.4" upisanu u prvi stupac obrasca dojave upisuje se i vrsta vozila. Upisana šifra uvijek mora biti u paru s upisom odgovarajuće šifre u drugom ili trećem stupcu obrasca dojave.
Primjer upisa: 3.4/ I. skupina (interna klasif. za "Krčki most") ili 3.4/ > 10 m (za vozila duža od 10 m).
Razlog se upisuje u stupac II. ili u stupac III.

Šifra "3.5" podrazumijeva zabranu prometa za sva vozila.
Upisivanjem šifre "3.5" u prvi stupac obrasca dojave uvijek mora biti u paru s upisom odgovarajuće šifre u drugom ili trećem stupcu obrasca dojave.
U stupcu "Napomena" upisuje se i razlog zbog kojeg je primjenjena takva zabrana kao i krajnje ("čvorne") točke takve dionice radi mogućnosti ili potrebe njezina zaobilaska.

Šifra "4" podrazumijeva obveznu uporabu lanaca za snijeg na cesti ili dijelu ceste na kojoj je kolnik u takvom stanju da se motornim vozilom, usprkos propisanoj zimskoj opremi, ne može upravljati na siguran način zbog vertikalnih elemenata ceste.
Upisivanje šifre "4" u prvi stupac obrasca dojave uvijek mora biti u paru s upisom šifre "3" ("zimski uvjeti") u trećem stupcu obrasca dojave. Moguće je samo 3/S ili 3/L.

Za šifriranje izvanrednog događaja koristi se sljedeći predložak:

ŠIFRA	OPIS IZVANREDNOG DOGAĐAJA
1	Elementarne nepogode
2	Veće prometne nesreće
3	Veća iznenadna oštećenja cestovnog trupa ili objekta
4	Izvanredno održavanje cesta
5	Izvanredni prijevoz
6	Ostali događaji

Pod **šifrom "1"** podrazumijevaju se samo oni događaji koji su "Elementarnom nepogodom" proglašeni od strane tijela državne uprave

Pod **šifrom "2"** podrazumijevaju se samo one prometne nesreće zbog kojih se odvijanje prometa mora u potpunosti prekinuti na vrijeme dulje od 2 sata.
Upisivanjem šifre "2" u drugi stupac obrasca dojave, upisuje se i duljina dionice ili naziv objekta na kojoj se nesreća dogodila i odgovarajuća šifra u prvom stupcu obrasca dojave.
U stupcu "Napomena" upisuju se krajnje ("čvorne") točke takve dionice radi mogućnosti ili potrebe njezina zaobilaska.
Primjer upisa: 2/27 km, a u stupcu "Napomena" npr. "Vrbovec - Žabno".

Pod **šifrom "3"** podrazumijevaju se samo ona oštećenja kod kojih je nužno primijeniti odgovarajuća ograničenja prometa.

Upisivanjem šifre "3" u drugi stupac obrasca dojave, uvijek se upisuje i duljina dionice ili naziv objekta na kojoj je izvanredni događaj nastao i odgovarajuća šifra u prvom stupcu obrasca dojave.

U stupcu "Napomena" upisuju se krajnje ("čvorne") točke takve dionice radi mogućnosti ili potrebe njezina zaobilaska.

Šifra "4" podrazumijeva izvođenje radova izvanrednog održavanja cesta kod kojih je nužno primijeniti odgovarajuća ograničenja prometa.
Upisivanjem šifre "4" u drugi stupac obrasca dojave, upisuje se i duljina dionice ili naziv objekta na kojoj se izvode radovi izvanrednog održavanja i odgovarajuća šifra u prvom stupcu obrasca dojave.
U stupcu "Napomena" upisuju se krajnje ("čvorne") točke takve dionice radi mogućnosti ili potrebe njezina zaobilaska.

Šifra "5" podrazumijeva izvanredni prijevoz kod kojega se mora primijeniti određeno ograničenje prometa na odobrenom itineraru.
Upisom šifre "5" u drugi stupac obrasca dojave podrazumijeva i obvezni upis odgovarajuće šifre za ograničenja prometa u prvom stupcu obrasca dojave.

Šifra "6" podrazumijeva ostale događaje na cestama kod kojih je nužno primijeniti odgovarajuća ograničenja prometa.
Upisom šifre "6" u drugi stupac obrasca dojave podrazumijeva i obvezni upis odgovarajuće šifre za ograničenje prometa u prvom stupcu obrasca dojave.
U stupcu "Napomena" obvezan je upis krajnjih ("čvornih") točaka takve ceste ili dionice radi mogućnosti ili potrebe njezina zaobilaska, s opisom događaja na cesti i ostalim odgovarajućim informacijama (npr. prosvjed na cesti, održavanje automobilske utrke, vjerska događanja ili sl.) te zaobilaznim pravcem.

Za šifriranje meteoroloških uvjeta koristi se sljedeći predložak:

ŠIFRA	OPIS METEOROLOŠKIH UVJETA
1	Smanjena vidljivost
2	Olujni vjetar
3	Zimski uvjeti

Šifra "1" podrazumijeva smanjenu vidljivost zbog nepovoljnih atmosferskih ili drugih prilika (magla, snijeg, kiša, prašina, dim i sl.) zbog kojih vozač ne može jasno uočiti druge sudionike u prometu ili prometni znak na udaljenosti od najmanje 200 m na cesti izvan naselja, odnosno na udaljenosti od 100 m u naselju. U slučajevima kada na istoj dionici vladaju različiti meteorološki uvjeti, upisuju se sve potrebne šifre i odvajaju zarezom, npr. 1, 3.

Šifra "2" podrazumijeva vjetar zbog kojeg se kretanje pojedinih vrsta vozila mora ograničiti.
Upis šifre "2" u treći stupac obrasca dojave podrazumijeva i obvezni upis odgovarajuće šifre za ograničenja prometa u prvom stupcu obrasca dojave.

Šifra "3" podrazumijeva stanje kada je kolnik ceste pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Nastupanjem "zimskih uvjeta" na određenoj dionici javne ceste, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom, a autobusi i teretni automobili moraju, barem na jednoj pogonskoj osovini, imati lance za snijeg, dok osobni automobili moraju biti opremljeni propisanom zimskom opremom.

Radi detaljnijeg razgraničenja "zimskih uvjeta" (snijeg - led), uz upis šifre "3" u trećem stupcu obrasca dojave upisuje se simbol "S" za snijeg, odnosno "L" kada je na kolniku poledica. Primjer upisa: 3/S ili 3/L.
Uz upis šifre "3" u treći stupac obrasca dojave upisuje se i odgovarajuća šifra za ograničenje prometa u prvom stupcu obrasca dojave.

12.2. Kontakt podaci u mjestima stalnog dežurstva

Dežurstvo u operativnom stožeru zimske službe izvoditelja radova,

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O., SVETI IVAN ZELINA, Zagrebačka cesta 44a :

Tel: 01 2317517
Fax: 01 2360507
E-mail: dezurna-sluzba@zczz.hr

Dežurne osobe u mjestu stalnog dežurstva Zagreb-Goričica, Zagrebačka cesta 46, 10382, Goričica, Hrvatska

1.	Matija Buković
2.	Mladen Ozimec
3.	Ivica Grkavec
4.	Željko Buković

Tel: 01 2317517
Fax: 01 2360507
e-mail: dezurna-sluzba@zczz.hr

12.3. Meteorološko - informacijski sustav

Meteorološko - informacijski sustav Hrvatskih cesta d.o.o. sastoji se od mjernih uređaja raspoređenih na državnim cestama i računalnog servera u sjedištu Hrvatskih cesta u Zagrebu, koje se koristi za prikupljanje i obradu podataka. Pod mjernim uređajima podrazumijevaju se glavne meteorološke postaje, pomoćne meteorološke postaje sa svjetlosno promjenjivim prometnim znakovima i pomoćne meteorološke postaje bez svjetlosno promjenjivih prometnih znakova.
Sustav podržava rad zimske službe te stalno obavještava vozače o vremenskim pojavama koje utječu na sigurnost odvijanja prometa (poledica, olujni vjetar i smanjena vidljivost) preko vizualnih informacija s promjenljivih prometnih znakova.
U sustav su uključena i trgovačka društva kojima su povjereni poslovi redovitog održavanja i zaštite državnih cesta putem instaliranih radnih stanica, koje im omogućavaju praćenje meteoroloških podataka na određenoj cesti a time pravovremeno i optimalno djelovanje u smislu održavanja.

Podaci s mjernih uređaja prikupljaju se automatski, podatkovnim kanalima GSM mreže s udaljenog mjernog mjesta. Središnji sustav sastoji se od međusobno povezanih komunikacijskih i aplikacijskih servera, GSM modema te odgovarajuće programske podrške uz procesnu i korisničku (Oracle) bazu podataka.

12.4. Sustav veza

U provođenju Izvedbenog programa zimske službe na području Tehničke ispostave Zagreb, koriste se četiri načina komunikacije, kao sustavi veza:

1. Internet
2. telefon
3. telefaks
4. radijske veze.

Internetske veze koriste se za pristup web aplikacijama kao što su pristup meteorološkim postajama, podacima o stanju soli u silosima, podacima o kretanju mehanizacije u zimskoj službi, pristup prognozama vremena i podsustavu OSP – Obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.

Telefonske veze se koriste za međusobnu komunikaciju odgovornih osoba izvoditelja u Operativnom stožeru ili mjestu stalne pripravnosti i odgovornih osoba Tehničke ispostave te za žurni prijenos informacija o stanju i prohodnosti cesta prema trećim subjektima (HAK, lokalna sredstva javnog priopćavanja, operativno dežurstvo MUP-a i drugi.). Telefonske veze (mobilne) koriste se, kao sekundarno sredstvo i za komunikaciju sa svakim pojedinim vozačem u vozilima koja se koriste u zimskoj službi.

Telefaks veze koriste se za prijenos informacija o stanju i prohodnosti cesta u slučaju tehničkih problema s Internet vezom.

Sustav radio veza koristi se za međusobnu komunikaciju više korisnika istovremeno te prijenos različitih vrsta podataka. U prijenosu podataka, sustav se koristi i za praćenje kretanja ophodarskih vozila te vozila koja rade u zimskoj službi putem GPS sustava, sve kroz aplikaciju AVL centar.
U cilju praćenja rada zimske službe, svako vozilo ugovornih izvoditelja koje se koristi u izvođenju radova u zimskom razdoblju, opremljeno je sustavom za komunikaciju s centrima zimske službe, koji uključuje radijski uređaj i uređaj za praćenje kretanja vozila putem GPS sustava, koji je kompatibilan sa sustavom koji se koristi u Hrvatskim cestama d.o.o. Evidentirani zapisi i podaci o kretanju vozila i snimljenoj govornoj komunikaciji pohranjuju se na poslovno-informacijskom sustavu Hrvatskih cesta d.o.o. i dostupni su i izvoditelju, a podaci se koriste za potrebe nadzora, obračuna ugovorenih radova i dr.

12.5. Prognoze vremena

Na temelju ugovora sklopljenog s Državnim hidrometeorološkim zavodom, Hrvatske ceste d.o.o. osigurale su izradu i izdavanje posebnih meteoroloških informacija i usluga za potrebe održavanja i zaštite državnih cesta te za potrebe obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti državnih cesta i meteoroloških uvjeta bitnih za sigurno odvijanje prometa.

Pod posebnim meteorološkim informacijama podrazumijeva se:

- davanje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih prognoza vremena,
- uključivanje Hrvatskih cesta d.o.o. u sustav obavješćivanja Službe upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda
- uključivanje Hrvatskih cesta d.o.o. u sustav obavješćivanja motriteljsko - javljačkih aktivnosti Državnog hidrometeorološkog zavoda davanjem podrobnijih informacija s redovitih meteorološko - javljačkih postaja te informacija s drugih meteoroloških postaja
- osiguranje telekomunikacijskih aktivnosti sa sustavom obavješćivanja Hrvatskih cesta d.o.o.

U zimskom razdoblju, od 01.01. do 31.03. i od 01.11. do 31.12. tekuće godine, kratkoročne prognoze vremena dostavljaju se dva puta dnevno u Glavni centar zimske službe, u sve centre zimske službe te u sve operativne stožere. Jutarnja prognoza dostavlja se od 08,00 do 08,30 za tekući dan, a poslijepodnevna od 14,00 do 14,30 sati za slijedeći dan.
Polutjedne područne prognoze vremena dostavljaju se dva puta tjedno.

Meteorološke pojave koje mogu uvelike smanjiti sigurnost cestovnog prometa kao što su velike količine snijega, jake snježne vijavice ili mećave koje stvaraju zapuhe, poledica zbog padanja kiše koja se ledi na cesti, olujni udari vjetra (naročito bura), jake ili dugotrajne kiše (zbog odrona), jaka i dugotrajna magla, najavljuju se u vidu upozorenja na opasne pojave.

13. PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE

Troškovi održavanja državnih cesta u zimskom razdoblju 2026./2027. na području Tehničke ispostave Zagreb procjenjuju se prema iznosima kako je prikazano u sljedećim tablicama:

Procjena troškova zimske službe u razdoblju od 15.11.2026. do 31.12.2026.:

			Zagrebačka			Krapinsko-zagorska			Grad Zagreb			Ukupno	
Pozicija	**Opis rada**	**Jedinica mjere**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**				473.369,00			556.494,30			37.759,20		1.067.623,00
10.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				62.908,10			67.104,34			4.573,30		134.585,80
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema izvedbenom programu zimske službe: obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje prometnog znaka	kom	700	70,35	49.245,00	665	70,35	46.782,75	50	70,35	3.517,50	1415	99.545,25
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema izvedbenom programu zimske službe: obuhvaća jednokratno postavljanje na postojeći stup i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje dopunske ploče	kom	230	27,33	6.285,90	323	27,33	8.827,59	20	27,33	546,60	573	15.660,09
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova: obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje rubnih štapova	kom	860	6,52	5.607,20	1600	6,52	10.432,00	60	6,52	391,20	2520	16.430,40
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a: obuhvaća jednokratno postavljanje te po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje snjegobrana, uključujući potrebni materijal za ugradnju	m2	150	11,80	1.770,00	90	11,80	1.062,00	10	11,80	118,00	250	2.950,00
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana: obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala te postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje drvenog snjegobrana	m2	0	0,00	0,00	0	23,93	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10.2.	**Organizacija i pripravnost zimske službe**				101.781,90			101.781,90			0,00		203.563,80
10.2.1.	Fiksna naknada za stalnu pripravnost vozila, strojeva i priključaka, uključujući i radnu snagu	dan	45	2.261,82	101.781,90	45	2.261,82	101.781,90	0	0,00	0,00	90	203.563,80
10.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				130.384,50			172.244,30			13.277,90		315.906,70
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit): obuhvaća zapunjavanje lokalnih oštećenja kolnika - udarnih jama, u zimskim uvjetima, odgovarajućim hladnim smjesama (grambit), s uklanjanjem oštećenog asfaltnog materijala, utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju te ručnu ugradnju smjese prosječne količine 0,15 t/m	t	30	314,68	9.440,40	30	314,68	9.440,40	5	314,68	1.573,40	65	20.454,20

			Zagrebačka			Krapinsko-zagorska			Grad Zagreb			Ukupno	
Pozicija	**Opis rada**	**Jedinica mjere**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**
10.3.2.	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač: Obuhvaća interventno posipavanje manjih površina po potrebi silosnim posipačem	h	155	40,74	6.314,70	70	40,74	2.851,80	5	40,74	203,70	230	9.370,20
10.3.3.	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem	h	870	90,70	78.909,00	500	90,70	45.350,00	100	90,70	9.070,00	1470	133.329,00
10.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala (utovarivač, rovokopač)	h	190	46,44	8.823,60	500	46,44	23.220,00	20	46,44	928,80	710	32.972,40
10.3.5.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (plugom/bočnim odbacivačem i posipačem)	h	165	92,62	15.282,30	500	92,62	46.310,00	0	0,00	0,00	665	61.592,30
10.3.6.	Snježna freza samohodna	h	0	128,92	0,00	6	128,92	773,52	0	0,00	0,00	6	773,52
10.3.7.	Ostali specijalni strojevi	h	0	77,28	0,00	71	77,28	5.486,88	0	0,00	0,00	71	5.486,88
10.3.8.	Radna snaga	h	725	16,02	11.614,50	2584	15,02	38.811,68	100	15,02	1.502,00	3409	51.928,18
10.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)**				178.294,50			215.363,80			19.908,00		413.566,30
10.4.1.	Natrijev klorid za silose	t	150	119,45	17.917,50	150	119,45	17.917,50	0	119,45	0,00	300	35.835,00
10.4.2.	Natrijev klorid za skladište	t	1500	99,54	149.310,00	1850	99,54	184.149,00	200	99,54	19.908,00	3550	353.367,00
10.4.3.	Kalcijev klorid	t	0	0,00	0,00	0	476,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	526	21,04	11.067,04	632	21,04	13.297,28	0	21,04	0,00	1158	24.364,32

HRVATSKE CESTE

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb

Tehnička ispostava Zagreb

Procjena troškova zimske službe u razdoblju od 01.01.2027. do 15.04.2027.:

			Zagrebačka			Krapinsko-zagorska			Grad Zagreb			Ukupno	
Pozicija	**Opis rada**	**Jedinica mjere**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**				798.545,30			740.309,80			60.677,28		1.599.532,00
10.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**				0,00			0,00			0,00		0,00
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema izvedbenom programu zimske službe: obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje prometnog znaka	kom	0	0,00	0,00	0	70,35	0,00	0	70,35	0,00	0	0,00
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema izvedbenom programu zimske službe: obuhvaća jednokratno postavljanje na postojeći stup i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje dopunske ploče	kom	0	0,00	0,00	0	27,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova: obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje rubnih štapova	kom	0	0,00	0,00	0	6,52	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a: obuhvaća jednokratno postavljanje te po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje snjegobrana, uključujući potrebni materijal za ugradnju	m2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana: obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala te postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje drvenog snjegobrana	m2	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10.2.	**Organizacija i pripravnost zimske službe**				169.636,50			169.636,50			0,00		339.273,00
10.2.1.	Fiksna naknada za stalnu pripravnost vozila, strojeva i priključaka, uključujući i radnu snagu	dan	75	2.261,82	169.636,50	75	2.261,82	169.636,50	0	0,00	0,00	150	339.273,00
10.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**				305.266,30			332.635,80			30.815,28		668.717,40
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit): obuhvaća zapunjavanje lokalnih oštećenja kolnika - udarnih jama, u zimskim uvjetima, odgovarajućim hladnim smjesama (grambit), s uklanjanjem oštećenog asfaltnog materijala, utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju te ručnu ugradnju smjese prosječne količine 0,15 t/m	t	70	314,68	22.027,60	100	314,68	31.468,00	6	314,68	1.888,08	176	55.383,68
10.3.2.	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač: Obuhvaća interventno posipavanje manjih površina po potrebi silosnim posipačem	h	370	40,74	15.073,80	100	40,74	4.074,00	10	40,74	407,40	480	19.555,20
10.3.3.	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem	h	1950	90,70	176.865,00	750	90,70	68.025,00	250	90,70	22.675,00	2950	267.565,00
10.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala (utovarivač, rovokopač)	h	730	46,44	33.901,20	1100	46,44	51.084,00	45	46,44	2.089,80	1875	87.075,00

			Zagrebačka			Krapinsko-zagorska			Grad Zagreb			Ukupno	
Pozicija	**Opis rada**	**Jedinica mjere**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Jedinična cijena (€)**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**
10.3.5.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (plugom/bočnim odbacivačem i posipačem)	h	286	92,62	26.489,32	1120	92,62	103.734,40	0	0,00	0,00	1406	130.223,70
10.3.6.	Snježna freza samohodna	h	25	128,92	3.223,00	20	128,92	2.578,40	0	0,00	0,00	45	5.801,40
10.3.7.	Ostali specijalni strojevi	h	10	77,28	772,80	150	77,28	11.592,00	0	0,00	0,00	160	12.364,80
10.3.8.	Radna snaga	h	1680	16,02	26.913,60	4000	15,02	60.080,00	250	15,02	3.755,00	5930	90.748,60
10.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)**				323.642,50			238.037,50			29.862,00		591.542,00
10.4.1.	Natrijev klorid za silose	t	450	119,45	53.752,50	150	119,45	17.917,50	0	119,45	0,00	600	71.670,00
10.4.2.	Natrijev klorid za skladište	t	2500	99,54	248.850,00	2000	99,54	199.080,00	300	99,54	29.862,00	4800	477.792,00
10.4.3.	Kalcijev klorid	t	0	0,00	0,00	0	476,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	1000	21,04	21.040,00	1000	21,04	21.040,00	0	21,04	0,00	2000	42.080,00

Procjena troškova zimske službe u razdoblju 2026./2027.:

			Zagrebačka		Krapinsko-zagorska		Grad Zagreb		Ukupno	
Pozicija	**Opis rada**	**Jedinica mjere**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**
10.	**ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA**			1.271.914,00		1.296.804,00		98.436,48		2.667.155,00
10.1.	**Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja**			62.908,10		67.104,34		4.573,30		134.585,80
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema izvedbenom programu zimske službe: obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje prometnog znaka	kom	700	49.245,00	665	46.782,75	50	3.517,50	1415	99.545,25
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema izvedbenom programu zimske službe: obuhvaća jednokratno postavljanje na postojeći stup i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje dopunske ploče	kom	230	6.285,90	323	8.827,59	20	546,60	573	15.660,09
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova: obuhvaća jednokratno postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje rubnih štapova	kom	860	5.607,20	1600	10.432,00	60	391,20	2520	16.430,40
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a: obuhvaća jednokratno postavljanje te po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje snjegobrana, uključujući potrebni materijal za ugradnju	m2	150	1.770,00	90	1.062,00	10	118,00	250	2.950,00
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana: obuhvaća nabavu i dopremu svog potrebnog materijala te postavljanje i po završetku zimske službe uklanjanje i deponiranje drvenog snjegobrana	m2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.2.	**Organizacija i pripravnost zimske službe**			271.418,40		271.418,40		0,00		542.836,80
10.2.1.	Fiksna naknada za stalnu pripravnost vozila, strojeva i priključaka, uključujući i radnu snagu	dan	120	271.418,40	120	271.418,40	0	0,00	240	542.836,80
10.3.	**Radovi u zimskom razdoblju**			435.650,80		504.880,10		44.093,18		984.624,10
10.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit): obuhvaća zapunjavanje lokalnih oštećenja kolnika - udarnih jama, u zimskim uvjetima, odgovarajućim hladnim smjesama (grambit), s uklanjanjem oštećenog asfaltnog materijala, utovarom i odvozom uklonjenog materijala na deponiju te ručnu ugradnju smjese prosječne količine 0,15 t/m	t	100	31.468,00	130	40.908,40	11	3.461,48	241	75.837,88
10.3.2.	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač: Obuhvaća interventno posipavanje manjih površina po potrebi silosnim posipačem	h	525	21.388,50	170	6.925,80	15	611,10	710	28.925,40
10.3.3.	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem	h	2820	255.774,00	1250	113.375,00	350	31.745,00	4420	400.894,00
10.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala (utovarivač, rovokopač)	h	920	42.724,80	1600	74.304,00	65	3.018,60	2585	120.047,40

			Zagrebačka		Krapinsko-zagorska		Grad Zagreb		Ukupno	
Pozicija	**Opis rada**	**Jedinica mjere**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**	**Količina**	**Vrijednost radova (€)**
10.3.5.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (plugom/bočnim odbacivačem i posipačem)	h	451	41.771,62	1620	150.044,40	0	0,00	2071	191.816,00
10.3.6.	Snježna freza samohodna	h	25	3.223,00	26	3.351,92	0	0,00	51	6.574,92
10.3.7.	Ostali specijalni strojevi	h	10	772,80	221	17.078,88	0	0,00	231	17.851,68
10.3.8.	Radna snaga	h	2405	38.528,10	6584	98.891,68	350	5.257,00	9339	142.676,80
10.4.	**Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klizavosti)**			501.937,00		453.401,30		49.770,00		1.005.108,00
10.4.1.	Natrijev klorid za silose	t	600	71.670,00	300	35.835,00	0	0,00	900	107.505,00
10.4.2.	Natrijev klorid za skladište	t	4000	398.160,00	3850	383.229,00	500	49.770,00	8350	831.159,00
10.4.3.	Kalcijev klorid	t	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.4.4.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	1526	32.107,04	1632	34.337,28	0	0,00	3158	66.444,32

Ukupna vrijednost radova: 2.667.155,00 €

14. USKLAĐENJE IZVEDBENIH PROGRAMA ZIMSKE SLUŽBE

Tehnička ispostava Zagreb uskladila je Izvedbeni program zimske službe u zimskom razdoblju 2026./2027. s drugim nadležnim subjektima koji gospodare javnim cestama koje se križaju, spajaju ili nastavljaju na državne ceste. Međusobno usklađenje aktivnosti podrazumijeva:

- utvrđivanje tehnološke granice za radove na sprečavanju nastajanja poledice te uklanjanju snijega i leda s kolnika u području razgraničenja,
- utvrđivanje dinamike i redoslijed izvođenja radova u području razgraničenja,
- utvrđivanje alternativnih pravaca u slučaju zatvaranja jedne od prometnica za promet,
- utvrđivanje načina provedbe mjera za zaštitu ceste i sigurnost odvijanja prometa u području razgraničenja.

Pod područjem razgraničenja podrazumijeva se čvor autoceste, spojna cesta i raskrižje spojne ceste i državne ceste te raskrižje državne i županijske odnosno lokalne ceste ili nerazvrstane ceste.

Zagreb, 12.10.2026.
